



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE TAQUARITINGA**

PROCESSO Nº. _____

T.P. nº 01/2013

Regido pela Lei nº 8.666/1993.
MENOR PREÇO GLOBAL

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços técnicos especializados no Gerenciamento de Obras de Saneamento/Esgotos/Estação de Tratamento - ETE, incluindo todas as despesas com recursos humanos e materiais (inclusive veículos e insumos para transporte de pessoas), despesas diretas e indiretas (inclusive escritório para administração local e insumos), impostos e lucros.

Local: Rua Clineu Braga de Magalhães, nº 911 - Centro Taquaritinga/SP

4º Vol.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE TAQUARITINGA



Taquaritinga, 10 de março de 2.014.


Ofício nº 050/2014

Prezado Senhor:

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, por seu Superintendente infra-assinado, vem através deste, em atendimento à solicitação datada de 28/02/14 e protocolada nesta Autarquia sob nº 214/2014, acusar o recebimento de 02(duas) vias assinadas da ART do Gerenciamento das obras e da pré-operação da Estação de Tratamento de Esgotos(ETE) deste município, recolhida ao CREASP, para efeito dos serviços do contrato.

Sem mais para o momento, prevalecemo-nos da oportunidade para renovar protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Satoshi Yokoyama
Superintendente

À
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos Ltda.
A/C do Engº Francisco José Justo
Rua Cônego Eugênio Leite, nº 623 - Cj. 42
Pinheiros - SP
CEP: 05414-011



AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
PERTECÍNICA HSMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			
ENDEREÇO / ADRESSE			
RUA CONEGO, EUGÊNIO LEITE Nº 623 - CJ - 42			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
05414-011	SÃO PAULO	SP	BRASIL
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
ART DO GERENCIAMENTO DAS OBRAS E DA PRÉ-OBRA DA ETE BASTE MUNICÍPIO		<input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO EMITENTE / SIGNATURE DE L'ÉMETTEUR		CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION	
X / Adilson Soares Santos			
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO 75240203-0 FC0463 / 16			





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço

92221220140371855

Complementar - detalhamento de atividades técnicas à
92221220140161403

Equipe-vinculada à 92221220140161403

1. Responsável Técnico

FRANCISCO MAURICIO RAPOSO

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2602928186

Registro: 0600756116-SP

Empresa Contratada: PERTÉCNICA HSMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

Registro: 0429198-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: SAAET - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTO DE TAQUARITINGA CPF/CNPJ: 45.374.865/0001-56

Endereço: Rua CLINEU BRAGA DE MAGALHÃES

Nº: 911

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Taquaritinga

UF: SP

CEP: 15900-000

Contrato: 045/2013

Celebrado em: 30/12/2013

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ 491.649,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua CLINEU BRAGA DE MAGALHÃES

Nº: 911

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Taquaritinga

UF: SP

CEP: 15900-000

Data de Início: 03/01/2014

Previsão de Término: 03/03/2015

Coordenadas Geográficas: 7626900,00N, 757500,00E

Finalidade: Saneamento básico

Código:

Proprietário: SAAET - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

CPF/CNPJ: 45.374.865/0001-56

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Coordenação					
1	Produção técnica especializada	Estação Tratamento de Esgoto	Saneamento e meio ambiente	0,20	metro cúbico por segundo

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

GERENCIAMENTO DAS OBRAS E DA PRÉ OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE TAQUARITINGA

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.



7. Entidade de Classe

68 - SEESP - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SEESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Paulo 25 de maio de 2014

Local

data

FRANCISCO MAURICIO RAPOSO - CPF: 833.886.218-53

SAAET - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO DE TAQUARITINGA - CPF/CNPJ: 45.374.865/0001-56

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11



Valor ART R\$ 63,64

Registrada em: 25/03/2014

Valor Pago R\$ 63,64

Nosso Número: 92221220140371855 Versão do sistema



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
92221220140422791

Equipe-vinculada à 92221220140161403

1. Responsável Técnico

GUILHERME GEORGETTI FERNANDES

Título Profissional: Engenheiro Ambiental

RNP: 2610759274

Registro: 5063888220-SP

Empresa Contratada: **PERTÉCNICA HSMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA**

Registro: 0429198-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: **SAAET - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA**

CPF/CNPJ: 45.374.865/0001-56

Endereço: **Rua CLINEU BRAGA MAGALHÃES**

Nº: 911

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Taquaritinga**

UF: **SP**

CEP: 15900-000

Contrato: **045/2013**

Celebrado em: **30/12/2013**

Vinculada à Art nº:

Valor: **R\$ 491.649,00**

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua CLINEU BRAGA DE MAGALHÃES**

Nº: 911

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Taquaritinga**

UF: **SP**

CEP: 15900-000

Data de Início: **03/01/2014**

Previsão de Término: **03/03/2015**

Coordenadas Geográficas: **7626900,00 N, 757500,00 E**

Finalidade: **Saneamento básico**

Código:

Proprietário:

CPF/CNPJ: 45.374.865/0001-56

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Gerenciamento					
1	Produção técnica especializada	Estação Tratamento de Esgoto	Saneamento e meio ambiente	0,20	metro cúbico por segundo
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART					

5. Observações

GERENCIAMENTO DAS OBRAS E DA PRÉ OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE TAQUARITINGA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.



7. Entidade de Classe

46 - RIBEIRÃO PRETO - ASSOCIAÇÃO DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DE RIBEIRÃO PRETO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Sr. RODRIGO de ABEL de 2014
Local data

GUILHERME GEORGETI FERNANDES - CPF: 363.017.998-36

SAEET - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA
- CPF/CNPJ: 45.374.865/0001-56

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11



Valor ART R\$ 63,64

Registrada em: 08/04/2014

Valor Pago R\$ 63,64

Nosso Número: 92221220140422791

Versão do sistema



Página: 2 de 2

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
RECIBO DE PAGAMENTO DE TITULO DE OUTRO BANCO

08/04/2014 13:34:13 DATA CONTABIL:08/04/2014
LOCAL: 033.0036 - SJ R PARDO
TRANSACAO: 0610908 TERMINAL: 0000152

GUILHERME GEORGETTI FERNANDES CARTAO: 7067
BANCO: 033 AGENCIA: 3557 CONTA: 01-003455-0

BANCO : 0001
VENCIMENTO : 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO : 63,64

IDENTIFICACAO :

001992221*2922212201*4042279121*16036000006364


CHAVE DE AUTENTICACAO: 0000217

OPERACAO REALIZADA NA DATA CONTABIL ACIMA
A VALIDADE DO PAGAMENTO FICA CONDICIONADA A
EXATIDAO DAS INFORMACOES FORNECIDAS. AS QUAIS
DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM OS DADOS CONSTANTES
NO BOLETO BANCARIO DA PRESENTE OPERACAO

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA
EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO



Recibo do Sacado



BANCO DO BRASIL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Agência / Código do Cedente: 3336-7/00401783-8


Nosso Número: 92221220140422791

SACADO: PERTÉCNICA HSMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	Nº Registro: 0429198
Profissional: GUILHERME GEORGETTI FERNANDES	CREASP: 5063888220
Data de Emissão: 08/04/2014	Data Vencimento: 17/04/2014
Numero ART: 92221220140422791	
Valor	R\$ 63,64

Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas.
A quitação do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário.

Autenticação Mecânica

.....CORTE AQUI.....



00199.22210 29222.122011 40422.791216 1 60360000006364

Lugar de pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 17/04/2014
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo					Agência / Código do Cedente 3336-7/00401783-8
Data de Emissão 08/04/2014	Número do Documento 92221220140422791	Espécie doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 08/04/2014	Nosso número/Código Documento 92221220140422791
Carteira 18-027	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 63,64	
(Lugar de responsabilidade do cedente) NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. BOLETO REFERENTE A ART Nº92221220140422791 Unidade Cedente: 3336					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
PERTÉCNICA HSMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA					Código de baixa

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



.....CORTE AQUI.....

Ao

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET

Rua Clineu Braga de Magalhães, 911

CEP 15900-000 - Centro

Taquaritinga - SP

At.: Satoshi Yokoyama
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 03 a 07/03/2.014


Prezados Senhores (as),

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir:

- 1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 03 a 07/03/2.014, Revisão 0 (N/Ref.: GE-174-RE-AS-006-R0);

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Engº Francisco José Justo
Sócio Gerente



DTE-013/14
São Paulo, 12 de Março de 2.014.

Ao
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911
CEP 15900-000 - Centro
Taquaritinga - SP

At.: Satoshi Yokoyama
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro / Apresentação
Mês 02/2.014 (R0)


Prezados Senhores (as),

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de mensal do acompanhamento físico e financeiro das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir:

- Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro – Mês 02/2.014, Revisão 0 (N/Ref.: GE-174-RE-AM-002-R0).

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,


Engº Francisco José Justo
Sócio-Gerente

DAF-014/14
São Paulo, 12 de Março de 2.014.

Ao
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911
CEP 15900-000 - Centro
Taquaritinga - SP

At.: Satoshi Yokoyama
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Medição dos serviços / Medição 02 - Apresentação e pedido de liberação para o pagamento / Envio de nota, guias recolhidas de encargos sociais e tributários

Prezados Senhores (as),


Vimos com o presente, apresentar a V.S.as e solicitar liberação para o pagamento, da Medição 02 dos serviços realizados no mês 02/2.014, correspondentes a R\$ 33.162,46 (trinta e três mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme desembolso previsto nos Cronogramas Físico e Financeiro do contrato em referência.

Aproveitamos a oportunidade, para encaminhar em anexo:

- Nota de Débito de Serviços Profissionais nº 214 para o pagamento dos serviços prestados;
- Cópias das guias de recolhimentos dos encargos sociais exigíveis - GRF FGTS competência 02/2.014 e GPS INSS competência 01/2.014;
- Cópia da guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente no mês 12/2.013, relativa ao 4º Trimestre (Outubro, Novembro e Dezembro) de 2.013, a qual reflete a totalidade do referido imposto devido por esta empresa, informando que somos prestadores de serviços inscritos na cidade de São Paulo, sob a forma de sociedades de profissionais, de acordo com Art. 15, da Lei Municipal 13.701/03 (Declaração Cadastral i0001376/2014 em anexo) e, na forma definida em lei, conforme Portaria SF 014/2004, o ISS deve ser recolhido trimestralmente (próximo recolhimento: trimestre dos meses 01, 02 e 03/2.014, em 10/04/2.014). Maiores informações, poderão ser obtidas no sítio da PMSP e respectivo endereço: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/iss>.

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,


Engº Francisco José Justo
Sócio Gerente



00031/14  PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. Rua Cônego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 CEP 05414-011 - Pinheiros São Paulo - SP Fone (11) 3081.9569 / Fax (11) 3081.8052	17 MAR 2014	NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS nº 214	
		CNPJ nº 73.667.271/0001-79	IM nº 2.214.104-9
		Natureza da operação: Prestação de serviços	
		Prestação de serviços: Consultoria e projetos	
		Data da emissão: 12/03/2014	
	Vencimento: contra apres.		

Isento da emissão de Nota Fiscal de acordo com Art. 15, § 3º, da Lei Municipal nº 13.701/03 de 24/12/2.003
Imposto Sobre Serviços de acordo com Art. 10, da Lei Municipal nº 13.701/03 de 24/12/2.003

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO	
Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET	
CNPJ: 45.374.865/0001-56	IE: - IM: -
Endereço: Rua Clineu Braga de Magalhães, 911	CEP: 15900-000
Município: Taquaritinga	Estado: SP

Deve(m) a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda., estabelecida no endereço acima, a importância no valor de R\$ 33.162,46 (trinta e três mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), pagável na praça de São Paulo.

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Contrato nº 045/2.013 - Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tramento - ETE, na cidade de Taquaritinga - SP. Medição 02 - Serviços prestados no mês 02/2.014 - Retenções RFB: IR (1,5%) = R\$ 497,44 / PIS (0,65%) = R\$ 215,55 / COFINS (3,0%) = R\$ 994,88 / CSLL (1,0%) = R\$ 331,62 <u>Dados para depósito:</u> Banco do Brasil (001) Agência nº: 6806-3 / Conta corrente nº: 608-4		33.162,46

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	Valor dos serviços (R\$)	33.162,46
	Total desta nota (R\$)	33.162,46

1ª Via: Destinatário [X]
2ª Via: Emitente []
3ª Via: Contábil []



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Cobrança

Declaração Cadastral

Declaração nº : **i 001376/2014**
Nome/Razão Social : **PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE
SIMPLES LIMITADA**
C.C.M. : **2.214.104-9**

O contribuinte em epígrafe encontra-se enquadrado, para fins do disposto no art. 10 da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, na condição abaixo indicada:

Sociedade constituída na forma do parágrafo 1º do artigo 15º da Lei nº 13.701/03.

Emitida via Internet em : 18/02/2014

Observações:

Esta declaração possui validade de três meses a contar de sua data de expedição.

Esta declaração não possui validade como certidão negativa de tributos mobiliários. Certidões on line de tributos mobiliários devem ser requeridas no site "http://www3.prefeitura.sp.gov.br/certidao/ctm_menu.htm".

A autenticidade desta declaração poderá ser confirmada no site da Prefeitura de São Paulo (<http://www.prefeitura.sp.gov.br>).

20/2/2014

[bb.com.br]



20/02/2014 12:23:43



GPS - Guia da Previdência Social

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.44
6806306806 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT
AGENCIA: 6806-3 CONTA: 608-4

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
IDENTIFICADOR	73667271000179
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
VALOR DO INSS	1.785,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	330,53
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.116,28
-----	-----

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: E.6F6.E39.1A3.800.4E0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.44
6806306806 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
IDENTIFICADOR	73667271000179
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
VALOR DO INSS	1.785,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	330,53
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.116,28
-----	-----

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: E.6F6.E39.1A3.800.4E0

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

10/03/2014 17:11:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.38
6806306806 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT
AGENCIA: 6806-3 CONTA: 608-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000004-5 54490179140-0
30756605087-7 36672710001-9
Data do pagamento 07/03/2014
CNPJ/CEI 73667271/0001-79
COMPETENCIA 02/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2014
VALOR DEPOSITO 454,49
Valor Total 454,49

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: 8.F91.001.306.78B.0D6

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/02/2014 - 17:30:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA				02-DDD/TELEFONE (0011)30612549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.681,19	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.667.271/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 454,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 454,49
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014

85850000045 544901791400 307566050877 366727100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/02/2014 - 17:30:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA				02-DDD/TELEFONE (0011)30612549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.681,19	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.667.271/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 454,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 454,49
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014

85850000045 544901791400 307566050877 366727100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

17/01/2014 13:59:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.46
6806306906 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PERTECNICA C E F S-C LT
AGENCIA: 6806-3 CONTA: 608-4

Convenio PREP MUN SAO PAULO
Codigo de Barres 91620000005-6 81670000552-2
01401100700-3 00022647656-2
Data do pagamento 10/01/2014
TRIBUTO I.S.S. - AUTO LANÇADO.
Valor Total 581,67

DOCUMENTO: C11001
AUTENTICACAO SISBB: E.75P.345.BE7.163.F9C

Transação efetuada com sucesso por: J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO.



ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

A Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico enviou este documento de arrecadação referente ao Imposto Sobre Serviços - ISS devido pelas sociedades de profissionais, inscritas no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM.

Este documento de arrecadação refere-se ao ISS devido no 4º trimestre do exercício 2013.

Para efeito de cálculo do imposto devido, é indicado no campo "UNIDADES TAXADAS" o número de profissionais (sócios, empregados ou não) habilitados ao exercício da mesma atividade e que prestam serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da legislação específica. Calcula-se o valor total a pagar por meio da multiplicação do valor unitário indicado no documento de arrecadação pela quantidade de unidades taxadas.

Para informações adicionais ou emissão de novo documento de arrecadação, acessar o site: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/iss/>

Forma de pagamento: O pagamento poderá ser efetuado na rede bancária autorizada, nos terminais de autoatendimento (caixa eletrônico) ou, ainda, via *internet banking*.

Também é possível, mediante sua Senha Web, acessar o Demonstrativo Unificado do Contribuinte - DUC no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/duc> e obter informações sobre valores pagos e débitos atualizados relativos ao ISS, à TFA e à TFE. Por meio do DUC, é possível obter extratos e emitir guias para pagamento destes tributos.

Pagamento em atraso: Após o vencimento, o contribuinte poderá emitir novo documento de arrecadação no site: <http://www.prefeitura.sp.gov.br>, link "Pagamento de Tributos" ou, alternativamente, utilizar os terminais de autoatendimento da rede bancária autorizada. Sobre os pagamentos em atraso incidirão acréscimos legais, que serão calculados automaticamente.

Atendimento telefônico: 156

Atendimento ao público: Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, localizada no Vale do Anhangabaú, 206/226 (ao lado do Viaduto do Chá). Horário de atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsiderar este comunicado.

A falta de pagamento do tributo nos prazos regulamentares sujeita a inclusão do nome do contribuinte no Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL, nos termos da Lei nº 14.094, de 06/12/05.

0020039

20617 22141049 7

Emissão: 19/12/2013

ISS 2013 - SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS

CCM 2.214.104-9	CNPJ 73.667.271/0001-79	RAZÃO SOCIAL PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
ENDEREÇO R CONEGO EUGENIO LEITE 623 CONJ 42		BARRIO PINHEIROS	CEP 05414-011		
CÓDIGO DE SERVIÇO 01546	DESCRIÇÃO ENG, AGRONOMIA, ARQUIT., URBAN. E CONG.(REG. ESPEC.-SD.)				
TRIMESTRE QUARTO	INCIDÊNCIA 12/2013	VENCIMENTO 10/01/2014	VALOR DO ISS POR PROFISSIONAL (R\$) 193,89	UNIDADES TAXADAS 3	VALOR A PAGAR (R\$) 581,67

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1123 55 07 00002264765 7 0

VIA CONTRIBUINTE

816200000056 816700005522 014011007003 000226476562



PREFEITURA DE SÃO PAULO

ISS 2013 - SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

4º TRIMESTRE

DATA DE VALIDADE 10/01/2014
CÓDIGO DE SERVIÇO 01546
INCIDÊNCIA 12/2013
VALOR DO ISS POR PROFISSIONAL (R\$) 193,89

X

UNIDADES TAXADAS 3

=

Data de Vencimento
10/01/2014

CCM
2.214.104-9

Valor a Pagar (R\$)
581,67

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1123 55 07 00002264765 7 0

VIA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

816200000056 816700005522 014011007003 000226476562





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE TAQUARITINGA



Para: Superintendência

Ref: Protocolo — PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda - Tomada de Preço nº001/2013 – Contrato nº045/2013 – 2º Relatório mensal dos serviços executados e nota fiscal

Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos/ Estação de Tratamento - ETE

Após apreciação dos documentos e relatórios protocolados nesta Autarquia pela empresa PERTÉCNICA, nada temos a opor quanto ao apresentado , bem como ao pagamento nota de débito de serviços profissionais nº214.

Taquaritinga, 13 de março de 2.014

Luiz Carlos Antonio José
Chefe Divisão de Operações

Juliana Tinti Bizari Mucio
Chefe Seção de rede água esgoto



DTE-016/14

São Paulo, 19 de Março de 2.014.

Ao

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET

Rua Clineu Braga de Magalhães, 911

CEP 15900-000 - Centro

Taquaritinga - SP

At.: Satoshi Yokoyama
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 10 a 14/03/2.014


Prezados Senhores (as),

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir:

- 1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 10 a 14/03/2.014, Revisão 0 (N/Ref.: GE-174-RE-AS-007-R0);

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Engº Francisco José Justo
Sócio Gerente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

**CONTRATO Nº 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS /
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL – 03 A 07/03/2014

**N/REF.: GE-174-RE-AS-006-R0
TAQUARITINGA - SP
MARÇO/2014**



APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato nº 045/2013, firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda.

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento físico das obras na semana de 03 a 07/03/2014.

ÍNDICE

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

2 - ATIVIDADES NA SEMANA DE 03 A 07/03/2014

3 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

- **Programa:** Água Limpa

- **Agente Promotor:** Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos Saneamento

- **Agente Financeiro e Técnico:** Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE

- **Objeto:** Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE

- **Recursos:**

- . Fonte: Programa Água Limpa;
- . Valor: R\$;
- . Contrato nº;
- . Vigência:

- **Agente Executor:** Prefeitura Municipal de Taquaritinga

- . Prazo: 14 meses;
- . Início:

- **Contratados**

- . Gerenciamento das obras:
 - .. Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda.
 - .. Valor: R\$ 491.649,00.

- . Obras e serviços:
 - .. KMG Consultoria e Engenharia Ltda.
 - .. Valor: R\$ 14.249.469,14.

2 – ATIVIDADES NA SEMANA DE 03 A 07/03/2014

2 – ATIVIDADES NA SEMANA 03 A 07/02/2014

No período de 03 a 07/02/2014, as atividades da Gerenciadora constaram das seguintes atividades:

1) Acompanhamento da construção civil das unidades.

→ Decantadores

- Limpeza e grauteamento nas paredes do Decantador 2;
- Montagem de forma do pilar central do Decantador 1;
- Finalização do acabamento das paredes do Decantador 1.

→ Casa de Desidratação de Lodo;

- Execução da fundação da unidade.

→ Reatores.

- Montagem das formas das paredes da caixa de espuma do Reator 1;
- Limpeza e acabamento das paredes do Reator 1.

→ Caixa de Fluxo

- Limpeza da Caixa de Fluxo 2 e 3.

2) Acompanhamento da instalação hidráulico-mecânica das unidades.

→ Linha de Recalque EE Final / Tratamento Preliminar

- Início do assentamento da tubulação do recalque.

→ Filtros Biológicos

- Perfuração da parede para montagem das tubulações internas dos Filtros 1 e 2.

3) Dados Gerais

- Em média a obra contou com 46 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 às 12:00h e 13:00 às 17:00h.

- Foram constatadas chuvas no período nos dias 03 e 05/03/2014.




Descrição: Montagem da forma do pilar central do Decantador 1.

Foto: 01

Data: 07/03/14

Arquivo: 112437

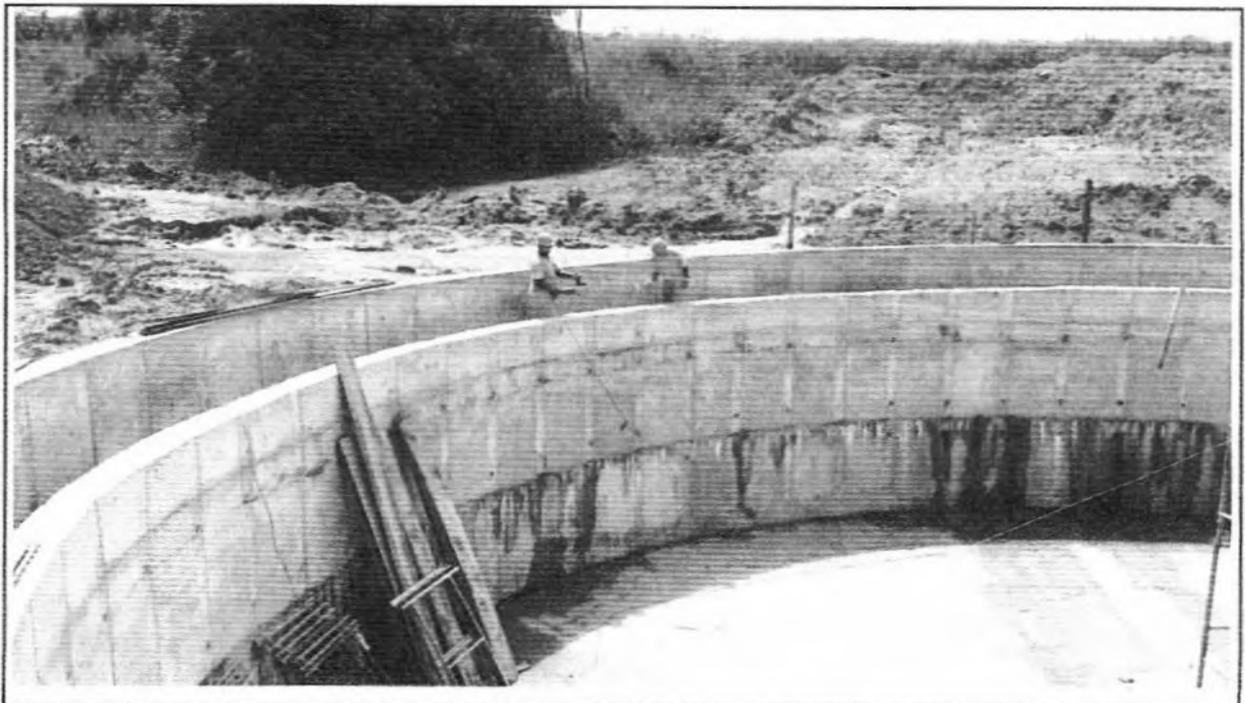


Descrição: Limpeza e grauteamento do Decantador 2

Foto: 02

Data: 07/03/14

Arquivo: 112554

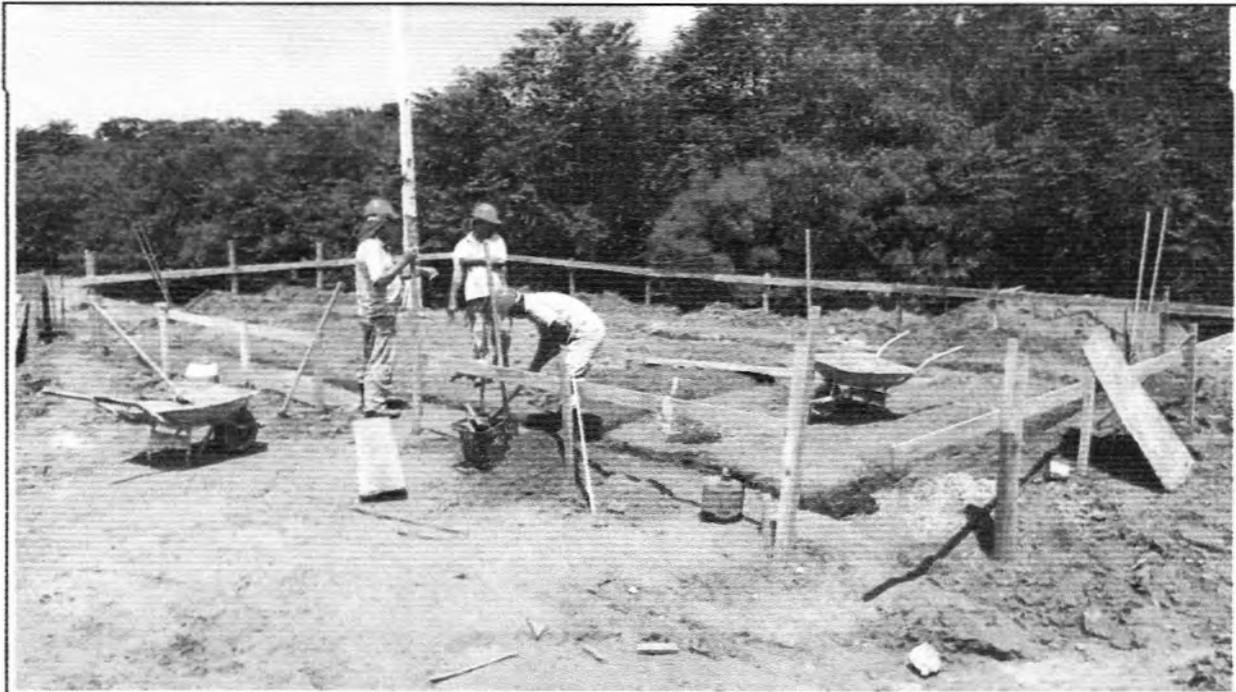


Descrição: Fundação da Casa de Desidratação de Lodo.

Foto: 03

Data: 07/03/14

Arquivo: 112832

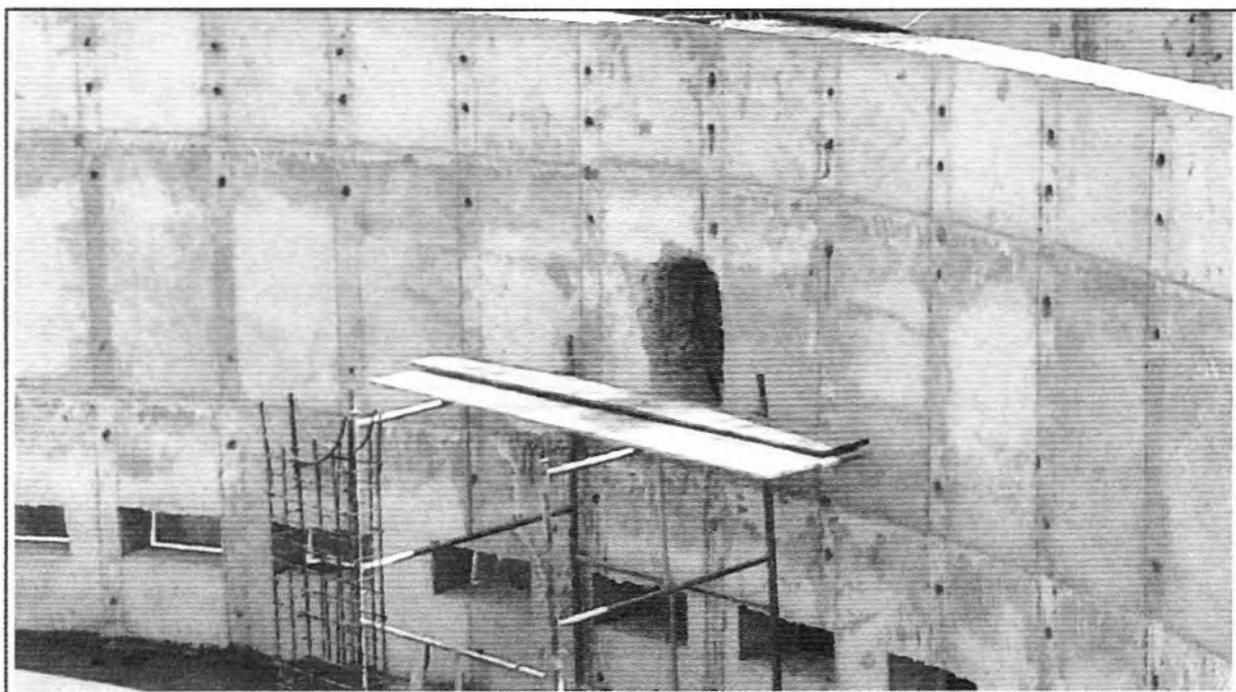

Descrição: Perfuração da parede para montagem da tubulação interna do Filtro 1.

Foto: 04

Data: 07/03/14

Arquivo: 113359



Descrição: Montagem da forma da caixa de espuma do Reator 1.

Foto: 05

Data: 07/03/14

Arquivo: 113554



Descrição: Execução da linha de recalque da EE Final / Tratamento Preliminar

Foto: 06

Data: 07/03/14

Arquivo: 114436

Protocolo 000265 / 2014

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA

21/03/2014

16:45:18

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL/ SEMANA DE 10 A



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

CONTRATO Nº 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS /
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL – 10 A 14/03/2014

N/REF.: GE-174-RE-AS-007-R0
TAQUARITINGA -SP
MARÇO/2014



APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato nº 045/2013, firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda.

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento físico das obras na semana de 10 a 14/03/2014.

ÍNDICE

- 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO**
- 2 - ATIVIDADES NA SEMANA DE 10 A 14/03/2014**
- 3 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO**

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

- **Programa:** Água Limpa

- **Agente Promotor:** Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos Saneamento

- **Agente Financeiro e Técnico:** Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE

- **Objeto:** Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE

- Recursos:

- . Fonte: Programa Água Limpa;
- . Valor: R\$;
- . Contrato nº;
- . Vigência:

- **Agente Executor:** Prefeitura Municipal de Taquaritinga

- . Prazo: 14 meses;
- . Início:

- Contratados

- . Gerenciamento das obras:
 - .. Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda.
 - .. Valor: R\$ 491.649,00.

- . Obras e serviços:
 - .. KMG Consultoria e Engenharia Ltda.
 - .. Valor: R\$ 14.249.469,14.

2 – ATIVIDADES NA SEMANA DE 10 A 14/03/2014

2 – ATIVIDADES NA SEMANA 10 A 14/03/2014

No período de 10 a 14/03/2014, as atividades da Gerenciadora constaram das seguintes atividades:

1) Acompanhamento da construção civil das unidades

→ Decantador

- Lavagem e impermeabilização dos Decantadores 1 e 2;
- Concretagem do pilar central dos Decantadores 1 e 2.

→ Casa de Desidratação de Lodo

- Armadura da viga baldrame e laje de fundo.

→ Reatores

- Montagem do escoramento Reator 1;
- Montagem de forma da caixa de espuma do Reator 2;
- Limpeza e grauteamento das paredes do Reator 1;
- Concretagem da caixa de espuma Reator 1;
- Concretagem da canaleta de efluente Reator 1 e 2.

→ Caixa de Fluxo

- Limpeza e acabamento da Caixa de Fluxo 2.

→ Estação Elevatória Final

- Limpeza e grauteamento das paredes.

→ Estação Elevatória de Recirculação

- Concretagem do último lance de paredes;
- Desforma das paredes.

→ Caixas de Manobras

- Concretagem do último lance de paredes das Caixas de Manobras 1 e 2;
- Desforma das paredes das Caixas de Manobras 1 e 2.

2) Acompanhamento da instalação hidráulico – mecânica das unidades.

→ Linha de Derivação

- Assentamento da tubulação do PVE-06 ao PVD-03, na rua principal.

→ Filtros Biológicos

- Montagem da tubulação interna dos Filtros 1 e 2.

3) Dados Gerais

- Em média a obra contou com 68 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 13:00 às 17:00h.

- Foram constatadas chuvas no dia 12/03/2014.




Descrição: Assentamento da tubulação da Linha de Derivação

Foto: 01

Data: 17/03/14

Arquivo: 142308

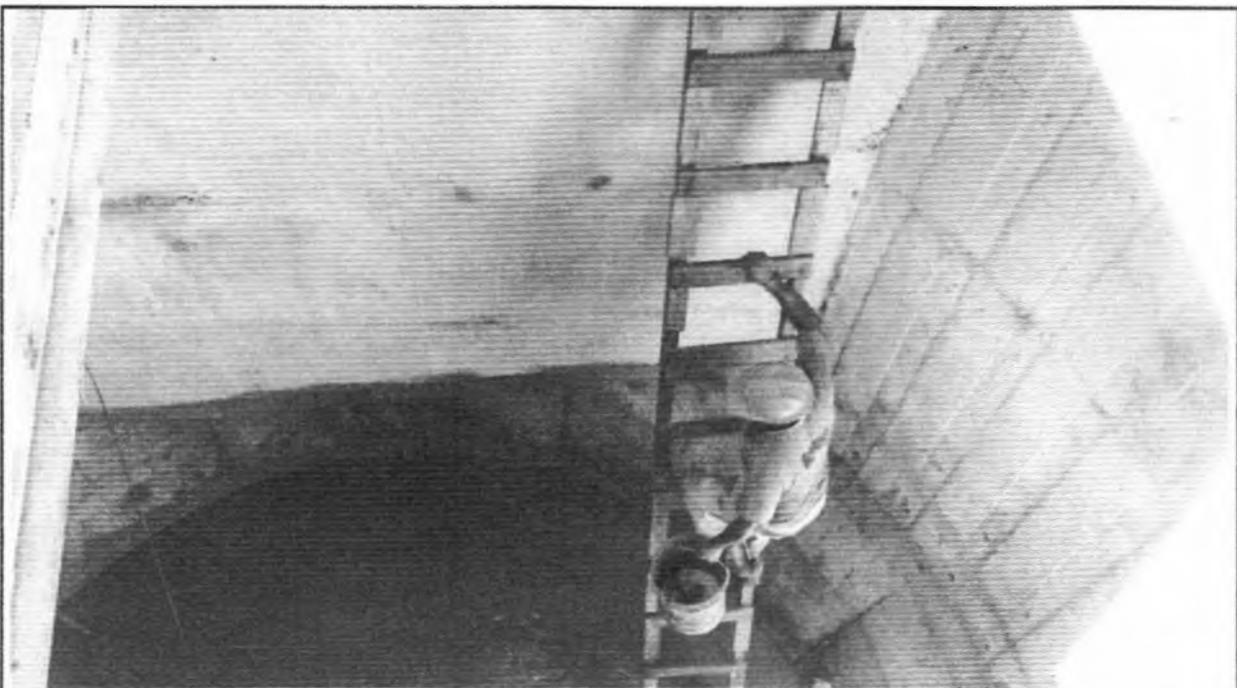


Descrição: Limpeza e grauteamento do EE Final

Foto: 02

Data: 17/03/14

Arquivo: 143111

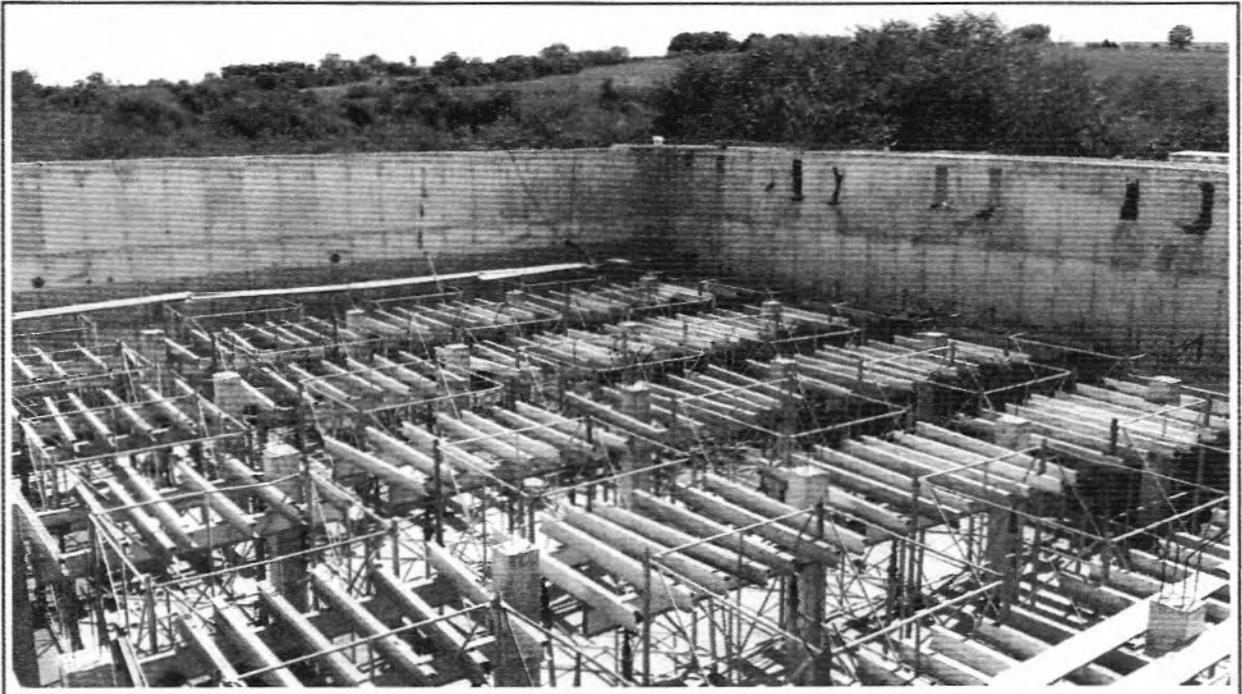


Descrição: Montagem do escoramento Reator 1.

Foto: 03

Data: 17/03/14

Arquivo: 143639

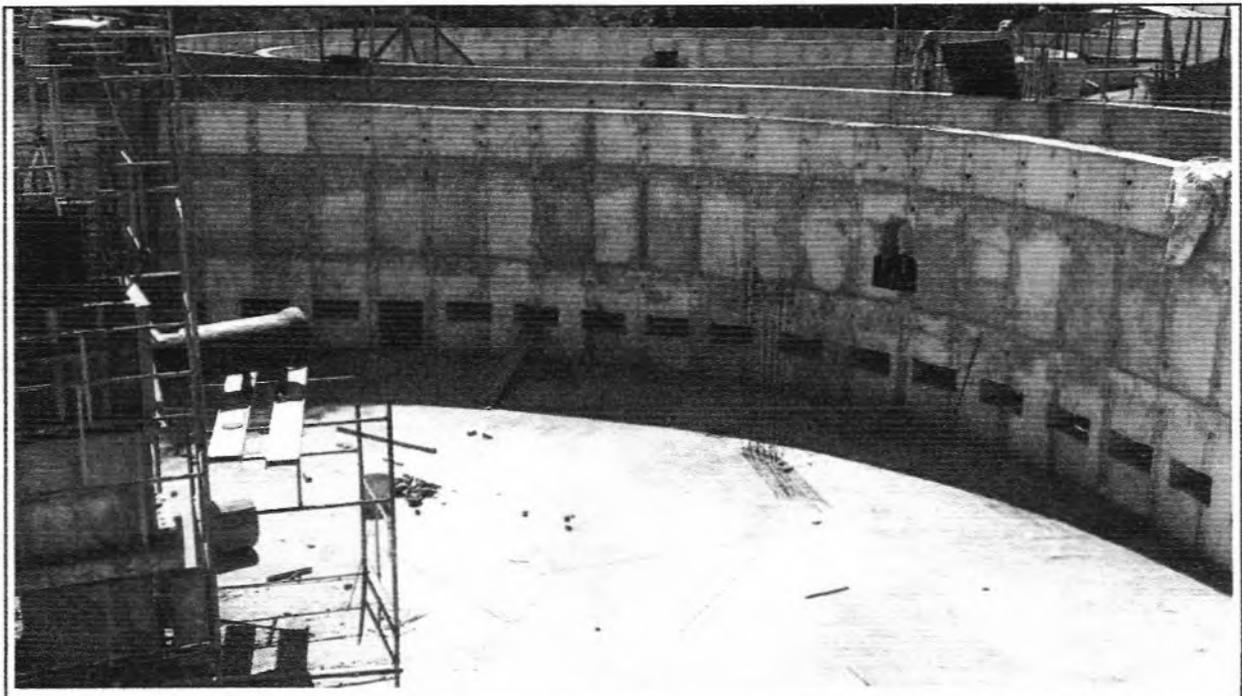


Descrição: Montagem da tubulação interna Filtro2.

Foto: 04

Data: 07/03/14

Arquivo: 143912

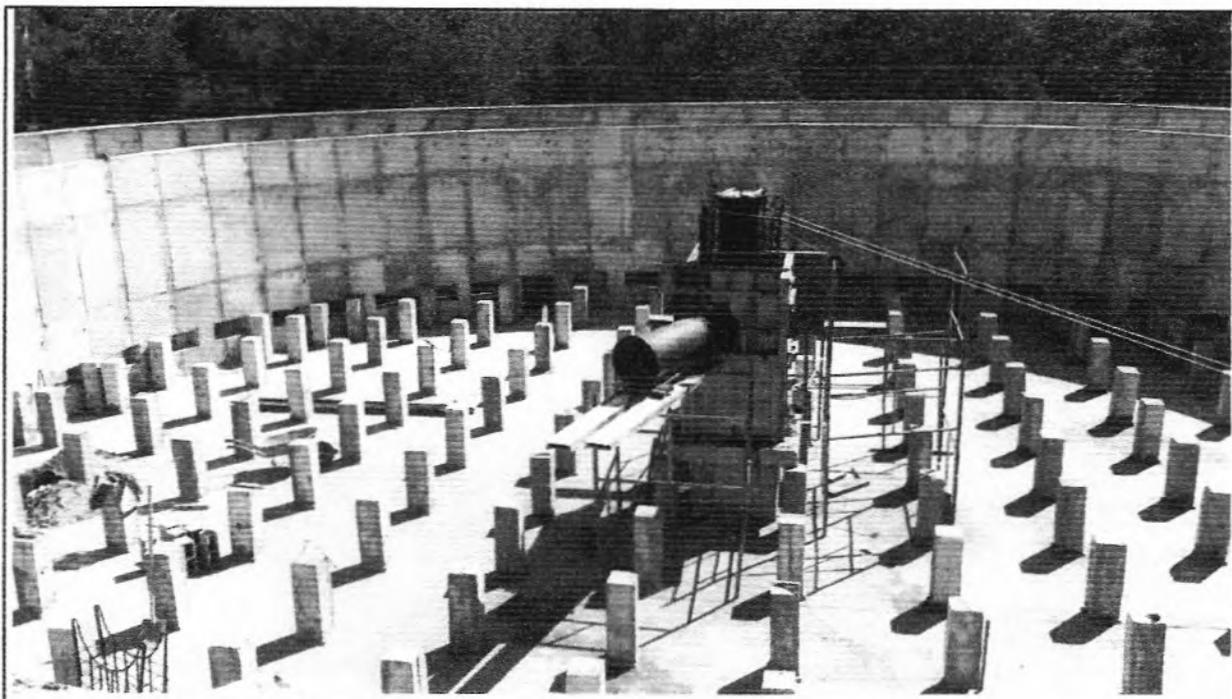


Descrição: Montagem da tubulação interna Filtro 1.

Foto: 05

Data: 17/03/14

Arquivo: 144036

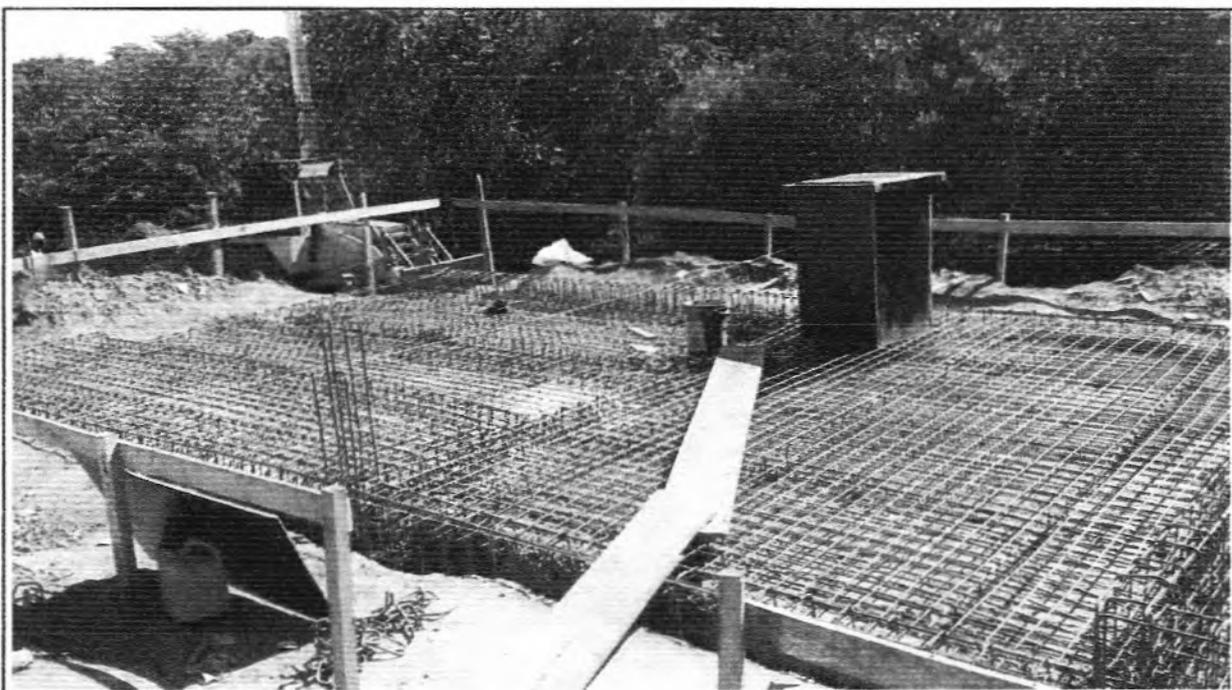


Descrição: Armadura da viga baldrame e laje de fundo Casa Desidratação de Lodo.

Foto: 06

Data: 17/03/14

Arquivo: 144232

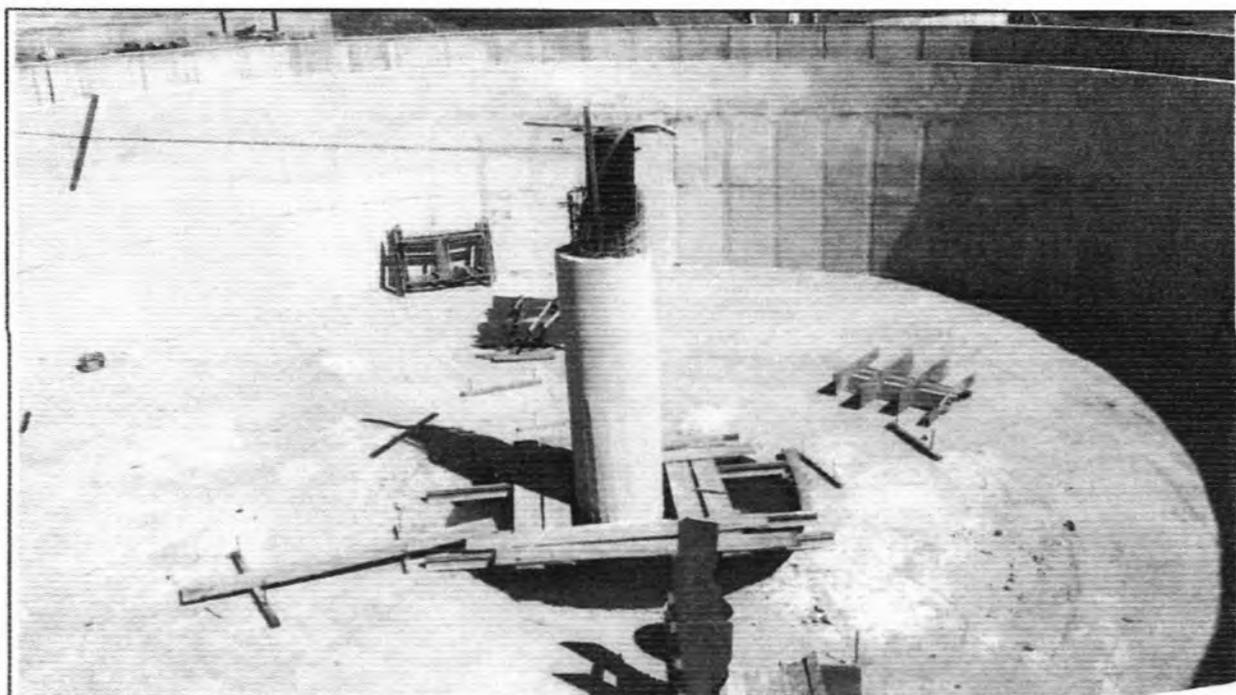

Descrição: Concretagem do pilar central e impermeabilização do Decantador 1.

Foto: 07

Data: 17/03/14

Arquivo: 144303



Descrição: Concretagem do último lance de paredes da Caixa de Manobra 1.

Foto: 08

Data: 17/03/14

Arquivo: 144530

DTE-017/14
São Paulo, 28 de Março de 2.014.

Ao
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911
CEP 15900-000 - Centro
Taquaritinga - SP

At.: Satoshi Yokoyama
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 17 a 21/03/2.014


Prezados Senhores (as),

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir:

- 1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 17 a 21/03/2.014, Revisão 0 (N/Ref.: GE-174-RE-AS-008-R0);

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Engº Francisco José Justo
Sócio Gerente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

**CONTRATO Nº 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS /
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL – 17 A 21/03/2014

**N/REF.: GE-174-RE-AS-008-R0
TAQUARITINGA -SP
MARÇO/2014**



APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/2014, para o Contrato nº 045/2013, firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda.

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento físico das obras na semana de 17 a 21/03/2014.

ÍNDICE

- 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO**
- 2 - ATIVIDADES NA SEMANA DE 17 A 21/03/2014**
- 3 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO**

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

- **Programa:** Água Limpa

- **Agente Promotor:** Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos Saneamento

- **Agente Financeiro e Técnico:** Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE

- **Objeto:** Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE

- Recursos:

- . Fonte: Programa Água Limpa;
- . Valor: R\$;
- . Contrato nº;
- . Vigência:

- **Agente Executor:** Prefeitura Municipal de Taquaritinga

- . Prazo: 14 meses;
- . Início:

- Contratados

- . Gerenciamento das obras:
 - .. Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda.
 - .. Valor: R\$ 491.649,00.

- . Obras e serviços:
 - .. KMG Consultoria e Engenharia Ltda.
 - .. Valor: R\$ 14.249.469,14.

2 – ATIVIDADES NA SEMANA DE 17 A 21/03/2014

2 – ATIVIDADES NA SEMANA 17 A 21/03/2014

No período de 17 a 21/03/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de:

1) Acompanhamento da construção civil das unidades

→Gradeamento Fino – Desarenador

- Impermeabilização das paredes internas.

→Filtros Biológicos

- Concretagem dos pilaretes e das placas dos Filtros 1 e 2;

- Concretagem dos pilares centrais dos Filtros 1 e 2;

- Montagens de formas para finalização dos pilares centrais dos Filtros 1 e 2.

→ Decantador

- Finalização da impermeabilização das paredes internas dos Decantadores 1 e 2;

- Concretagem dos pilares centrais dos Decantadores 1 e 2.

→ Casa de Desidratação de Lodo

- Concretagem da fundação e laje de fundo.

→ Reatores

- Cimbramento do escoramento e formas das estruturas internas do Reator 1;

- Concretagem das paredes da caixa de espuma do Reator 2;

- Armadura das vigas internas do Reator 1.

→ Tanque de Contato

- Regularização das paredes internas da unidade.

→ Caixa de Fluxo

- Impermeabilização da Caixa de Fluxo 1;

- Regularização das paredes externas da Caixa de Fluxo 2.

→ Estação Elevatória Final

- Impermeabilização das paredes internas.

→Estação Elevatória de Recirculação

- Desforma das paredes.

→Caixa de Manobra

- Desforma das paredes das Caixas de Manobra 1 e 2.

2) Acompanhamento da instalação hidráulico – mecânica das unidades.

→ Linha de Derivação

- Assentamento da tubulação de ferro fundido (\varnothing 450 mm) do PVD 03 a Caixa de Fluxo 01 (L= 144,00 m)

→Linha de Efluente


- Assentamento da tubulação de ferro fundido (\varnothing 600 mm) do PVE 06 ao Tanque de Contato (L= 20,00 m).

→Filtros Biológicos

- Montagens das tubulações internas dos Filtros 1 e 2.

3)-Dados Gerais

- Em média a obra contou com 73 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 13:00 às 17:00h.
- Foram constatadas chuvas no dia 20/03/2014.
- No dia 17/03/2014 foi realizado a assinatura do Boletim Medição 15.
- Em 18/03/2013 entrega dos seguintes equipamentos:
 - Painel de controle da Casa de Desidratação de Lodo;
 - Decanter centrífugo da Casa de Desidratação de Lodo;
 - Dois reservatórios de hipoclorito.

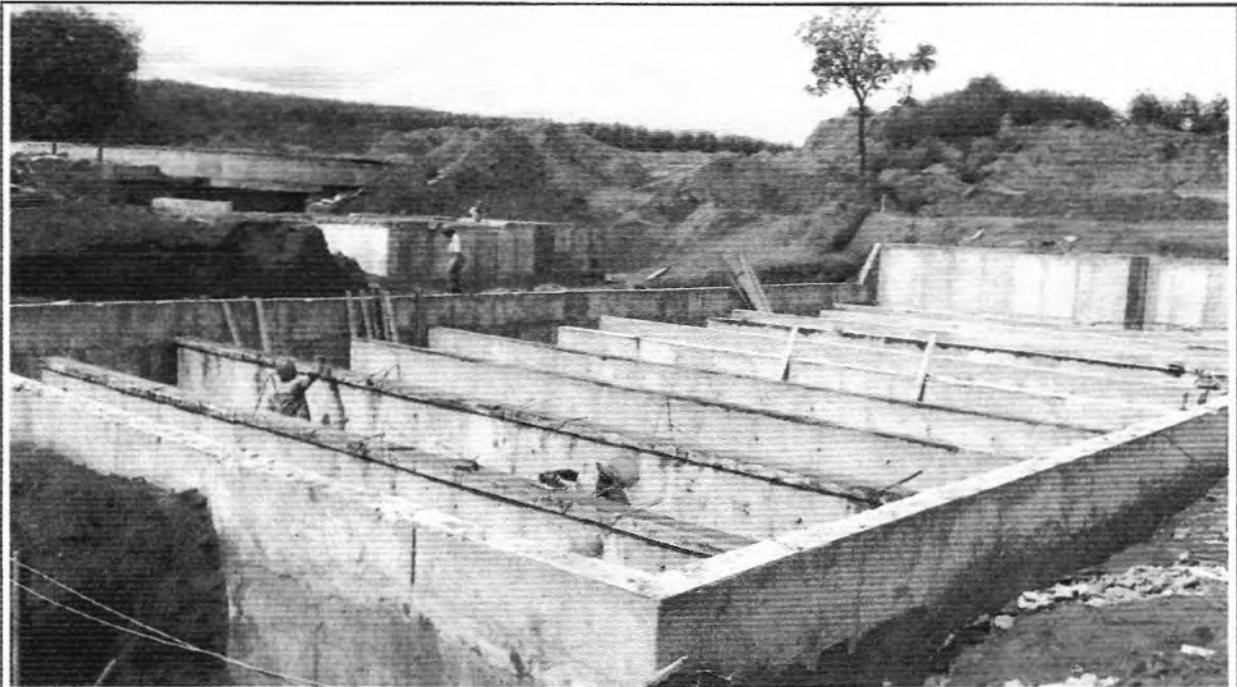

Descrição: Regularização das paredes internas do Tanque de Contato.

Foto: 01

Data: 21/03/14

Arquivo: 135817



Descrição: Impermeabilização das paredes internas da EE Final.

Foto: 02

Data: 21/03/14

Arquivo: 140347




Descrição: Impermeabilização das paredes do Gradeamento Fino / Desarenador.

Foto: 03

Data: 21/03/14

Arquivo: 140747

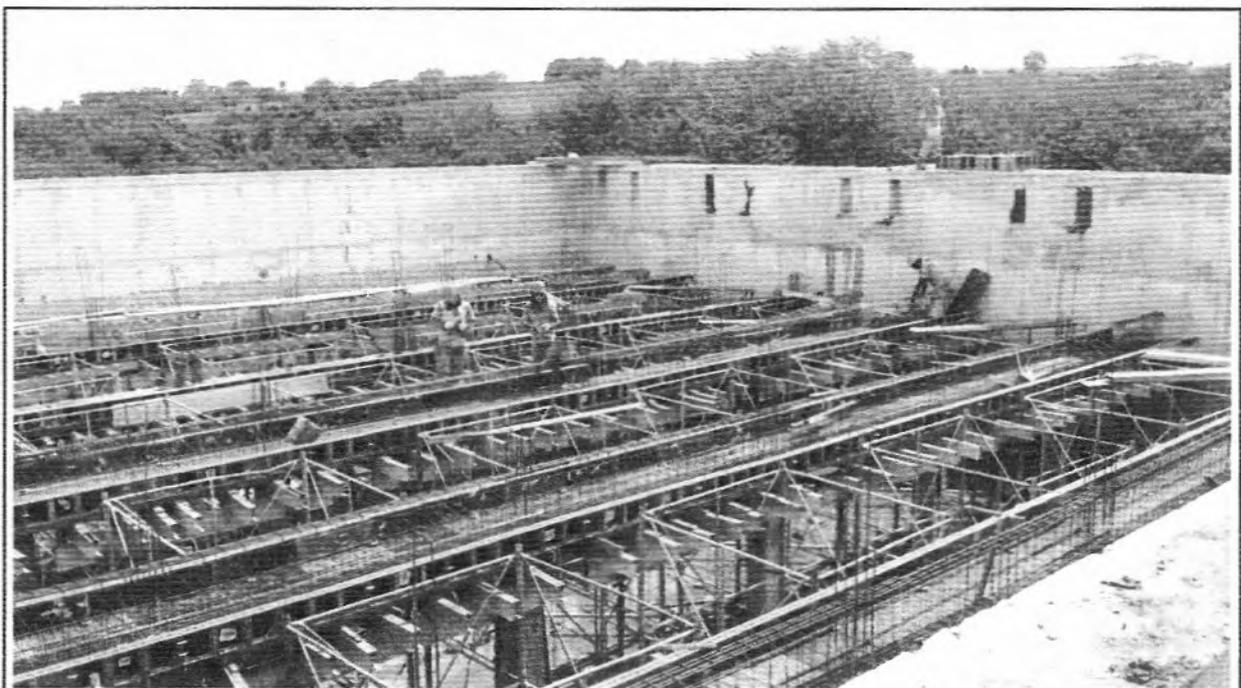

Descrição: Cimbramento do escoramento e formas das estruturas internas do Reator 1.

Foto: 04

Data: 21/03/14

Arquivo: 140947




Descrição: Concretagem e desforma da Caixa de Escuma do Reator 2.

Foto: 05

Data: 21/03/14

Arquivo: 141131

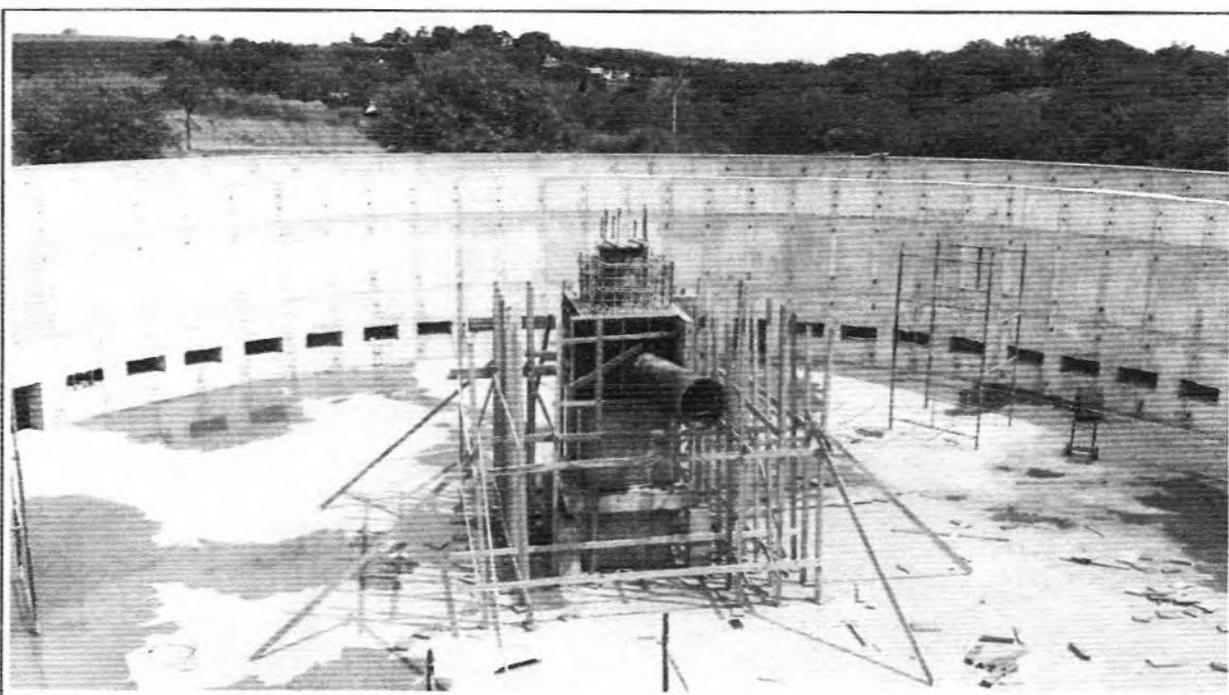


Descrição: Concretagem do pilar central Filtro 2.

Foto: 06

Data: 21/03/14

Arquivo: 141153

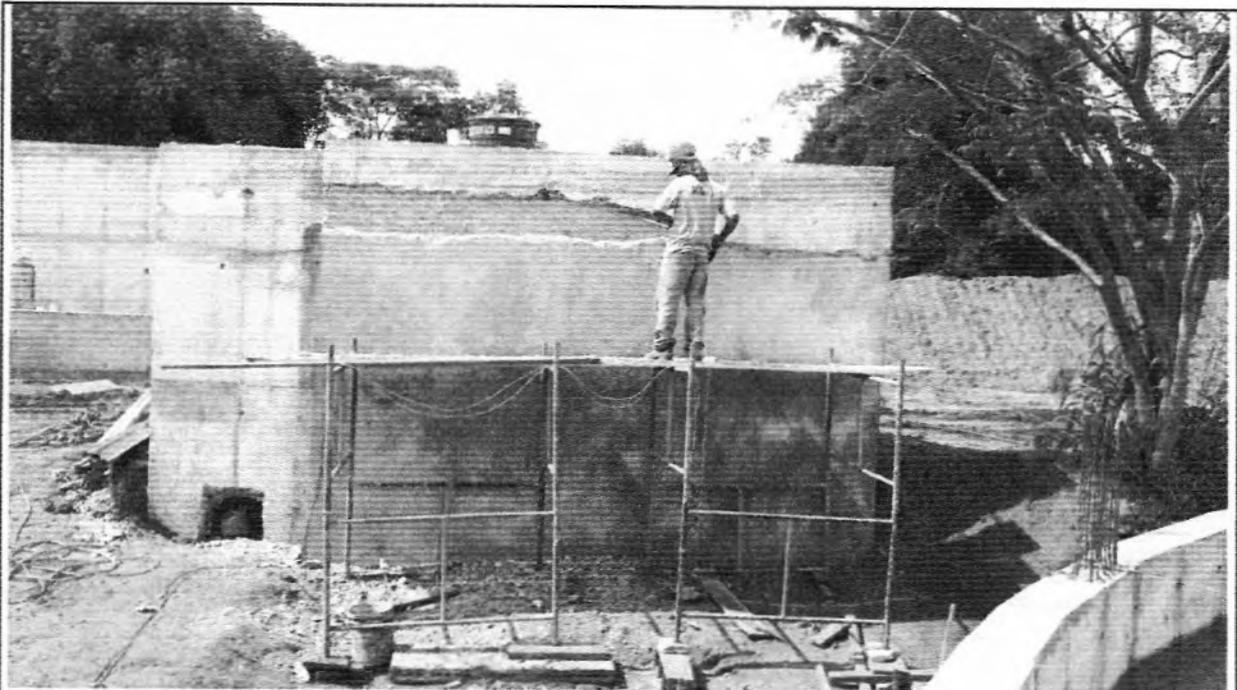


Descrição: Regularização das paredes da Caixa de Fluxo 2.

Foto: 07

Data: 21/03/14

Arquivo: 141223

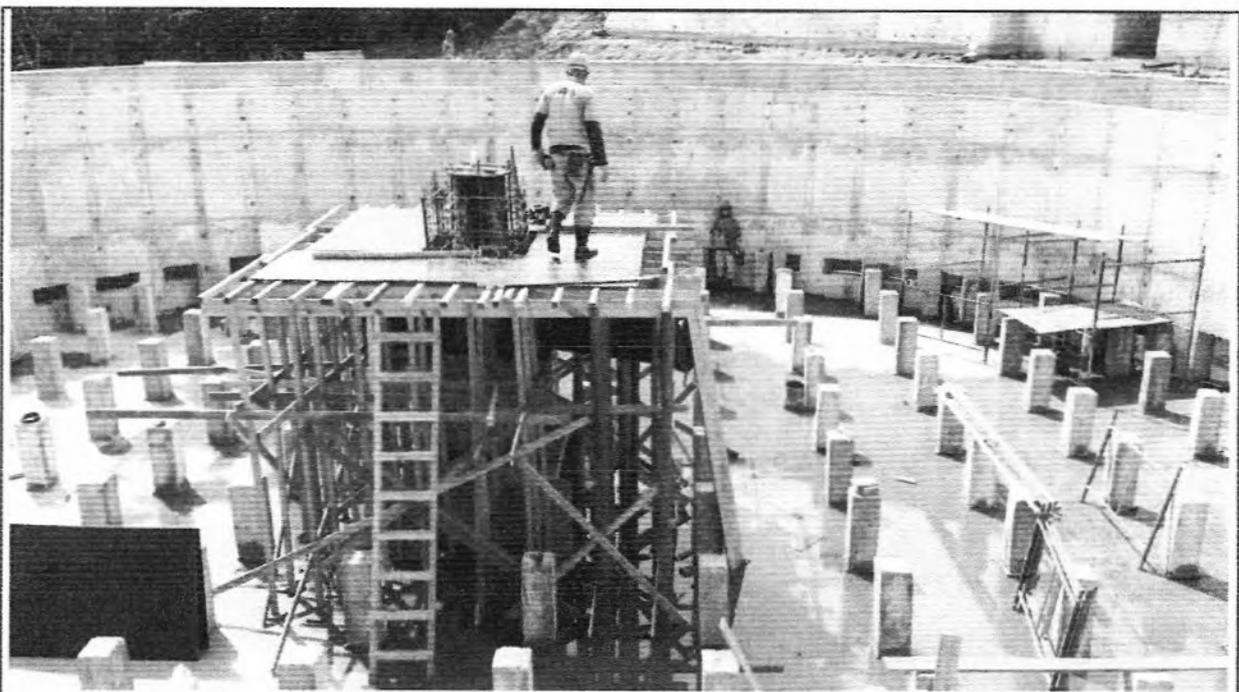

Descrição: Montagem de forma do pilar central do Filtro 1.

Foto: 08

Data: 21/03/14

Arquivo: 141312




Descrição: Concretagem da fundação e laje de fundo da Casa de Desidratação Lodo.

Foto: 09

Data: 21/03/14

Arquivo: 141442

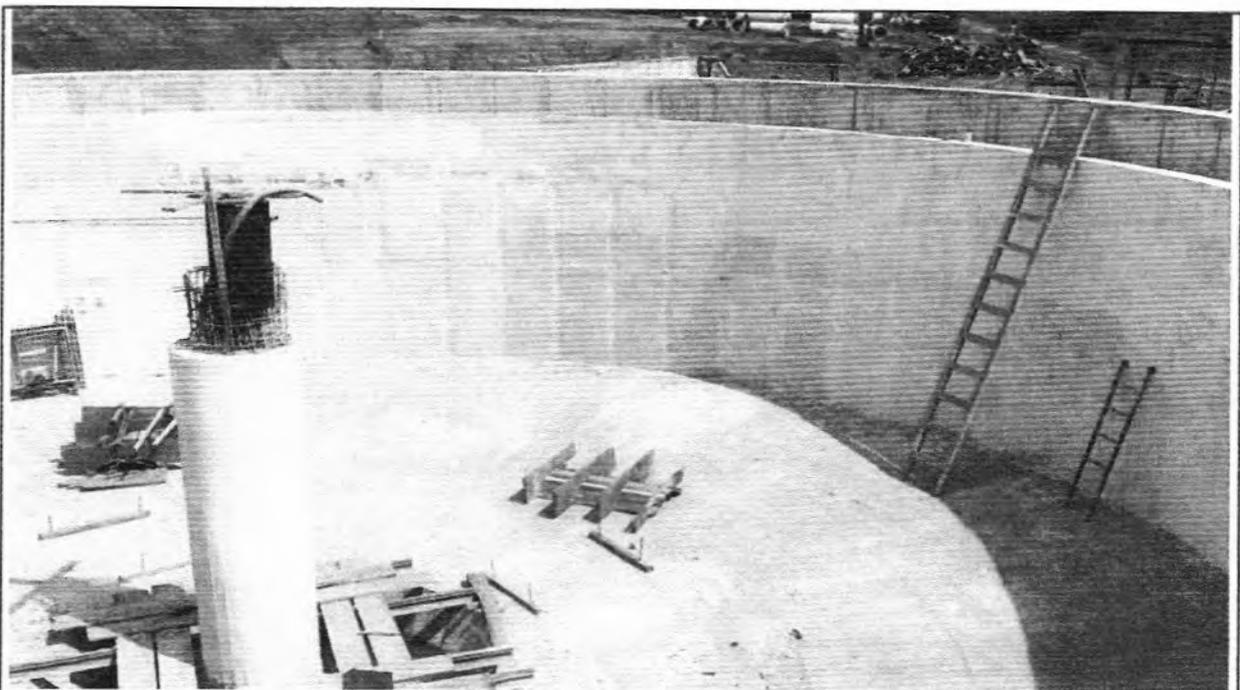

Descrição: Impermeabilização das paredes do Decantador 2.

Foto: 10

Data: 21/03/14

Arquivo: 141541




Descrição: Painel de Controle da Casa de Desidratação de Lodo.

Foto: 11

Data: 21/03/14

Arquivo: 142514

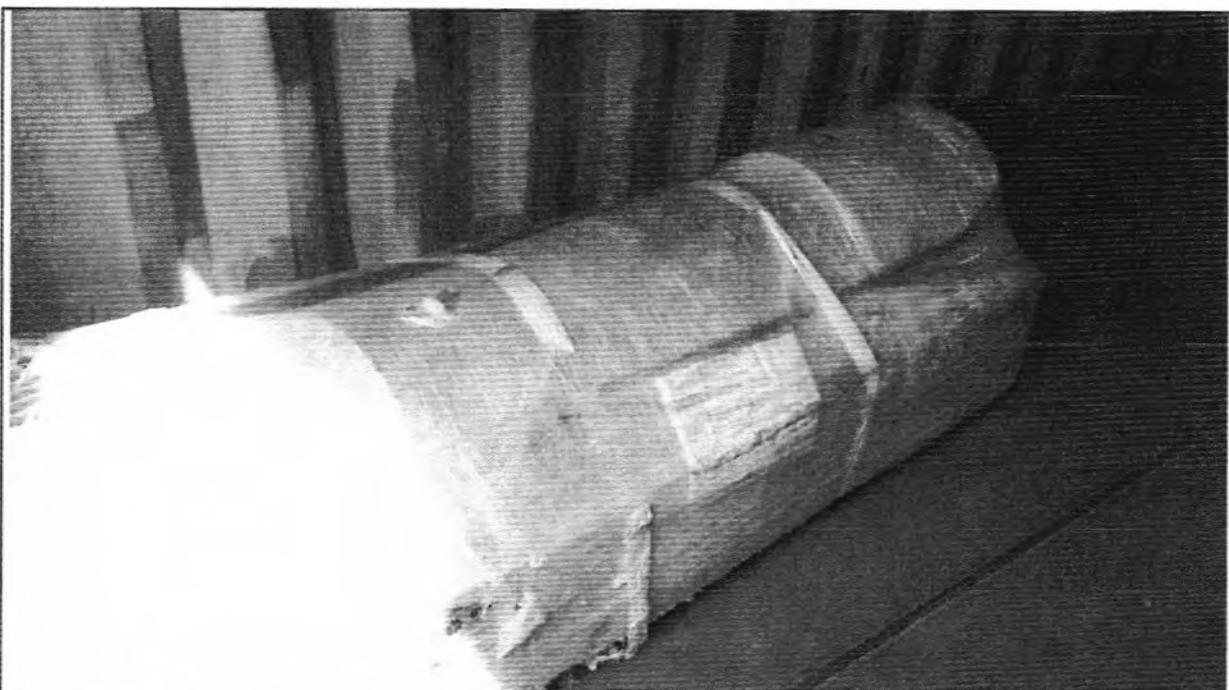

Descrição: Decanter centrífugo da Casa de Desidratação de Lodo.

Foto: 12

Data: 21/03/14

Arquivo: 142507



Descrição: Reservatório de hipoclorito.

Foto: 13

Data: 21/03/14

Arquivo: 142132

DTE-021/14

São Paulo, 04 de Abril de 2.014.

Ao

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET

Rua Clíneu Braga de Magalhães, 911

CEP 15900-000 - Centro

Taquaritinga - SP

Protocolo 000317 / 2014

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA

04/04/2014

14:58:43

Relatório de acompanhamento semanal/semana de 24 a 28/03/2.014

At.: Satoshi Yokoyama
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 24 a 28/03/2.014


Prezados Senhores (as),

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir.

- 1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 24 a 28/03/2.014, Revisão 0 (N/Ref.: GE-174-RE-AS-009-R0);

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Engº Francisco José Justo
Sócio Gerente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

**CONTRATO Nº 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS /
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL – 24 A 28/03/2014

**N/REF.: GE-174-RE-AS-009-R0
TAQUARITINGA -SP
MARÇO/2014**



PERTÉCNICA

APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato nº 045/2013, firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda.

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento físico das obras na semana de 24 a 28/03/2014.

ÍNDICE

- 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO**
- 2 - ATIVIDADES NA SEMANA DE 24 A 28/03/2014**
- 3 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO**

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

- **Programa:** Água Limpa

- **Agente Promotor:** Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos Saneamento

- **Agente Financeiro e Técnico:** Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE

- **Objeto:** Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE

- Recursos:

- . Fonte: Programa Água Limpa;
- . Valor: R\$;
- . Contrato nº;
- . Vigência:

- **Agente Executor:** Prefeitura Municipal de Taquaritinga

- . Prazo: 14 meses;
- . Início:

- Contratados

- . Gerenciamento das obras:
 - .. Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda.
 - .. Valor: R\$ 491.649,00.

- . Obras e serviços:
 - .. KMG Consultoria e Engenharia Ltda.
 - .. Valor: R\$ 14.249.469,14.

2 – ATIVIDADES NA SEMANA DE 24 A 28/03/2014

2 – ATIVIDADES NA SEMANA 24 A 28/03/2014

No período de 24 a 28/03/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de:

1) Acompanhamento da construção civil das unidades

→ Filtros Biológicos

- Concretagem dos pilaretes e das placas dos Filtros 1 e 2;
- Concretagem dos pilares centrais dos Filtros 1 e 2;
- Montagens de armaduras e formas do último nível dos pilares centrais dos Filtros 1 e 2;
- Limpeza e lavagem das paredes internas para impermeabilização do Filtro 2.

→ Decantador

- Armadura do último nível dos pilares centrais do Decantador 1 e 2.

→ Casa de Desidratação de Lodo

- Execução das paredes da unidade;
- Montagem de formas dos tanques de polímeros.

→ Reatores

- Cimbramento do escoramento e montagem de forma do Reator 1;
- Concretagem do primeiro lance de viga do Reator 1.

→ Tanque de Contato

- Regularização das paredes internas da unidade.

→ Caixa de Fluxo

- Regularização das paredes externas da Caixa de Fluxo 2.

→ Estação Elevatória de Recirculação

- Montagem de forma da laje da unidade.

2) Acompanhamento da instalação hidráulico – mecânica das unidades.

→ Linha de Derivação

- Assentamento da tubulação de ferro fundido (\varnothing 450 mm) do PVD 03 a Caixa de Fluxo 03 (L= 52,50 m);
- Assentamento da tubulação de ferro fundido (\varnothing 450 mm) do PVD 05 ao PVD 05 A (L= 19,00 m).

→ Emissário Final

- Locação do caminhamento da rede do emissário final e de águas pluviais.

→ Filtros Biológicos

- Alinhamento da tubulação dos pilares centrais dos Filtros 1 e 2;

→ Decantador / Caixa de Manobra

- Ligações das saídas de lodo dos Decantadores 1 e 2 para Caixa de Manobra 1 e 2.

3) Dados Gerais

- Em média a obra contou com 73 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 13:00 às 17:00h, sendo:

- 51 ajudantes;
- 10 pedreiros;
- 4 armadores;
- 4 encarregados;
- 3 carpinteiros;
- 1 almoxarife.

- Não foram constatadas chuvas no período.

- No período não ocorreram acidentes de trabalho.

- Em 26/03/2013 a obra recebeu os seguintes equipamentos:

- 2 bombas da unidade EE de Lodo;
- 2 bombas da unidade EE Recirculação;
- 2 bombas da unidade Casa Desidratação de Lodo;
- 2 misturadores da unidade Casa Desidratação de Lodo.




Descrição: Ligação da saída de esgoto do Decantador 1 para Caixa de Manobra 1.

Foto: 01

Data: 28/03/14

Arquivo: 154030

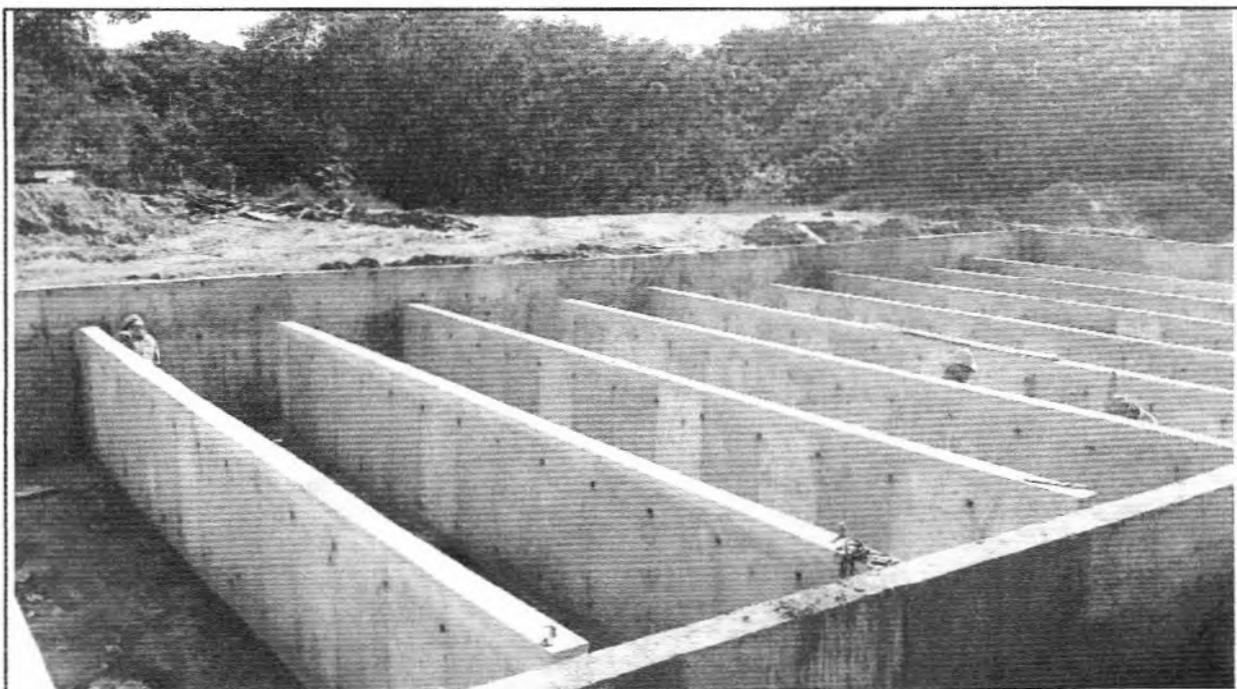

Descrição: Regularização das paredes internas do Tanque de Contato.

Foto: 02

Data: 28/03/14

Arquivo: 153528



Descrição: Ligação da saída de lodo do Decantador 2 para Caixa de Manobra 2.

Foto: 03

Data: 28/03/14

Arquivo: 154042




Descrição: Execução das paredes da Casa de Desidratação de Lodo.

Foto: 04

Data: 28/03/14

Arquivo: 154350

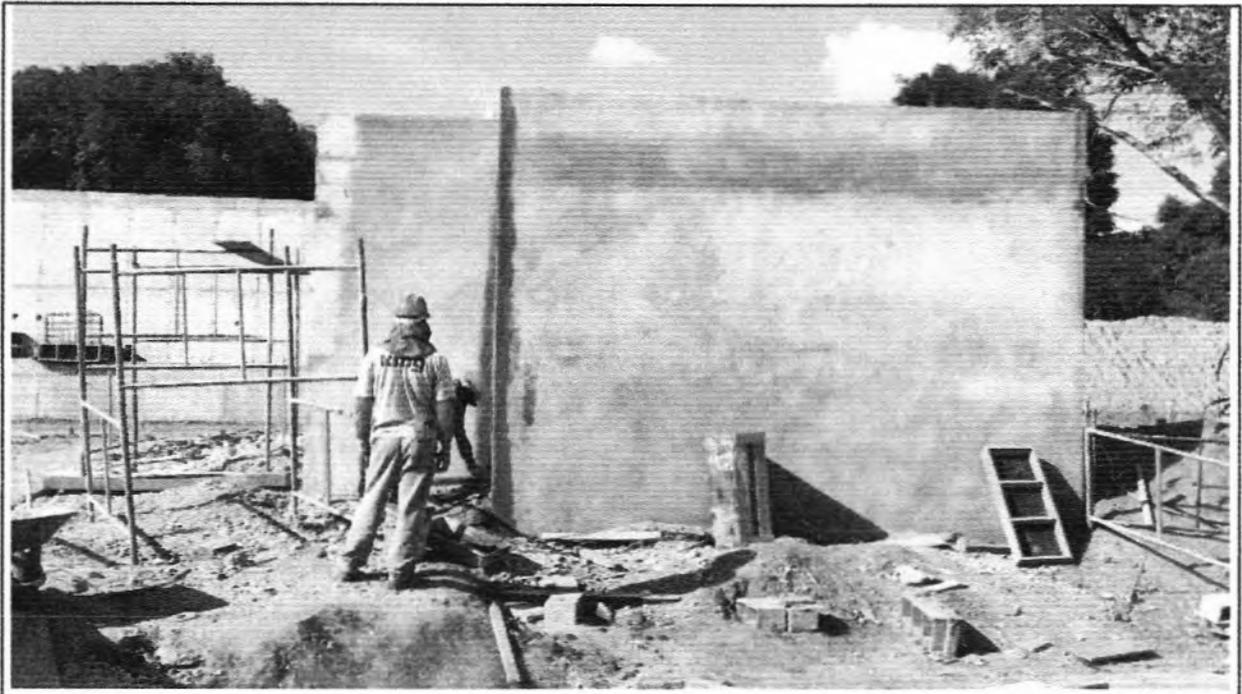


Descrição: Regularização das paredes externas da Caixa de Fluxo 2.

Foto: 05

Data: 28/03/14

Arquivo: 154519

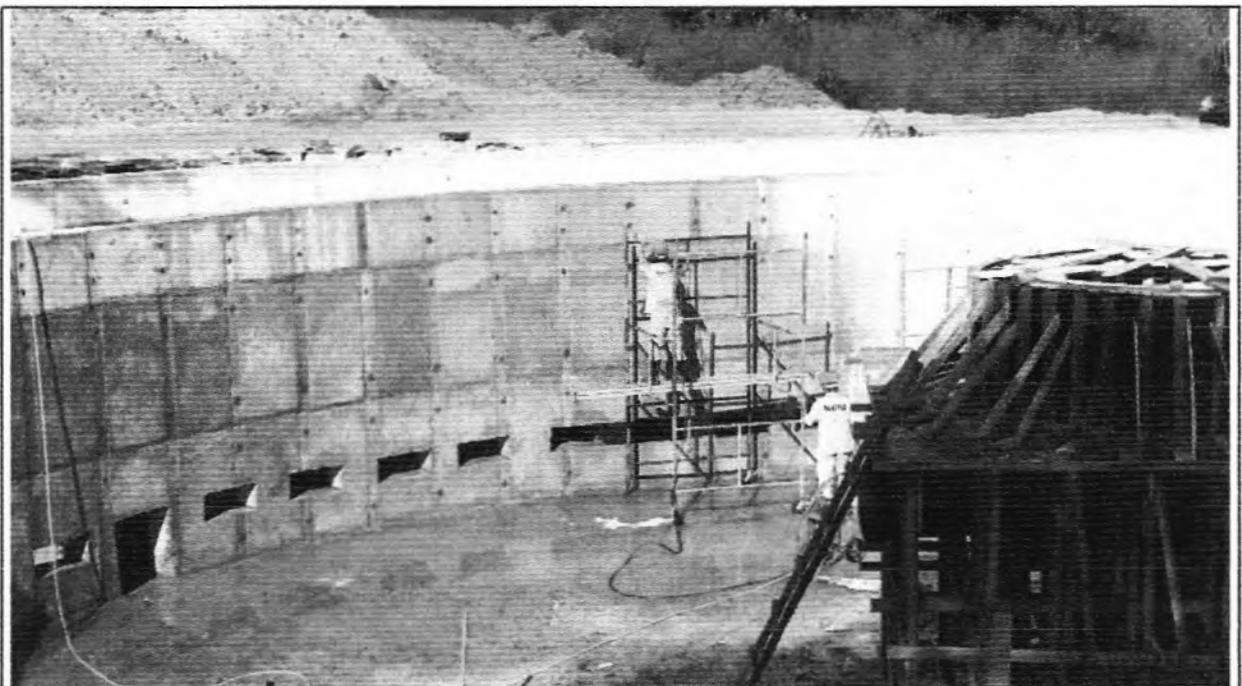


Descrição: Lavagem das paredes internas do Filtro 2.

Foto: 06

Data: 28/03/14

Arquivo: 154716

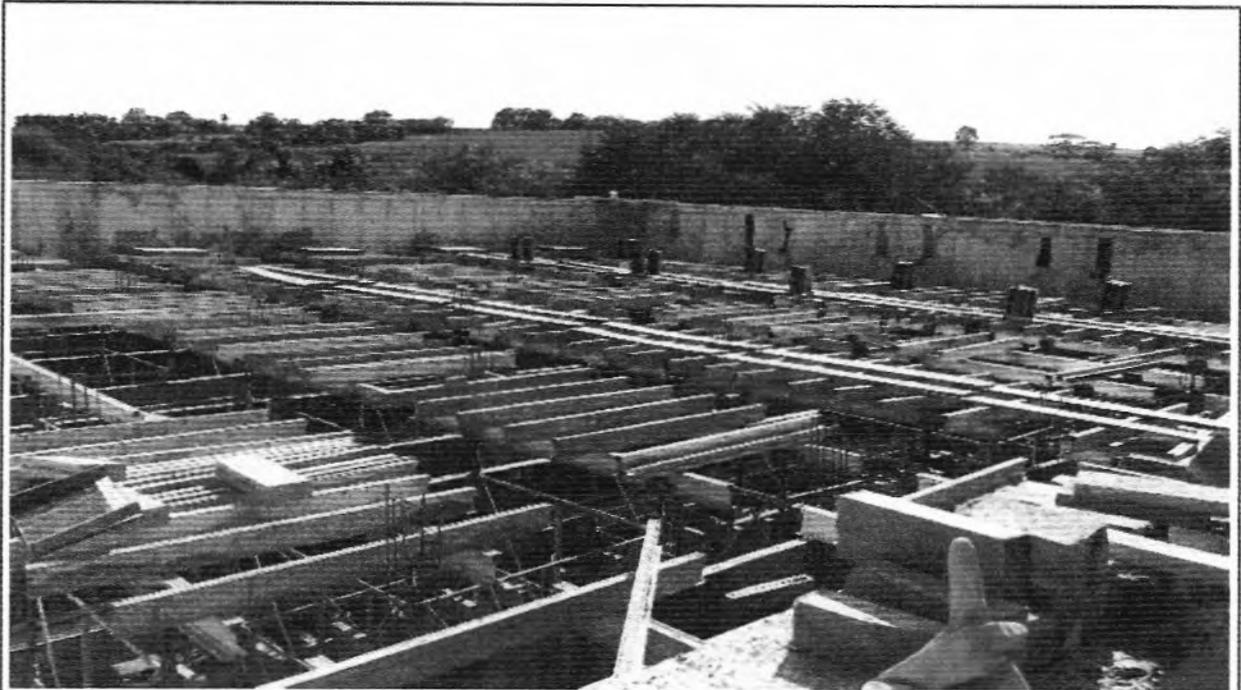


Descrição: Cimbramento do escoramento do Reator 1.

Foto: 07

Data: 28/03/14

Arquivo: 155548

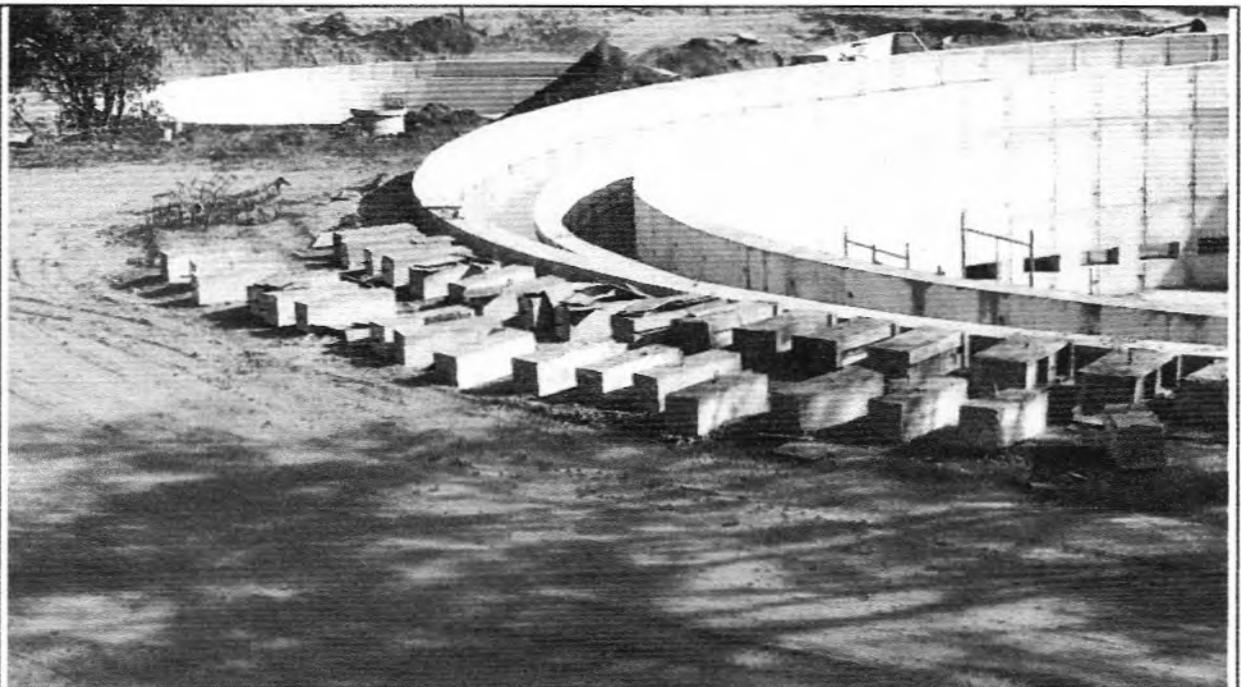


Descrição: Concretagem dos pilaretes dos Filtros 1 e 2.

Foto: 08

Data: 28/03/14

Arquivo: 155727

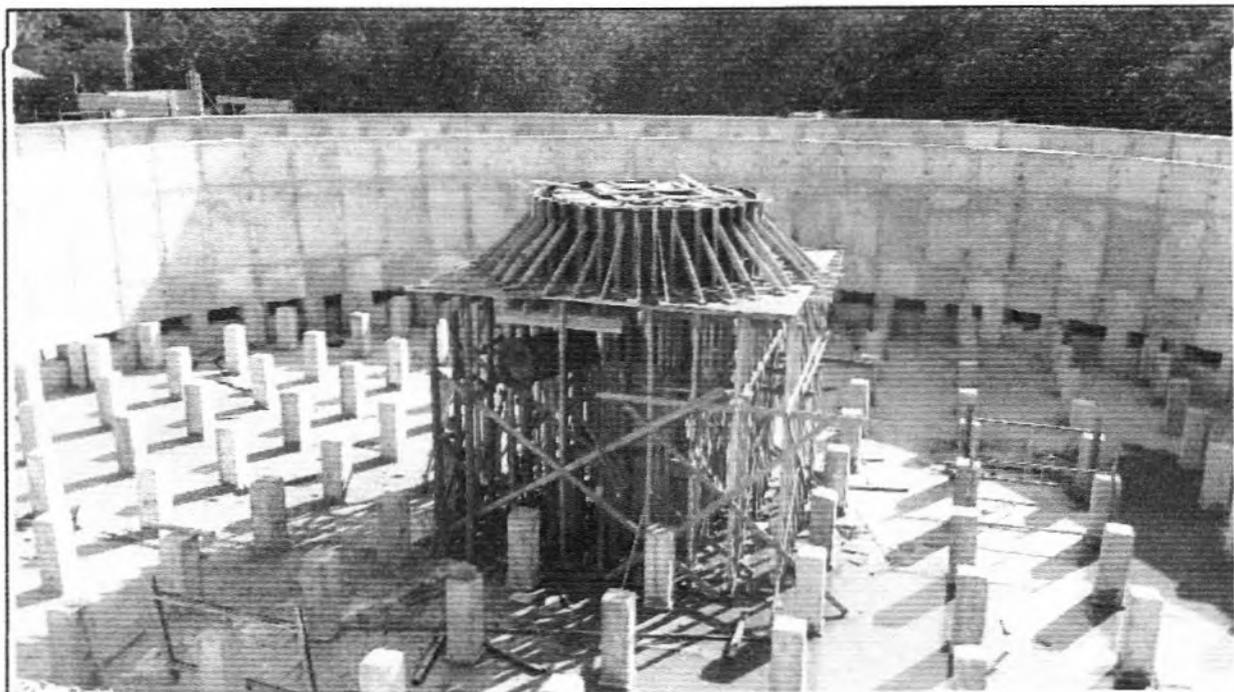


Descrição: Montagem de armadura e forma do ultimo lance do pilar central Filtro 1.

Foto: 09

Data: 28/03/14

Arquivo: 155815

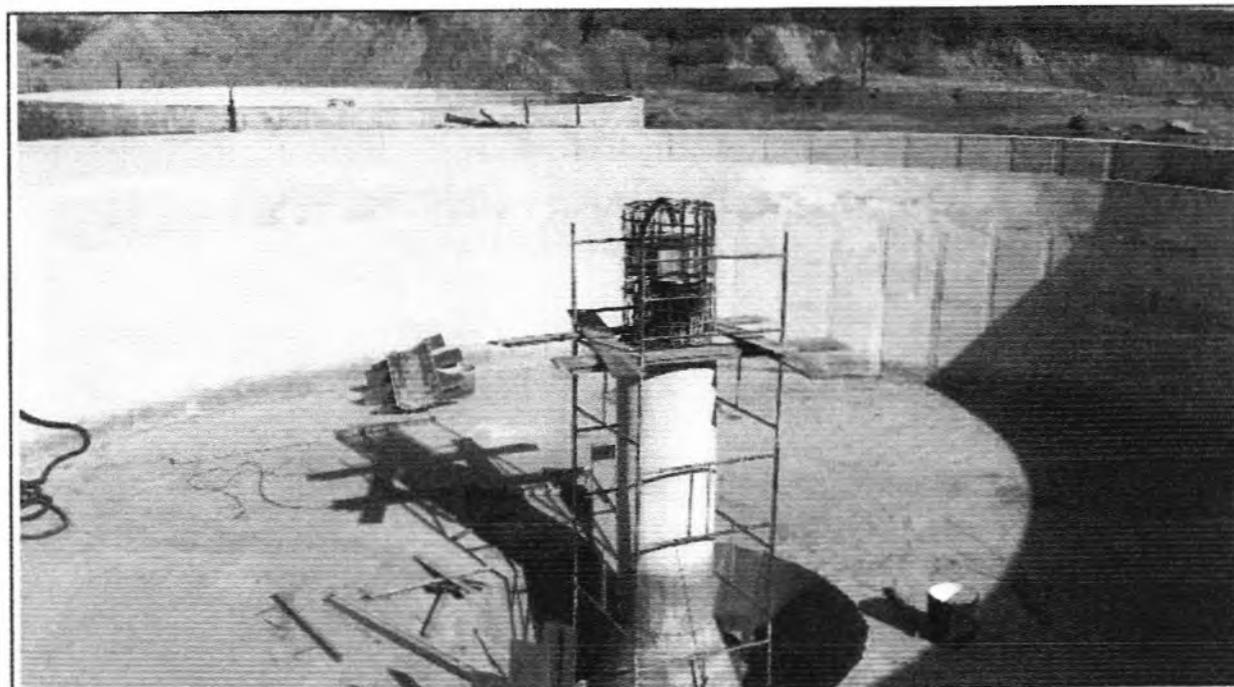

Descrição: Armadura do último lance do pilar central do Decantador 1.

Foto: 10

Data: 28/03/14

Arquivo: 155919



Descrição: Montagem de forma da laje da EE de Recirculação.

Foto: 11

Data: 28/03/14

Arquivo: 160042



Descrição: Misturadores da Casa de Deshidração de Lodo

Foto: 12

Data: 28/03/14

Arquivo: 164434



Descrição: Bombas referente as unidades EE de Lodo e Recirculação.

Foto: 13

Data: 28/03/14

Arquivo: 164448



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

**CONTRATO Nº 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS /
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE**

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – PERÍODO 01 A 31/03/2.014

**N/REF.: GE-174-RE-MA-003-R0
TAQUARITINGA -SP
ABRIL/2014**



PERTÉCNICA

APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir o "Relatório Mensal das Atividades – Período 01 a 31/03/2014" desenvolvidas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/2014, para o Contrato nº 045/2013, firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda.

ÍNDICE

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

2 - OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS

3 - AS OBRAS CONTRATADAS

4 - ATIVIDADES NO PERÍODO 01 A 31/03/2014

5 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO

6 - DESENHOS

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

- **Agente Promotor:** Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE

- **Agente Financeiro e Técnico:** Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE

- **Objeto:** Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede)

- **Recursos:**

- . Fonte: Programa Água Limpa;
- . Convênio nº 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011;
- . Valor: R\$ 14.491.618,13 – Exercício 2011;
- . Prazo: 24 meses

- **Agente Executor:** Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP

- **Contrato das obras e serviços:**

- . Processo licitatório: Concorrência nº 011/12;
- . Contrato nº 194/12, de 11/12/2.012;
- . Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.;
- . Valor: R\$ 11.431.936,13;
- . Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço;
- . Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 16/06/2.014;
- . Aditivo contratual de valor: R\$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013;
- . Valor contratual aditivado: R\$ 14.249.469,14.

2 - OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS

2 – OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS

O escopo dos trabalhos é a prestação de serviços de Gerenciamento das Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga através da Concorrência nº 011/2012, que resultou no Contrato nº 194/12, firmado com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda..

Os serviços do Gerenciamento deverão fornecer suporte técnico e operacional ao Serviço Municipal de Água e Esgoto de Taquaritinga – SAAET, na gestão da implantação do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários, de modo a assegurar que os projetos e obras sejam executados de acordo com o cronograma físico-financeiro contratados pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga, com a qualidade necessária definida nos projetos, memoriais descritivos e pelas normas brasileiras, gerenciando de maneira confiável e eficaz as seguintes frentes de trabalho:

- Fiscalização e acompanhamento das obras e adequações realizadas pelas empreiteiras para atendimento a alterações definidas por órgãos públicos ou equivalentes, tais como concessionárias de serviços públicos, dentre outros;
- Elaboração de elementos técnicos para processos de contratação de projetos, obras e serviços;
- Acompanhamento da elaboração e compatibilização de projetos complementares;
- Acompanhamento dos cronogramas das obras das edificações;
- Acompanhamento dos cronogramas das obras de infraestrutura e compatibilização dos mesmos com o cronograma geral do empreendimento;
- Acompanhamento da execução de serviços relativos à infraestrutura, envolvendo serviços preliminares, terraplenagem, micro e macro drenagem, contenções, redes de abastecimento de água, redes coletoras de esgoto, redes de energia elétrica, pavimentação, obras de arte em concreto, urbanização e paisagismo que se aplicarem a implantação em foco;
- Registro e organização do arquivo "as-built" como referência essencial para realização de manutenções e eventuais reparos após a implantação do empreendimento;
- Realização de consultoria técnica especializada para solução de problemas específicos relacionados ao projeto, à construção ou ao licenciamento/regularização das obras;
- Realização de atividades de Pré-Operação (Comissionamento):
- Todos os demais serviços que venham a ser identificados como necessários para a viabilização do empreendimento e para atendimento das funcionalidades desejadas e estabelecidas pelo SAAET.

3 - AS OBRAS CONTRATADAS

3 - AS OBRAS CONTRATADAS

As obras foram licitadas e contratadas pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda., de acordo o Projeto Básico das Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga, elaborado pela empresa Engecorps – Corpo de Engenheiros Consultores Ltda., em Dezembro/2.009, contratada pelo Departamento de Águas Energia Elétrica – DAEE, para a execução de Projetos de Sistemas de Esgoto Sanitário, dentro do Projeto Água Limpa, Lote 1.

Ao longo da execução das obras, o Projeto Básico Engecorps - 12/2.009 foi revisado pela KMG, em função, entre outras justificativas, para atender as demandas projetadas para a população urbana de Taquaritinga, evoluídas a partir dos dados populacionais atualizados disponibilizados pelo Censo IBGE/2.010. A KMG subcontratou a revisão dos projetos com a empresa Sistemas Ambientais Engenharia, Consultoria e Saneamento Ltda.

O desenho Implantação - Fl. 1/1 (fornecido pela KMG) apresentado no Capítulo 6 à frente, ilustra o projeto revisado mostrando as alterações feitas.

O quadro 1 a seguir discrimina as Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas e contratadas com KMG, bem como, valores aditados ao contrato em função da revisão do Projeto Básico.

- Quadro 1 - Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS (R\$)	
		ORIGINAL	COM ADITIVO
1	EMISSÁRIO BRUTO EMB01	32.367,61	24.883,38
2	EEE FINAL	732.407,51	870.040,40
3	LINHA DE RECALQUE	138.249,42	101.659,03
4	MOVIMENTO DE TERRA ETE	329.817,66	329.817,66
5	GUARITA	38.884,13	39.272,44
6	ADMINISTRAÇÃO	167.384,94	160.426,38
7	GRADEAMENTO E DESARENAÇÃO	586.074,91	557.236,70
8	REATORES ANAERÓBICOS 1 E 2	1.842.451,97	3.164.878,20
9	FILTROS BIOLÓGICOS 1 E 2	1.738.586,37	2.527.587,55
10	DECANTADORES SECUNDÁRIOS 1 E 2	1.066.535,54	1.704.851,46
11	EE DE RECIRCULAÇÃO	485.284,77	612.831,78
12	CÂMARA DE CONTATO	382.806,39	382.806,39
13	CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO	306.118,28	303.715,24
14	EE DE LODO ADENSADO	70.946,26	74.582,26
15	ADENSADOR DE LODO	154.552,19	0,00
16	TANQUES DE HIPOCLORITO	151.058,56	151.058,56
17	EFLUENTE FINAL	415.844,16	184.121,55
18	INTERLIGAÇÕES DO SISTEMA	582.679,84	737.470,25
19	SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	44.414,70	47.836,89
20	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	257.978,71	207.325,28
21	CAIXAS DE FLUXO 1, 2 E 3	393.197,26	417.382,13
22	URBANIZAÇÃO DA ETE	834.620,53	723.344,73
23	SERVIÇO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	574.674,42	574.674,42
24	SUPERVISÃO E CONTROLE	105.000,00	105.000,00
25	PROJETO	0,00	60.000,00
26	SISTEMA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA	0,00	186.666,46
	VALOR TOTAL	11.431.936,13	14.249.469,14

4 - ATIVIDADES NO PERÍODO 01 A 31/03/2014

4 – ATIVIDADES NO PERÍODO 01 A 31/03/2014

4.1 - Equipe Técnica

O quadro a seguir, indica a relação nominal e qualificação dos profissionais de nível superior componentes da equipe técnica alocada para o desenvolvimento das atividades da Gerenciadora no período de 01 a 31/03/14:

NOME	FORMAÇÃO	CATEGORIA PROFISSIONAL	EXPERIÊNCIA (ANOS)	QUALIFICAÇÃO
Francisco José Justo	Eng ^a Sanitária	Eng ^o Senior	30	Responsabilidade técnica do contrato e do gerenciamento das obras
Francisco M. Raposo	Eng ^a Civil	Eng ^o Senior	36	Coordenação do gerenciamento de obras
Maurício Lopes Brandão	Eng ^a Civil	Eng ^o Senior	21	Consultoria e gerenciamento de obras de Saneamento Ambiental
Guilherme Georgetti Fernandes	Eng ^a Ambiental	Eng ^a Júnior	03	Gerenciamento de obras de Saneamento Ambiental

4.2 - Atividades desenvolvidas pela Gerenciadora no período de 01 a 31/03/2014:

4.2.1 - Reuniões de trabalho com o SAAET Em 28/03/2014

- Pertécnica entregou ao SAAET resumo das atividades e procedimentos a serem desenvolvidos na fase de pré-operação da ETE;

- A KMG relatou que entre o projeto básico e o projeto de adequação houve uma alteração na locação em planta do emissário final, com diminuição da extensão do caminhamento. Devido à alteração da locação do emissário final, a P.M. Taquaritinga providenciou novo levantamento e cadastro da cobertura vegetal ao longo do caminhamento, para pedido de adequação da licença ambiental perante o órgão responsável (Cetesb).

- Foi solicitado à KMG documentos para o Gerenciamento da Obra, constando:

- . Plano de Obras;
- . Especificação dos equipamentos comprados;
- . Laudo de controle tecnológico do concreto.

- O caminhamento do emissário final ocorreu uma diferença do projeto básico para o projeto de

4.2.2 - Acompanhamento da construção civil das unidades

→ Decantador

- Limpeza e grauteamento nas paredes do Decantador 2;
- Montagem de forma do pilar central do Decantador 1;
- Finalização do acabamento das paredes do Decantador 1;
- Lavagem e impermeabilização Decantador 1 e 2;
- Concretagem do pilares centrais do Decantador 1 e 2.

→ Casa de Desidratação de Lodo

- Execução da fundação da unidade;
- Armadura da viga baldre e laje de fundo;
- Concretagem da fundação e laje de fundo;
- Execução das paredes da unidade;
- Montagem de formas dos tanques de polímeros.

→ Reatores

- Montagem das formas das paredes da caixa de espuma do Reator 1 e 2;
- Limpeza e acabamento das paredes do Reator 1.
- Montagem do cimbramento e escoramento e formas das estruturas internas do Reator 1;
- Concretagem das caixas de espuma Reator 1 e 2;
- Concretagem das canaletas de efluente Reator 1 e 2;
- Armadura das vigas internas do Reator 1;
- Concretagem do primeiro lance de viga do Reator 1.

→ Caixa de Fluxo

- Limpeza da Caixa de Fluxo 2 e 3.
- Impermeabilização da Caixa de Fluxo 1;
- Regularização das paredes externas da Caixa de Fluxo 2.

→ Estação Elevatória de Recirculação

- Concretagem do último lance de paredes;
- Desforma das paredes.

→ Caixa de Manobra

- Concretagem do último lance de paredes da Caixa de Manobra 1 e 2;
- Desforma das paredes da Caixa de Manobra 1 e 2.

→ Filtros Biológicos

- Concretagem dos pilares e das placas dos Filtros 1 e 2;
- Concretagem dos pilares centrais dos Filtros 1 e 2;
- Limpeza e lavagem das paredes internas para impermeabilização do Filtro 2.
- Montagens de formas para finalização dos pilares centrais dos Filtros 1 e 2.

→ Tanque de Contato

- Regularização das paredes internas da unidade.

→ Estação Elevatória Final

- Impermeabilização das paredes internas.

→ Estação Elevatória de Recirculação

- Desforma das paredes;
- Montagem de forma da laje da unidade.

4.2.3 - Acompanhamento da execução hidráulica das unidades.

→ Linha de Recalque EE Final

- Início do assentamento da tubulação do recalque

→ Filtros Biológicos

- Montagem da tubulação interna de ferro fundido (\varnothing 450 mm) dos Filtros 1 e 2.

→ Linha de Derivação

- Assentamento da tubulação de ferro fundido (Ø 450 mm) do PVE 06 ao PVD 03 (L= 33,20m);
- Assentamento da tubulação de ferro fundido (Ø 450 mm) do PVD 03 a Caixa de Fluxo 01 (L= 144,00 m).

→Linha de Efluente

- Assentamento da tubulação de ferro fundido (Ø 600 mm) do PVE 06 ao Tanque de Contato (L= 20,00 m).

4.2.4 - Dados gerais

- Em média a obra contou com 73 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 13:00 às 17:00h.

- 51 ajudantes;
- 10 pedreiros;
- 4 armadores;
- 4 encarregados;
- 3 carpinteiros;
- 1 almoxarife.

- Foram constatadas chuvas no período nos dias 03, 05 e 20/03/2014.

- Todos operários estavam com EPI's.

- No período não ocorreram acidentes de trabalho.

- No dia 17/03/2014 foi realizado a assinatura do Boletim Medição 15.


- Em 18 e 26/03/2013 entrega dos seguintes equipamentos:

- Painel de controle da Casa de Desidratação de Lodo;
- Decanter centrífugo da Casa de Desidratação de Lodo;
- Dois reservatórios de hipoclorito;
- 2 bombas da unidade EE de Lodo;
- 2 bombas da unidade EE Recirculação;
- 2 bombas da unidade Casa Desidratação de Lodo;
- 2 misturadores da unidade Casa Desidratação de Lodo.

4.2.5 – Acompanhamento Físico-Financeiro das Obras e Serviços

A planilha à frente, indica a posição física e financeira das Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), quando da realização da Medição nº 16 das Obras e Serviços, referentes ao período compreendido entre 01 e 31/03/2014, com a contratada KMG.



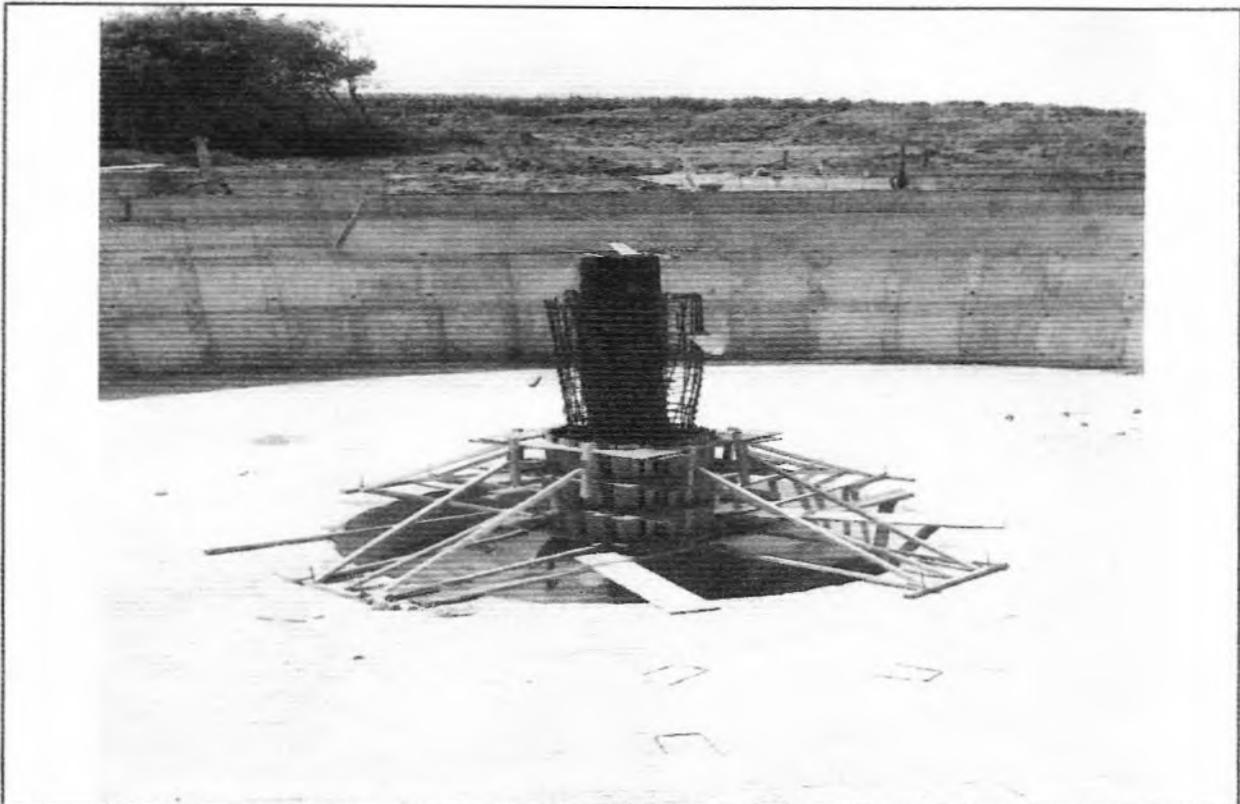


Descrição: Montagem da forma do pilar central do Decantador 1.

Foto: 01

Data: 07/03/14

Arquivo: 112437

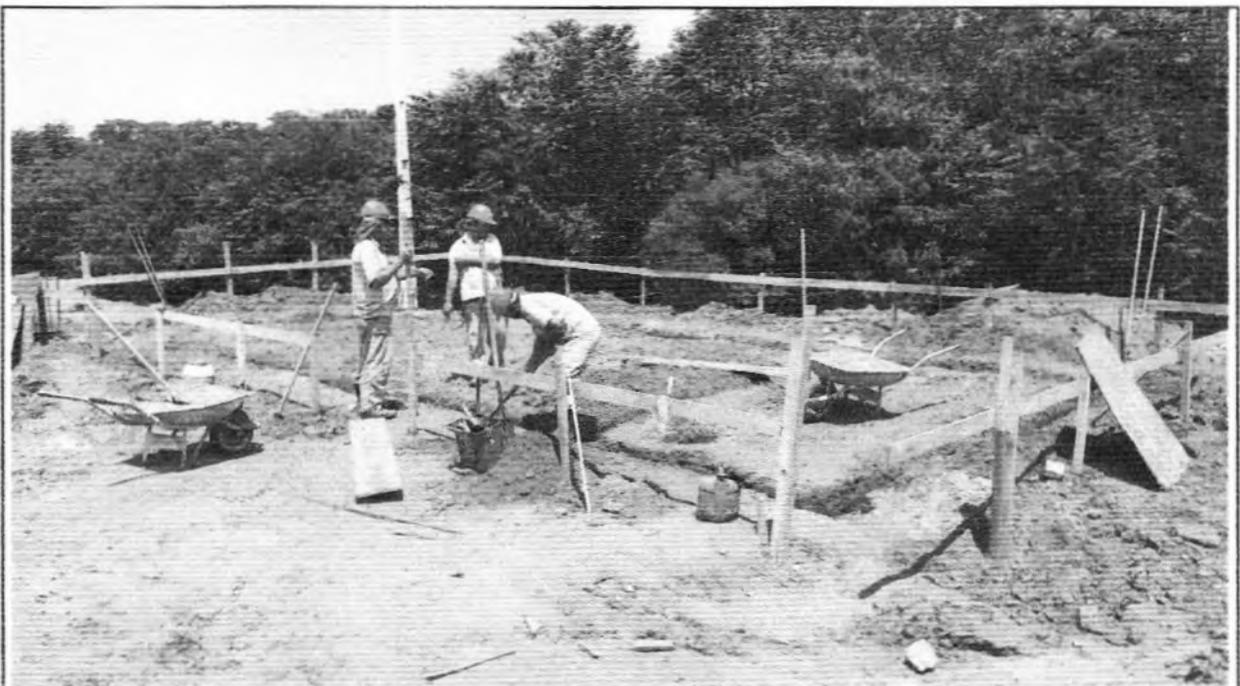


Descrição: Fundação da Casa de Desidratação de Lodo.

Foto: 02

Data: 07/03/14

Arquivo: 112832

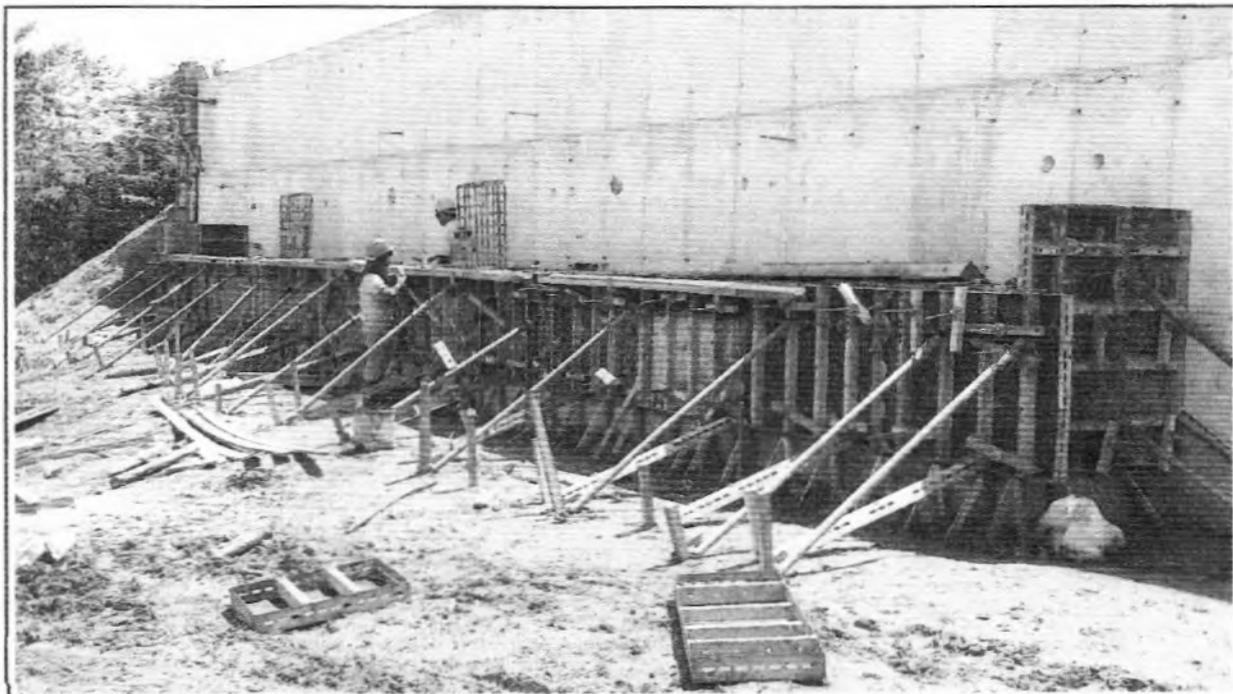

Descrição: Montagem da forma da caixa de espuma do Reator 1.

Foto: 03

Data: 07/03/14

Arquivo: 113554




Descrição: Execução da linha de recalque da EE Final / Tratamento Preliminar

Foto: 04

Data: 07/03/14

Arquivo: 114436

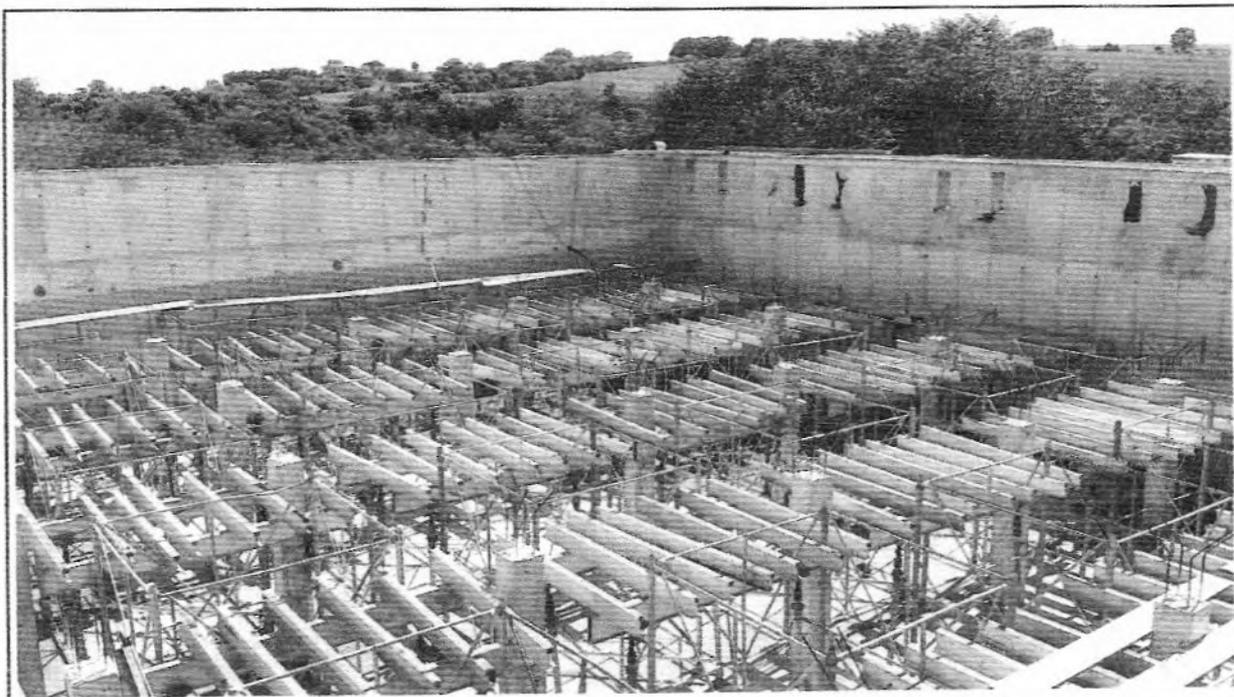


Descrição: Montagem do escoramento Reator 1.

Foto: 05

Data: 17/03/14

Arquivo: 143639

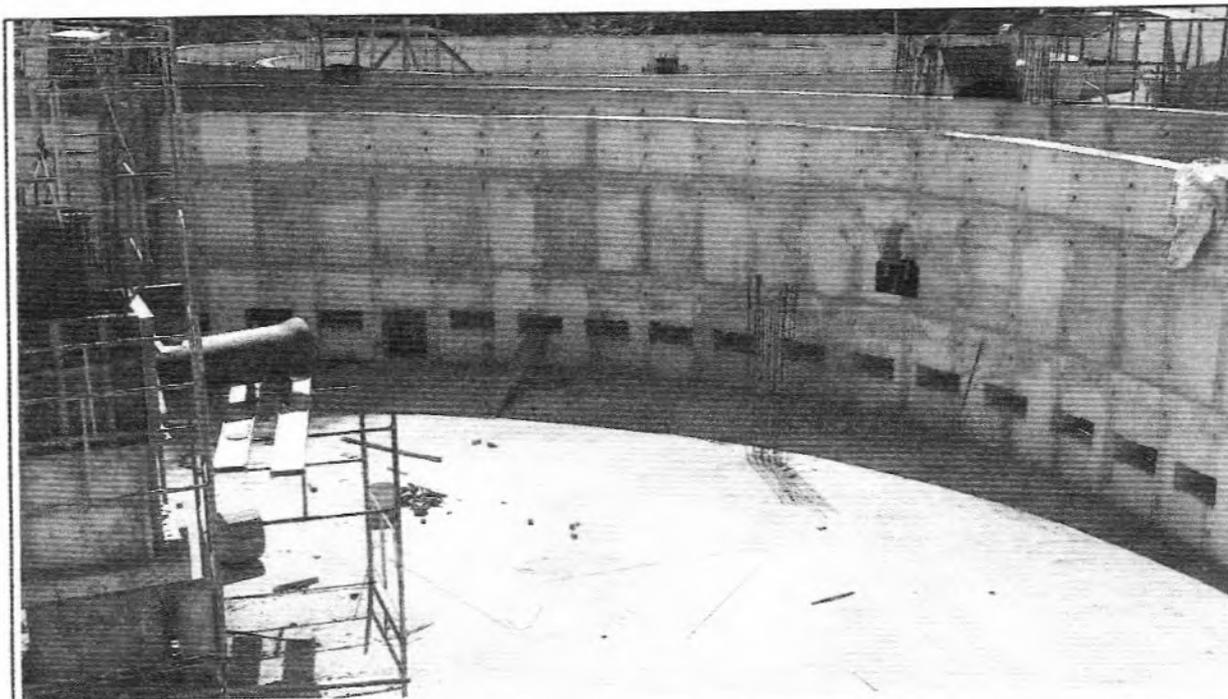


Descrição: Montagem da tubulação interna Filtro2.

Foto: 06

Data: 07/03/14

Arquivo: 143912

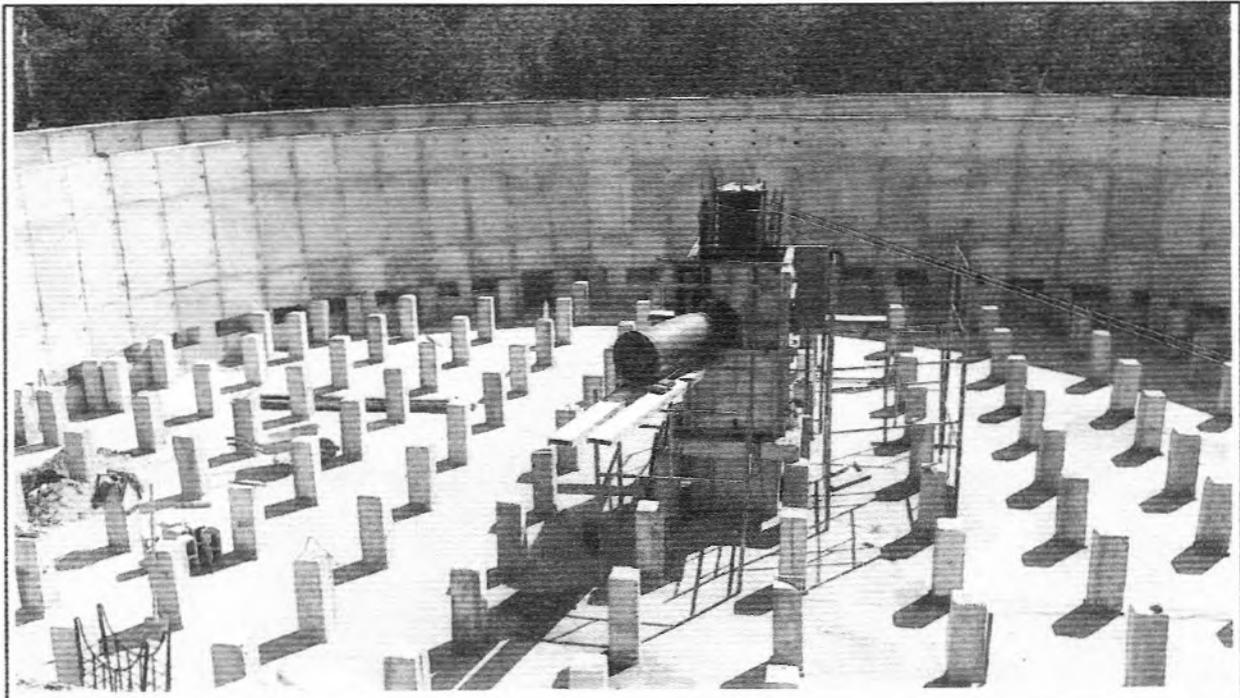


Descrição: Montagem da tubulação interna Filtro 1.

Foto: 07

Data: 17/03/14

Arquivo: 144036

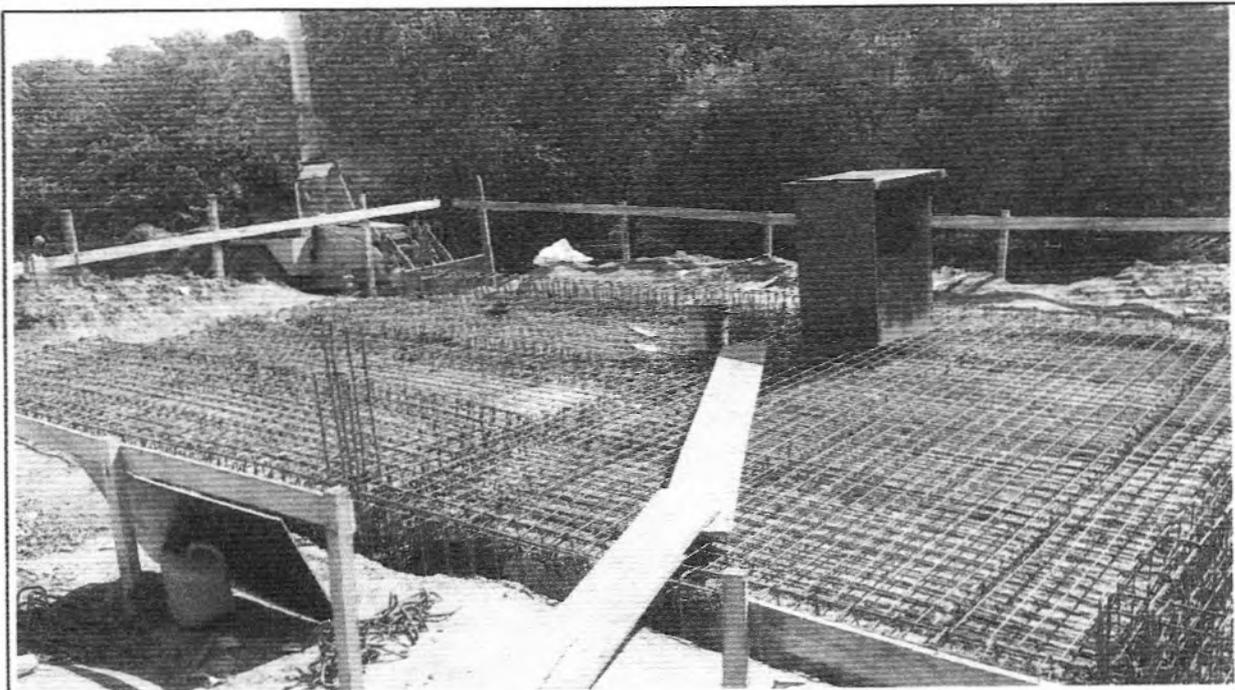


Descrição: Armadura da viga baldre e laje de fundo Casa Desidratação de Lodo.

Foto: 08

Data: 17/03/14

Arquivo: 144232

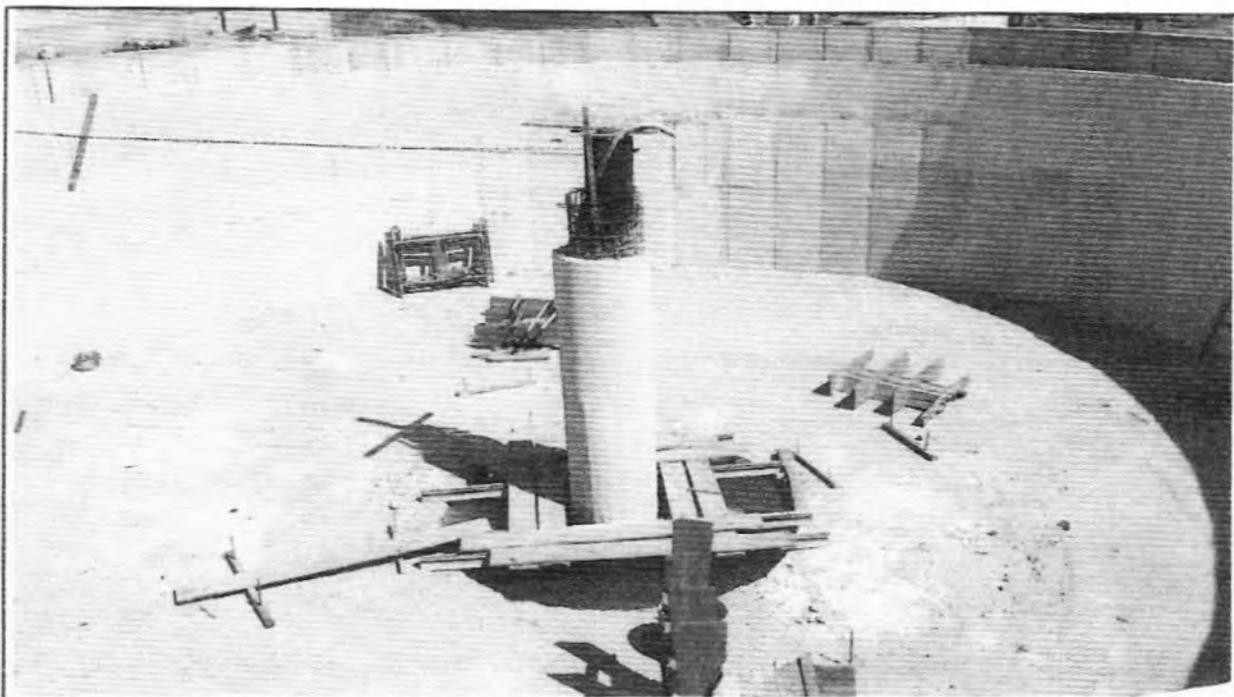


Descrição: Concretagem do pilar central e impermeabilização do Decantador 1 e 2.

Foto: 09

Data: 17/03/14

Arquivo: 144303

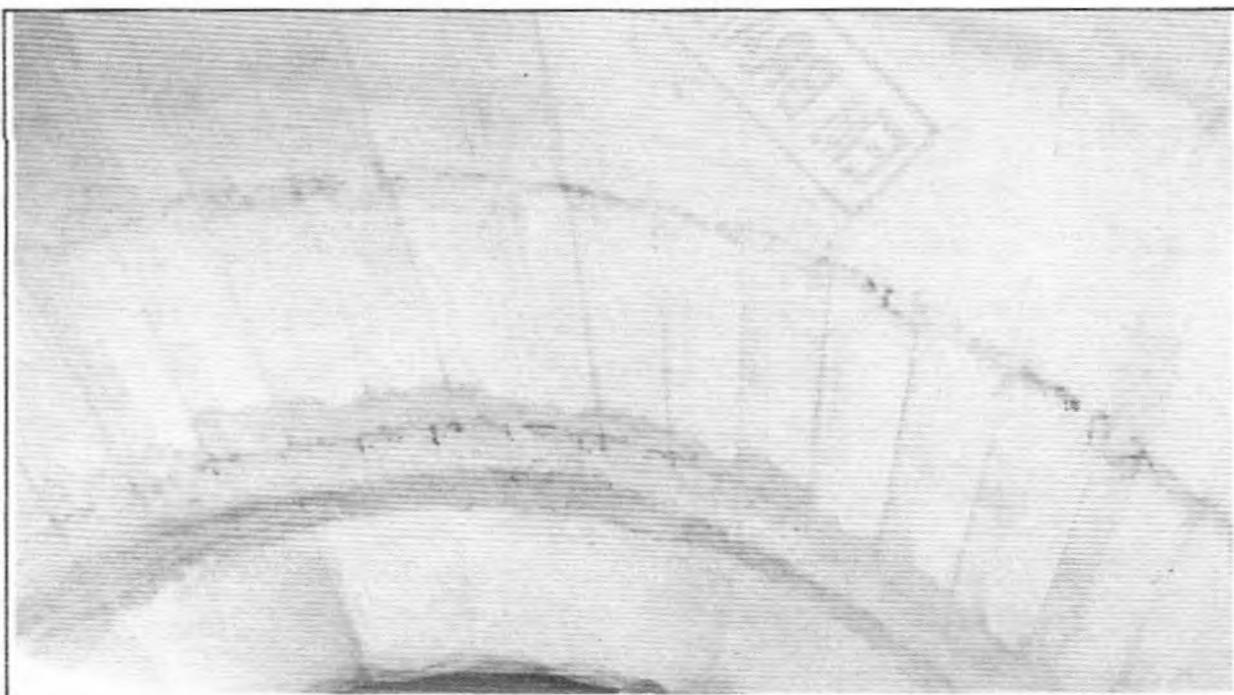


Descrição: Impermeabilização das paredes internas da EE Final.

Foto: 10

Data: 21/03/14

Arquivo: 140347

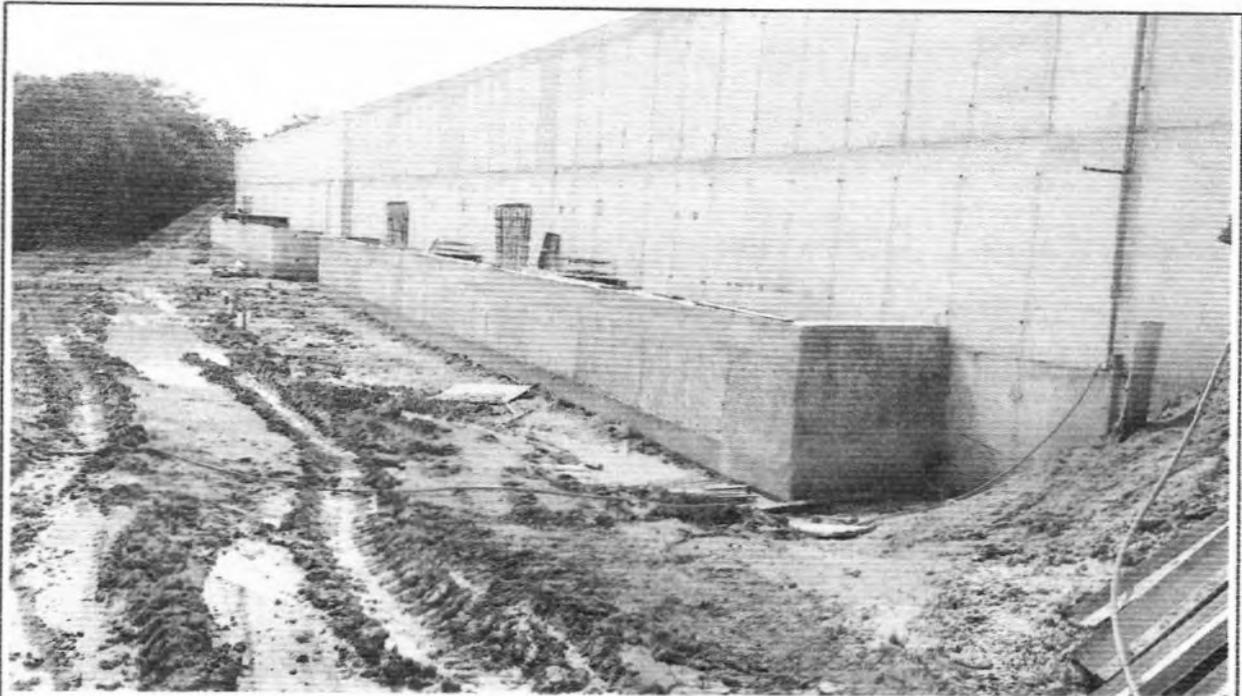


Descrição: Concretagem e desforma da Caixa de Escuma do Reator 2.

Foto: 11

Data: 21/03/14

Arquivo: 141131

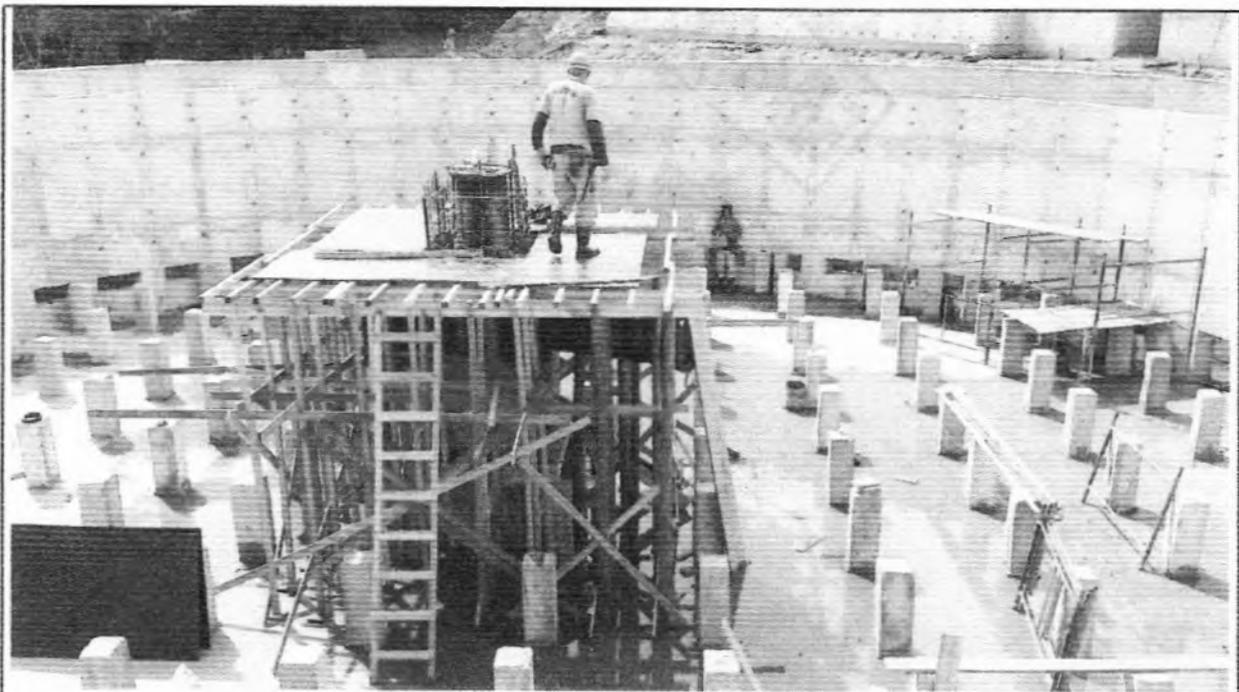

Descrição: Montagem de forma do pilar central do Filtro 1.

Foto: 12

Data: 21/03/14

Arquivo: 141312



Descrição: Reservatório de hipoclorito.

Foto: 13

Data: 21/03/14

Arquivo: 142132



Descrição: Decanter centrífugo da Casa de Desidratação de Lodo.

Foto: 14

Data: 21/03/14

Arquivo: 142507




Descrição: Execução das paredes da Casa de Desidratação de Lodo.

Foto: 15

Data: 28/03/14

Arquivo: 154350

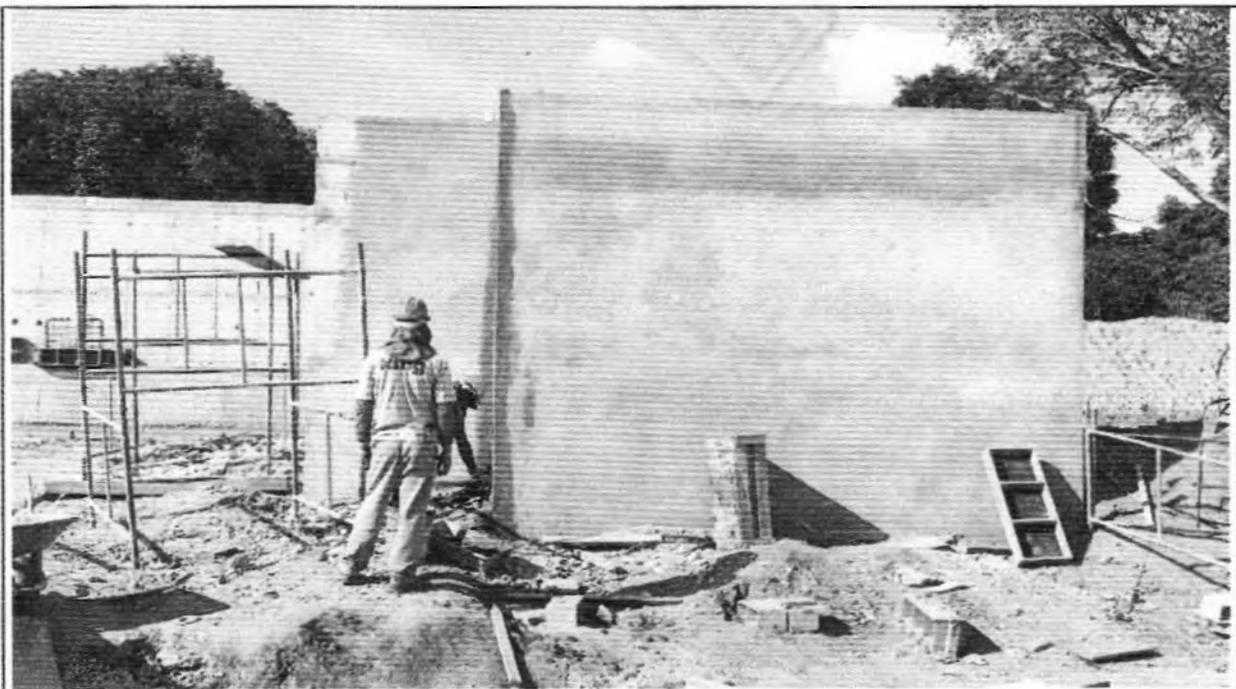


Descrição: Regularização das paredes externas da Caixa de Fluxo 2.

Foto: 16

Data: 28/03/14

Arquivo: 154519

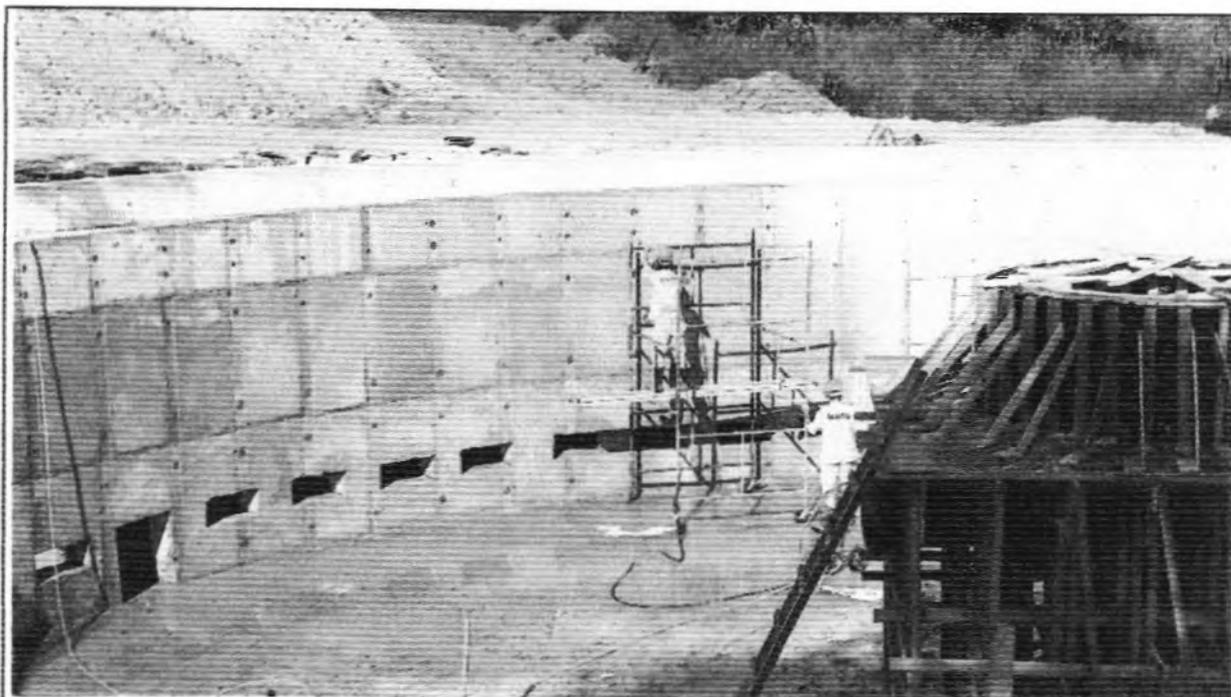

Descrição: Lavagem das paredes internas do Filtro 2.

Foto: 17

Data: 28/03/14

Arquivo: 154716



Descrição: Misturadores dos Tanques de Polimeros da Casa de Desidratação de Lodo

Foto: 18

Data: 28/03/14

Arquivo: 164434



Descrição: Concretagem dos pilaretes dos Filtros 1 e 2.

Foto: 19

Data: 28/03/14

Arquivo: 155727



6 - DESENHOS

"Relação de Desenhos"

Item	Título	Nº Desenho Contratada	Escala	Formato	Rev.
1	Implantação - Fl. 01/01	KMG s/nº	1:500	A1	0





EM BRANCO



DTE-022/14

São Paulo, 11 de Abril de 2.014.

Ao

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET

Rua Clineu Braga de Magalhães, 911

CEP 15900-000 - Centro

Taquaritinga - SP

At.: Satoshi Yokoyama
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 31/03 a 04/04/2.014


Prezados Senhores (as),

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir:

- 1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 31/03 a 04/04/2.014, Revisão 0 (N/Ref.: GE-174-RE-AS-010-R0);

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Engº Francisco José Justo
Sócio Gerente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

**CONTRATO Nº 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS /
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL – 31/03 A 04/04/2014

**N/REF.: GE-174-RE-AS-010-R0
TAQUARITINGA -SP
ABRIL/2014**



APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato nº 045/2013, firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda.

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento físico das obras na semana de 31/03 a 04/04/2014.

ÍNDICE

- 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO**
- 2 - ATIVIDADES NA SEMANA DE 31/03 A 04/04/2014**
- 3 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO**

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

- **Programa:** Água Limpa

- **Agente Promotor:** Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos Saneamento

- **Agente Financeiro e Técnico:** Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE

- **Objeto:** Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE

- **Recursos:**

- . Fonte: Programa Água Limpa;
- . Valor: R\$;
- . Contrato nº;
- . Vigência:

- **Agente Executor:** Prefeitura Municipal de Taquaritinga

- . Prazo: 14 meses;
- . Início:

- **Contratados**

- . Gerenciamento das obras:
 - .. Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda.
 - .. Valor: R\$ 491.649,00.

- . Obras e serviços:
 - .. KMG Consultoria e Engenharia Ltda.
 - .. Valor: R\$ 14.249.469,14.

2 – ATIVIDADES NA SEMANA DE 31/03 A 04/04/2014

2 – ATIVIDADES NA SEMANA 31/03 A 04/04/2014

No período de 31/03 a 04/04/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de:

1) Acompanhamento da construção civil das unidades

→ Filtros Biológicos

- Concretagem dos pilaretes e das placas dos Filtros 1 e 2;
- Concretagem da copa dos pilares centrais dos Filtros 1 e 2;
- Regularização das canaletas superiores dos Filtros 1 e 2;
- Regularização da canaleta inferior do Filtro 1;
- Impermeabilização das paredes internas do Filtro 2.

→ Decantador

- Concretagem do último nível dos pilares centrais dos Decantadores 1 e 2.

→ Casa de Desidratação de Lodo

- Concretagem dos tanques de polímeros;
- Cimbramento da laje da unidade;
- Armadura e montagem de forma das vigas superiores.

→ Reatores

- Armadura e montagem de forma do terceiro lance de vigas do Reator 1;
- Concretagem do segundo lance de vigas do Reator 1.

→ Tanque de Contato

- Término da regularização das paredes internas;
- Impermeabilização das paredes internas.

→ Caixa de Fluxo

- Regularização das paredes externas da Caixa de Fluxo 2.

→ Caixa de Manobra

- Finalização da regularização das paredes das Caixas de Manobras 1 e 2.

→ Estação Elevatória de Recirculação

- Armadura e montagem de forma da laje da unidade.

→ Estação Elevatória de Lodo

- Escavação e gabarito da unidade.

2) Acompanhamento da instalação hidráulico-mecânica das unidades.

→ Linha de Derivação

- Assentamento da tubulação (FºFº - Ø 450 mm) da EE Recirculação ao PVD 07 (L= 7,60 m);
- Assentamento da tubulação (FºFº - Ø 450 mm) do PVD 07 ao PVD 04 (L= 39,00 m);

→ Linha de Efluente

- Assentamento da tubulação (FºFº - Ø 600 mm) do PVE 03 a Caixa de Fluxo 3 (L= 45,00 m);
- Assentamento das tubulações (FºFº - Ø 450 mm) da Caixa de Fluxo 3 para Decantadores 1 e 2 (L= 5,80m, para cada Decantador);
- Assentamento das tubulações (FºFº - Ø 450 mm) dos Decantadores 1 e 2 ao PVE 05 (L= 11,50 m, de cada Decantador);

- Assentamento da tubulação (FºFº - Ø 600 mm) da EE de Recirculação ao PVE 05 (L= 4,50 m);
- Assentamento da tubulação (FºFº - Ø 450 mm) da Caixa de Fluxo 1 ao Reator 1 (L= 11,80 m).


3) Dados Gerais

- Em média a obra contou com 75 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 13:00 às 17:00h, sendo:

- 52 ajudantes;
- 11 pedreiros;
- 4 armadores;
- 4 encarregados;
- 3 carpinteiros;
- 1 almoxarife.

- Não foram constatadas chuvas no período.

- No período não ocorreram acidentes de trabalho.

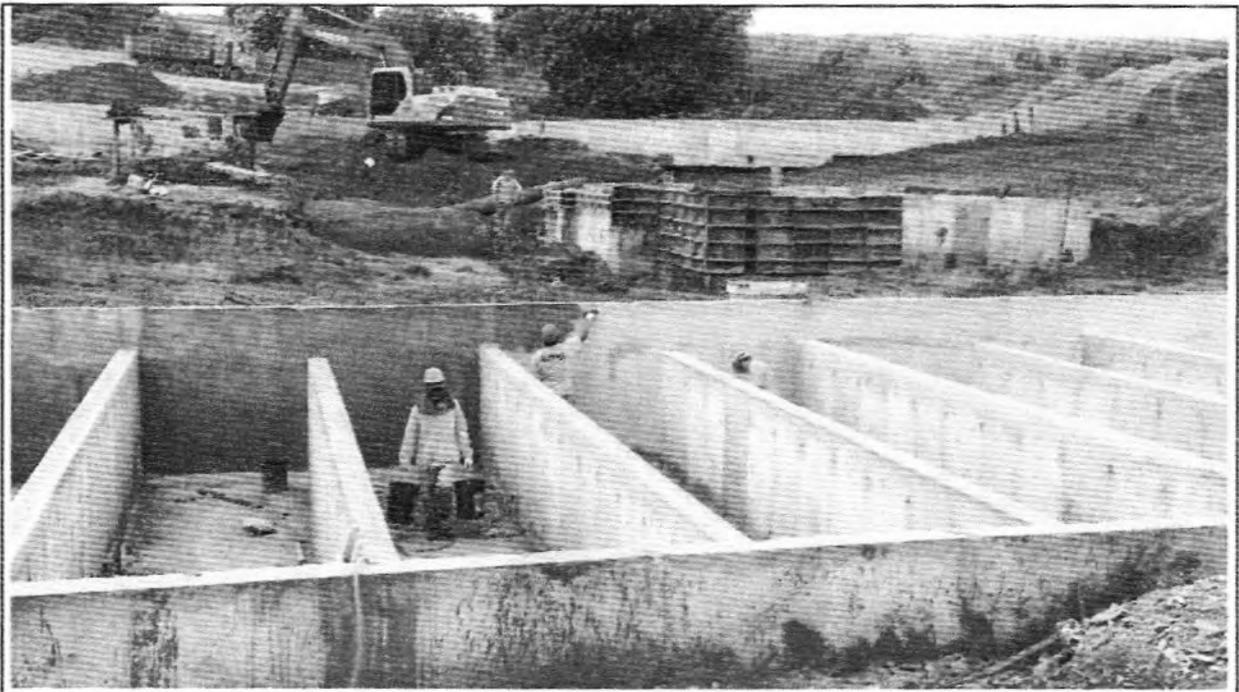

Descrição: Impermeabilização das paredes internas do Tanque de Contato.

Foto: 01

Data: 04/04/14

Arquivo: 134155



Descrição: Armadura e montagem de forma da laje da EE Recirculação.

Foto: 02

Data: 04/04/14

Arquivo: 134340




Descrição: Assentamento da tubulação (Fofu) dos Decantadores 1 e 2 ao PVE 05

Foto: 03

Data: 04/04/14

Arquivo: 134415

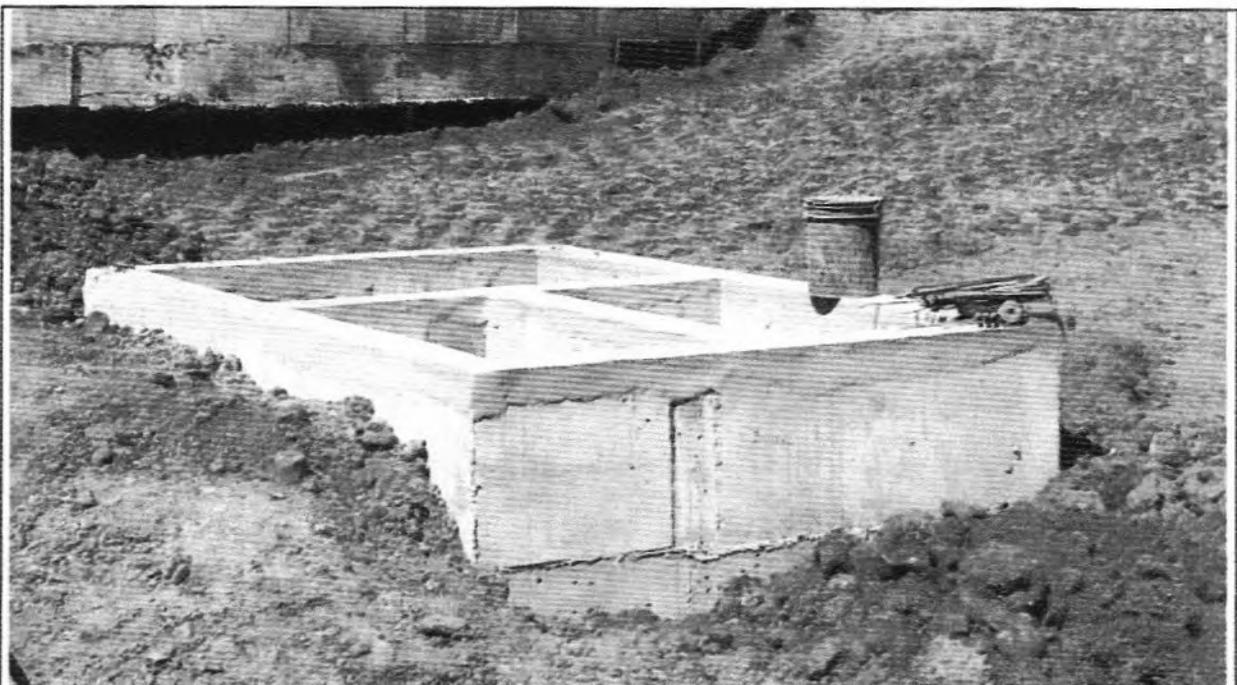


Descrição: Finalização da regularização das paredes da Caixa de Manobra 2.

Foto: 04

Data: 04/04/14

Arquivo: 134600

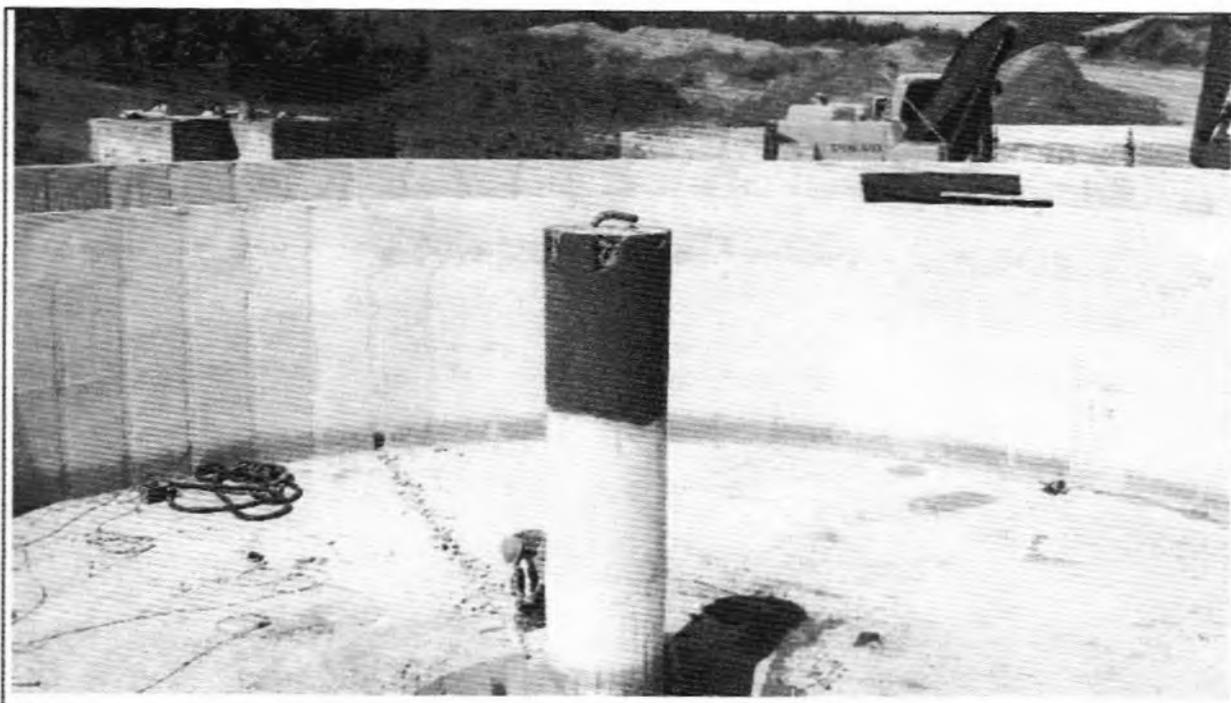

Descrição: Concretagem do último nível dos pilares centrais do Decantador 1

Foto: 05

Data: 04/04/14

Arquivo: 134733




Descrição: Cimbramento, armadura e montagem de forma das vigas superiores da Casa Desidratação de Lodo.

Foto: 06

Data: 04/04/14

Arquivo: 134825

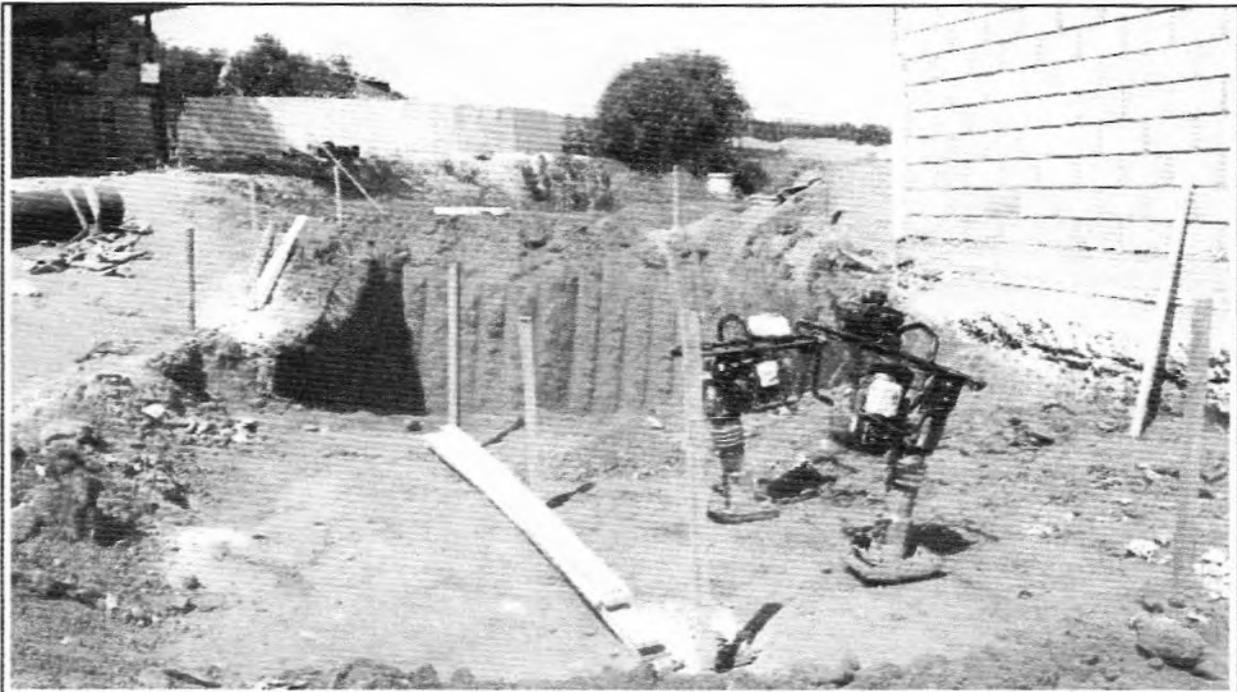

Descrição: Escavação e gabarito da EE de Lodo

Foto: 07

Data: 04/04/14

Arquivo: 135116



Descrição: PVE 03 ao PVE 04

Foto: 08

Data: 04/04/14

Arquivo: 135210




Descrição: Regularização da canaleta superior do Filtro 2.

Foto: 11

Data: 04/04/14

Arquivo: 135306

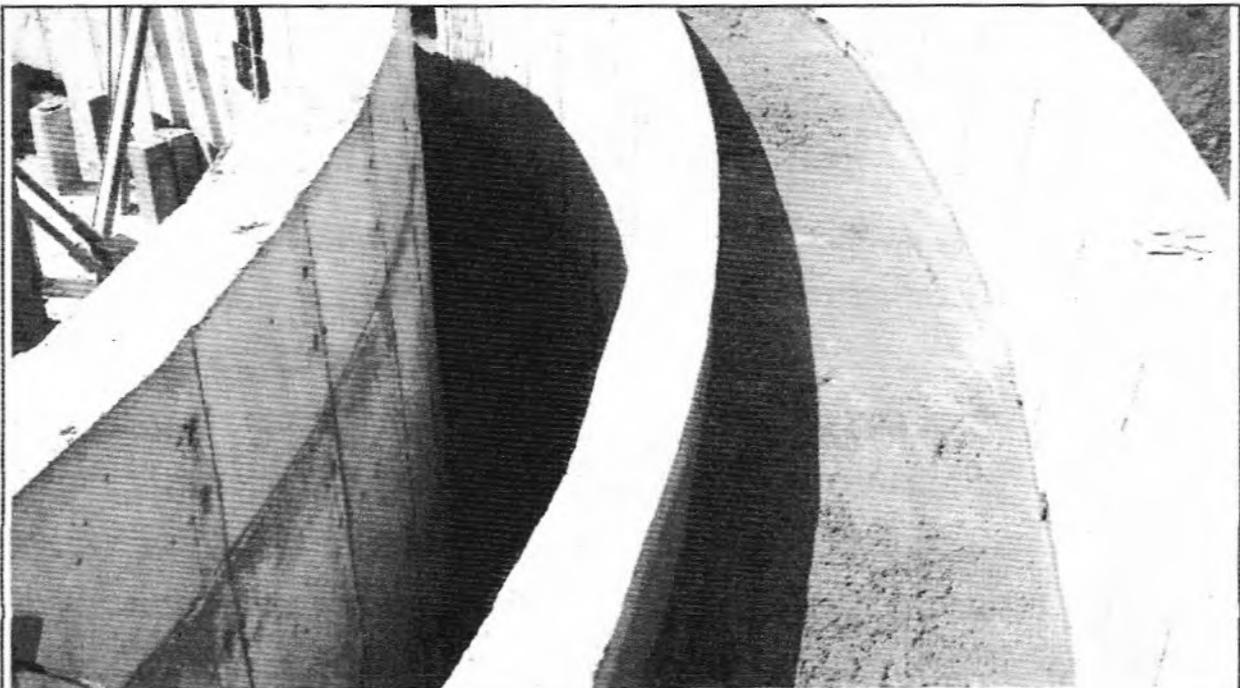


Descrição: Regularização da canaleta superior e inferior do Filtro 1.

Foto: 12

Data: 04/04/14

Arquivo: 135346

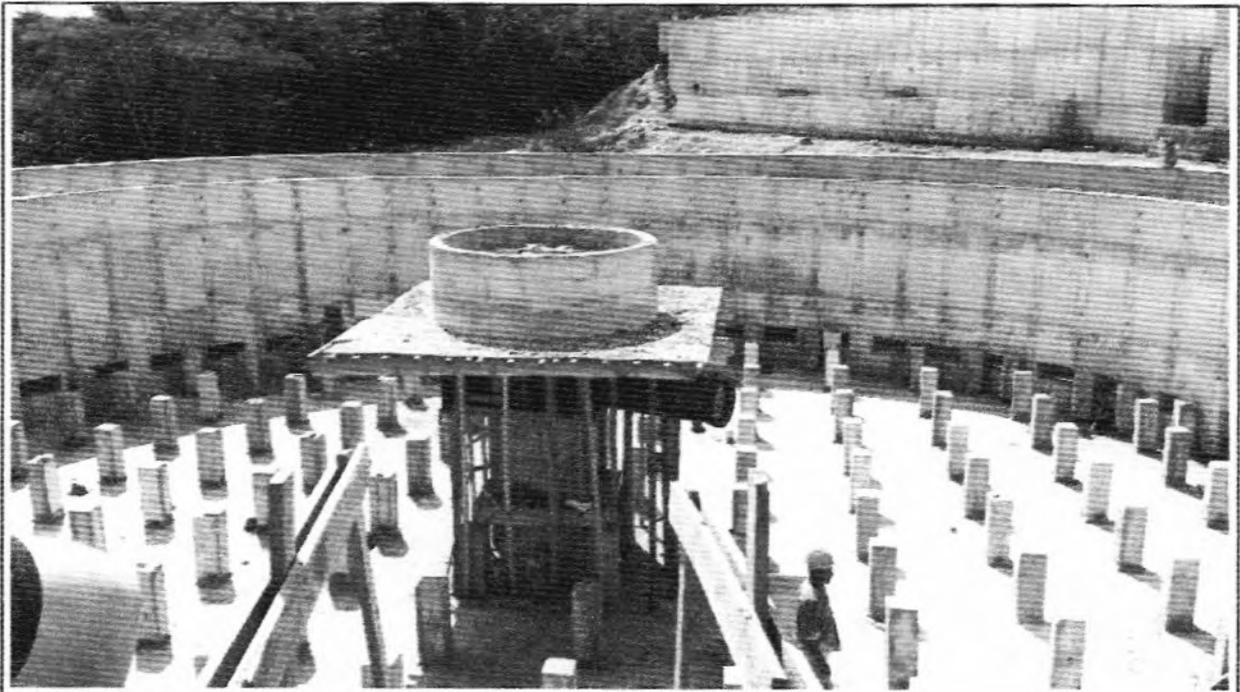

Descrição: Concretagem do último lance do pilar central do Filtro 1.

Foto: 13

Data: 04/04/14

Arquivo: 135411




Descrição: Assentamento da tubulação (FºFº) da Caixa de Fluxo 1 ao Reator 1.

Foto: 14

Data: 04/04/14

Arquivo: 135625

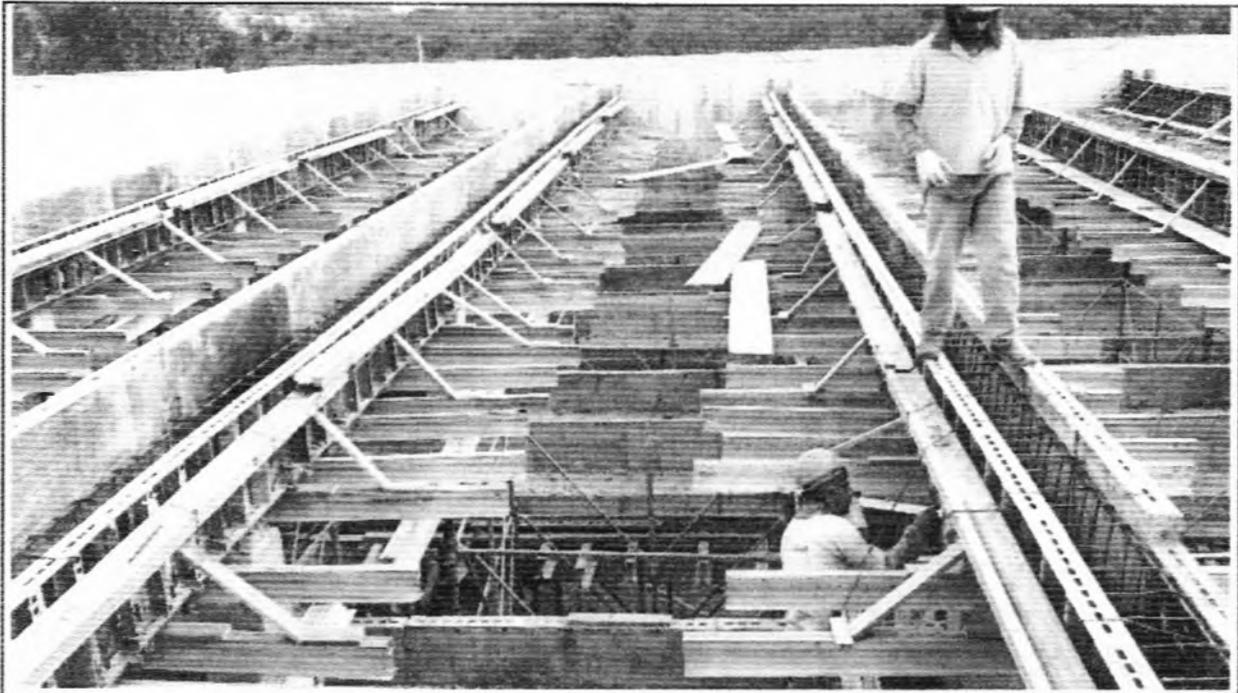

Descrição: Armadura e montagem de forma do terceiro lance de vigas Reator 1.

Foto: 15

Data: 04/04/14

Arquivo: 135851

DAF-024/14
São Paulo, 14 de Abril de 2.014.

Ao
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET
Rua Clíneu Braga de Magalhães, 911
CEP 15900-000 - Centro
Taquaritinga - SP

At.: Satoshi Yokoyama
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Medição dos serviços / Medição 03 - Apresentação e pedido de liberação para o pagamento / Envio de nota, guias recolhidas de encargos sociais e tributários

Prezados Senhores (as),


Vimos com o presente, apresentar a V.S.as e solicitar liberação para o pagamento, da Medição 03 dos serviços realizados no mês 03/2.014, correspondentes a R\$ 32.923,01 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e três reais e hum centavo), conforme desembolso previsto nos Cronogramas Físico e Financeiro do contrato em referência.

Aproveitamos a oportunidade, para encaminhar em anexo:

- Nota de Débito de Serviços Profissionais nº 216 para o pagamento dos serviços prestados;
- Cópias das guias de recolhimentos dos encargos sociais exigíveis - GRF FGTS competência 03/2.014 e GPS INSS competência 02/2.014;
- Cópia da guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente no mês 04/2.014, relativa ao 1º Trimestre (Janeiro, Fevereiro e Março) de 2.014, a qual reflete a totalidade do referido imposto devido por esta empresa, informando que somos prestadores de serviços inscritos na cidade de São Paulo, sob a forma de sociedades de profissionais, de acordo com Art. 15, da Lei Municipal 13.701/03 (Declaração Cadastral i002971/2014 em anexo) e, na forma definida em lei, conforme Portaria SF 014/2004, o ISS deve ser recolhido trimestralmente (próximo recolhimento: trimestre dos meses 04, 05 e 06/2.014, em 10/07/2.014). Maiores informações, poderão ser obtidas no sítio da PMSP e respectivo endereço: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/iss>.

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Engº Francisco José Justo
Sócio Gerente



 PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. Rua Cônego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 CEP 05414-011 - Pinheiros São Paulo - SP Fone (11) 3081.9559 / Fax (11) 3081.8052	NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS nº 216	
	CNPJ nº 73.667.271/0001-79 IM nº 2.214.104-9	
	Natureza da operação: Prestação de serviços	
	Prestação de serviços: Consultoria e projetos	
	Data da emissão: 14/04/2014	
Vencimento: contra apres.		

Isento da emissão de Nota Fiscal de acordo com Art. 15, § 3º, da Lei Municipal nº 13.701/03 de 24/12/2.003
Imposto Sobre Serviços de acordo com Art. 10, da Lei Municipal nº 13.701/03 de 24/12/2.003

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO		
Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET		
CNPJ: 45.374.865/0001-56	IE: -	IM: -
Endereço: Rua Clineu Braga de Magalhães, 911	CEP: 15900-000	
Município: Taquaritinga	Estado: SP	

Deve(m) a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda., estabelecida no endereço acima, a importância no valor de R\$ 32.923,01 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e três reais e hum centavo), pagável na praça de São Paulo.

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Contrato nº 045/2.013 - Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tramento - ETE, na cidade de Taquaritinga - SP. Medição 03 - Serviços prestados no mês 03/2.014 - Retenções RFB: IR (1,5%) = R\$ 493,84 / PIS (0,65%) = R\$ 214,00 / COFINS (3,0%) = R\$ 987,69 / CSLL (1,0%) = R\$ 329,23. <u>Dados para depósito:</u> Banco do Brasil (001) Agência nº: 6806-3 / Conta corrente nº: 608-4		32.923,01

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	Valor dos serviços (R\$)	32.923,01
	Total desta nota (R\$)	32.923,01

1ª Via: Destinatário
2ª Via: Emitente
3ª Via: Contábil



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Cobrança

Declaração Cadastral

Declaração nº : **i 002971/2014**
Nome/Razão Social : **PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE
SIMPLES LIMITADA**
C.C.M. : **2.214.104-9**

O contribuinte em epígrafe encontra-se enquadrado, para fins do disposto no art. 10 da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, na condição abaixo indicada:

Sociedade constituída na forma do parágrafo 1º do artigo 15º da Lei nº 13.701/03.

Emitida via Internet em : 15/04/2014

Observações:

Esta declaração possui validade de três meses a contar de sua data de expedição.

Esta declaração não possui validade como certidão negativa de tributos mobiliários. Certidões on line de tributos mobiliários devem ser requeridas no site "http://www3.prefeitura.sp.gov.br/certidao/ctm_menu.htm".

A autenticidade desta declaração poderá ser confirmada no site da Prefeitura de São Paulo (<http://www.prefeitura.sp.gov.br>).



10/4/2014

[bb.com.br]



Pagamentos com código de barras

10/04/2014 19:53:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.53.34
6806306806

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT
AGENCIA: 6806-3 CONTA: 608-4
EFETUADO POR: FRANCISCO J JUSTO

Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 81660000006-0 16050000552-7
01404100700-7 00023314278-5
Data do pagamento 10/04/2014
TRIBUTO I.S.S. - AUTO LANÇADO.
Valor Total 616,05

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB:
1. CFB. EAB. 659. F3A. BD5

Transação efetuada com sucesso por: J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO.



ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

A Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico alerta para o vencimento no dia **10/04/2014** do Imposto Sobre Serviços - ISS devido pelas sociedades de profissionais, inscritas no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, referente ao 1º trimestre de 2014. Para orientá-lo, neste comunicado encontra-se o documento de arrecadação que pode ser pago em qualquer estabelecimento da rede bancária autorizada.

Para efeito de cálculo do imposto devido, é indicado no campo "UNIDADES TAXADAS" o número de profissionais (sócios, empregados ou não) habilitados ao exercício da mesma atividade e que prestam serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da legislação específica. Calcula-se o valor total a pagar por meio da multiplicação do valor unitário indicado no documento de arrecadação pela quantidade de unidades taxadas. Caso a quantidade de unidades taxadas esteja incorreta, é possível alterá-la e emitir a nova guia de pagamento no DUC.

Forma de pagamento: O pagamento poderá ser efetuado na rede bancária autorizada, nos terminais de autoatendimento (caixa eletrônico) ou, ainda, via *internet banking* utilizando exclusivamente o código de barras impresso no próprio documento.

Também é possível, mediante sua Senha Web ou certificado digital, acessar o **Demonstrativo Unificado do Contribuinte - DUC** no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/duc>. O DUC fornece:

- Informações sobre valores pagos relativos ao IPTU, ao ISS, à TFA, à TRSS e à TFE;
- Extrato atualizado dos débitos do contribuinte;
- Possibilidade de emissão de novo documento de arrecadação para pagamento **após o vencimento** ou **em faixa de recolhimento diversa do sugerido neste documento**.

Caso não possua acesso ao DUC, acessar <http://www.prefeitura.sp.gov.br> para emissão do novo documento de arrecadação. Sobre os pagamentos em atraso incidirão acréscimos legais, que serão calculados automaticamente no momento da emissão do documento.

Para informações adicionais, acessar o link: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sua>

Atendimento telefônico: 156

Atendimento presencial: Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, localizada no Vale do Anhangabaú, 5/226 (ao lado do Vladuto do Chá). Horário de atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsiderar este comunicado.

A falta de pagamento do tributo nos prazos regulamentares sujeita a inclusão do nome do contribuinte no Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL, nos termos da Lei nº 14.094, de 06/12/05.

0020856 20634 22141049 2 Emissão: 26/03/2014

ISS 2014 - SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS

CCM 2.214.104-9	CNPJ 73.667.271/0001-79	RAZÃO SOCIAL PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
ENDEREÇO R. CONEGO EUGENIO LEITE 623 CONJ 42		BAIRRO PINHEIROS	CEP 05414-011		
CÓDIGO DE SERVIÇO 01546	DESCRIÇÃO ENG, AGRONOMIA, ARQUIT., URBAN. E CONG.(REG. ESPEC.-SD.)				
TRIMESTRE PRIMEIRO	INCIDÊNCIA 03/2014	VENCIMENTO 10/04/2014	VALOR DO ISS POR PROFISSIONAL (R\$) 205,35	UNIDADES TAXADAS 3	VALOR A PAGAR (R\$) 616,05

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1123 55 07 000002331427 9 7 VIA CONTRIBUINTE
816600000060 160500005527 014041007007 000233142785



ISS 2014 - SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1º TRIMESTRE

DATA DE VALIDADE 10/04/2014
CÓDIGO DE SERVIÇO 01546
INCIDÊNCIA 03/2014
VALOR DO ISS POR PROFISSIONAL (R\$) 205,35

X

UNIDADES TAXADAS
3

=

Data de Vencimento

10/04/2014

CCM
2.214.104-9

Valor a Pagar (R\$)

616,05

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1123 55 07 000002331427 9 7 VIA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
816600000060 160500005527 014041007007 000233142785





GPS - Guia da Previdência Social

20/03/2014 14:08:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.55
6806306806 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT
AGENCIA: 6806-3 CONTA: 608-4

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 02/2014
IDENTIFICADOR 73667271000179
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014
VALOR DO INSS 1.780,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES 329,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.110,00

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: F.AC7.936.1B3.F13.F42

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.55
6806306806 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 02/2014
IDENTIFICADOR 73667271000179
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014
VALOR DO INSS 1.780,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES 329,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.110,00

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: F.AC7.936.1B3.F13.F42

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10/4/2014

[bb.com.br]



10/04/2014 19:56:49



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.56.50
6806306806 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT
AGENCIA: 6806-3 CONTA: 608-4

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 8580000004-6 55890179140-0
40756705087-7 36672710001-9
Data do pagamento 07/04/2014
CNPJ/CEI 73667271/0001-79
COMPETENCIA 03/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2014
VALOR DEPOSITO 455,89
Valor Total 455,89
=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: E.45E.624.B3E.BD4.0F4

Transação efetuada com sucesso por: J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO.



FUNDO DE CAIXA DE RESERVA DE SERVIÇOS

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/03/2014 - 15:06:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA				02-DDD/TELEFONE (0011)30612549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.698,73	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.667.271/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 455,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 455,89
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014

858000000046 558901791400 407567050877 366727100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE CAIXA DE RESERVA DE SERVIÇOS

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/03/2014 - 15:06:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA				02-DDD/TELEFONE (0011)30612549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.698,73	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.667.271/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 455,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 455,89
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014

858000000046 558901791400 407567050877 366727100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PERTECNICA CONS E PROJ SC LTDA - 017366727100017900,

Seu arquivo jyayfiraes00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/03/2014 às 16:38.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FCDDF7F8.6CEF4202.83309468.84711BA0.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: JyaYFliraES00004
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 03/2014

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



DTE-023/14

São Paulo, 14 de Abril de 2.014.

Ao

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET

Rua Clineu Braga de Magalhães, 911

CEP 15900-000 - Centro

Taquaritinga - SP

At.: Satoshi Yokoyama
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro / Apresentação
Mês 03/2.014 (R0)

Prezados Senhores (as),

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de mensal do acompanhamento físico e financeiro das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir:

- Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro – Mês 03/2.014, Revisão 0 (NRef.: GE-174-RE-AM-003-R0).

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,


Engº Francisco José Justo
Sócio Gerente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE TAQUARITINGA



Para: Superintendência


**Ref: Protocolo — PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda -
Tomada de Preço nº001/2013 – Contrato nº045/2013 – 3º Relatório mensal
dos serviços executados e nota fiscal**

**Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos
especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de
Saneamento / Esgotos/ Estação de Tratamento – ETE**

Após apreciação dos documentos e relatórios protocolados nesta
Autarquia pela empresa PERTÉCNICA, nada temos a opor quanto ao
apresentado , bem como ao pagamento da nota de débito de serviços
profissionais nº216.

Taquaritinga, 16 de abril de 2.014


Luiz Carlos Antonio José
Chefe Divisão de Operações


Juliana Tinti Bizarri Mucio
Chefe Seção de rede água esgoto
