



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE TAQUARITINGA**

PROCESSO Nº. _____

T.P. nº 01/2013

Regido pela Lei nº 8.666/1993.
MENOR PREÇO GLOBAL

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços técnicos especializados no Gerenciamento de Obras de Saneamento/Esgotos/Estação de Tratamento - ETE, incluindo todas as despesas com recursos humanos e materiais (inclusive veículos e insumos para transporte de pessoas), despesas diretas e indiretas (inclusive escritório para administração local e insumos), impostos e lucros.

Local: Rua Clineu Braga de Magalhães, nº 911 - Centro
Taquaritinga/SP

8º Vol.



DTE-059/14

São Paulo, 15 de Agosto de 2.014.

Ao

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET

Rua Clineu Braga de Magalhães, 911

CEP 15900-000 - Centro

Taquaritinga - SP

At.: Satoshi Yokoyama
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro / Apresentação
Mês 07/2.014 (R0)


Prezados Senhores (as),

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de mensal do acompanhamento físico e financeiro das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir:

- Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro – Mês 07/2.014, Revisão 0 (N/Ref.: GE-174-RE-AM-007-R0).

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,


Eng.º Francisco José Justo
Sócio-Gerente

DAF-060/14

São Paulo, 15 de Agosto de 2.014.

Ao

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET

Rua Clineu Braga de Magalhães, 911

CEP 15900-000 - Centro

Taquaritinga - SP

At.: Satoshi Yokoyama
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Medição dos serviços / Medição 07 - Apresentação e pedido de liberação para o pagamento / Envio de nota, guias recolhidas de encargos sociais e tributários

Prezados Senhores (as),


Vimos com o presente, apresentar a V.S.as e solicitar liberação para o pagamento, da Medição 03 dos serviços realizados no mês 07/2.014, correspondentes a R\$ 36.084,56 (trinta e seis mil, oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme desembolso previsto nos Cronogramas Físico e Financeiro do contrato em referência.

Aproveitamos a oportunidade, para encaminhar em anexo:

- Nota de Débito de Serviços Profissionais nº 228 para o pagamento dos serviços prestados;
- Cópias das guias de recolhimentos dos encargos sociais exigíveis - GRF FGTS competência 07/2.014 e GPS INSS competência 06/2.014;
- Cópia da guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente no mês 07/2.014, relativa ao 2º Trimestre (Abril, Maio e Junho) de 2.014, a qual reflete a totalidade do referido imposto devido por esta empresa, informando que somos prestadores de serviços inscritos na cidade de São Paulo, sob a forma de sociedades de profissionais, de acordo com Art. 15, da Lei Municipal 13.701/03 (Declaração Cadastral i002971/2014 em anexo) e, na forma definida em lei, conforme Portaria SF 014/2004, o ISS deve ser recolhido trimestralmente (próximo recolhimento: trimestre dos meses 07, 08 e 09/2.014, em 10/10/2.014). Maiores informações, poderão ser obtidas no sítio da PMSP e respectivo endereço: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/iss>.

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Engº Francisco José Justo
Sócio Gerente



GPS - Guia da Previdência Social

18/07/2014 18:23:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.53
6806306806 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT
AGENCIA: 6806-3 CONTA: 608-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	73667271000179
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	1.785,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	330,53
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.116,28

=====

DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: A.EC2.135.430.1D9.B49

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.53
6806306806 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	73667271000179
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	1.785,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	330,53
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.116,28

=====

DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: A.EC2.135.430.1D9.B49

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Cobrança

Declaração Cadastral

Declaração nº : i 002971/2014
Nome/Razão Social : PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE
SIMPLES LIMITADA
C.C.M. : 2.214.104-9

O contribuinte em epígrafe encontra-se enquadrado, para fins do disposto no art. 10 da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, na condição abaixo indicada:

Sociedade constituída na forma do parágrafo 1º do artigo 15º da Lei nº 13.701/03.

Emitida via Internet em : 15/04/2014

Observações:

Esta declaração possui validade de três meses a contar de sua data de expedição.

Esta declaração não possui validade como certidão negativa de tributos mobiliários. Certidões on line de tributos mobiliários devem ser requeridas no site "http://www3.prefeitura.sp.gov.br/certidao/ctm_menu.htm".

A autenticidade desta declaração poderá ser confirmada no site da Prefeitura de São Paulo (<http://www.prefeitura.sp.gov.br>).



10/07/2014 20:16:45



Pagamentos com código de barras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.16.45
6806306806

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT
AGENCIA: 6806-3 CONTA: 608-4
EFETUADO POR: FRANCISCO J JUSTO

Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 81630000006-3 16050000552-7
01407100700-0 00023543072-5

Data do pagamento 10/07/2014

TRIBUTO I.S.S. - AUTO LANÇADO.

Valor Total 616,05

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB:
D.283.BD8.06F.024.DAD

Transação efetuada com sucesso por: J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PERTECNICA CONS E PROJ SC LTDA - 017366727100017900,

Seu arquivo oxriobwcibj00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/07/2014 às 23:15.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 50397B8B.E20E4E02.822056B9.1DBF726C.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: OXRiObWCibJ00002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência: 07/2014

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 26/07/2014
HORA: 23:15:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA
COMPETÊNCIA: 07/2014

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 73.667.271/0001-79
SIMPLES: 1

FPAS: 507

FGTS - 8*

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

7.941,34

DEPÓSITO

635,30

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

635,30

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.





Emissão de comprovantes

11/08/2014 18:29:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.29.12
6806306806 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT
AGENCIA: 6806-3 CONTA: 608-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85840000006-0 35300179140-0
80757105087-3 36672710001-9
Data do pagamento 07/08/2014
CNPJ/CEI 73667271/0001-79
COMPETENCIA 07/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2014
VALOR DEPOSITO 635,30
Valor Total 635,30

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: E.EF0.329.C98.D22.405

Transação efetuada com sucesso por: J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO.



ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

A Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico alerta para o vencimento no dia **10/07/2014** do Imposto Sobre Serviços - ISS devido pelas sociedades de profissionais inscritas no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, referente ao 2º trimestre de 2014. Para orientá-lo, neste comunicado encontra-se o documento de arrecadação que pode ser pago em qualquer estabelecimento da rede bancária autorizada.

Para efeito de cálculo do imposto devido, é indicado no campo "UNIDADES TAXADAS" o número de profissionais (sócios, empregados ou não) habilitados ao exercício da mesma atividade e que prestam serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da legislação específica. Calcule-se o valor total a pagar por meio da multiplicação do valor unitário indicado no documento de arrecadação pela quantidade de unidades taxadas. Caso a quantidade de unidades taxadas esteja incorreta, é possível alterá-la e emitir a nova guia de pagamento no DUC.

Forma de pagamento: O pagamento poderá ser efetuado na rede bancária autorizada, nos terminais de autoatendimento (caixa eletrônico) ou, ainda, via internet banking **utilizando exclusivamente o código de barras impresso no próprio documento.**

Também é possível, mediante sua Senha Web ou certificado digital, acessar o **Demonstrativo Unificado do Contribuinte - DUC** no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/duc>. O DUC fornece:

- Informações sobre valores pagos relativos ao IPTU, ao ISS, à TFA, à TRSS e à TFE;
- Extrato atualizado dos débitos do contribuinte;
- Possibilidade de emissão de novo documento de arrecadação para pagamento **após o vencimento ou em faixa de recolhimento diversa do sugerido neste documento.**

Caso não possua acesso ao DUC, acessar <http://www.prefeitura.sp.gov.br> para emissão do novo documento de arrecadação. Sobre os pagamentos em atraso incidirão acréscimos legais, que serão calculados automaticamente no momento da emissão do documento.

Para informações adicionais, acessar o link: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sup>

Atendimento telefônico: 156

Atendimento presencial: Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, localizada no Vale do Anhangabau, 206/226 (ao lado do Vladuto do Chá). Horário de atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsiderar este comunicado.

A falta de pagamento do tributo nos prazos regulamentares sujeita a inclusão do nome do contribuinte no Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL, nos termos da Lei nº 14.094, de 06/12/05.

0020762

20645 22141049 2

Emissão: 06/06/2014

ISS 2014 - SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS

CCM 2.214.104-9	CNPJ 73.667.271/0001-79	RAZÃO SOCIAL PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
ENDEREÇO R. CONEGO EUGENIO LEITE 623 CONJ 42		BAIRRO PINHEIROS	CEP 05414-011		
CÓDIGO DE SERVIÇO 01546	DESCRIÇÃO ENG, AGRONOMIA, ARQUIT., URBAN. E CONG.(REG. ESPEC.-SD.)				
TRIMESTRE SEGUNDO	INCIDÊNCIA 06/2014	VENCIMENTO 10/07/2014	VALOR DO ISS POR PROFISSIONAL (R\$) 205,35	UNIDADES TAXADAS 3	VALOR A PAGAR (R\$) 616,05

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1123 55 07 000002354307 3 0

VIA CONTRIBUINTE

816300000063 160500005527 014071007000 000235430725



PREFEITURA DE SÃO PAULO

FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ISS 2014 - SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

2º TRIMESTRE

DATA DE VALIDADE
10/07/2014

CÓDIGO DE SERVIÇO
01546

INCIDÊNCIA
06/2014

VALOR DO ISS POR PROFISSIONAL (R\$)
205,35

X

UNIDADES TAXADAS
3

=

Data de Vencimento

10/07/2014

CCM

2.214.104-9

Valor a Pagar (R\$)

616,05

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1123 55 07 000002354307 3 0

VIA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

816300000063 160500005527 014071007000 000235430725



**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO EMPREGADO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2014 - 23:15:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA				02-DDD/TELEFONE (0011)30612549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.941,34	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.667.271/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 635,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 635,30
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858400000060 353001791400 807571050873 366727100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO EMPREGADO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2014 - 23:15:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA				02-DDD/TELEFONE (0011)30612549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.941,34	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.667.271/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 635,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 635,30
--	---------------------	-------------------------------


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858400000060 353001791400 807571050873 366727100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. Rua Cônego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 CEP 05414-011 - Pinheiros São Paulo - SP Fone (11) 3081.9559 / Fax (11) 3081.8052	NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS nº 228	
	CNPJ nº 73.667.271/0001-79	IM nº 2.214.104-9
	Natureza da operação: Prestação de serviços	
	Prestação de serviços: Consultoria e projetos	
	Data da emissão: 15/08/2014	
Vencimento: conf. contr.		

Isento da emissão de Nota Fiscal de acordo com Art. 15, § 3º, da Lei Municipal nº 13.701/03 de 24/12/2.003
Imposto Sobre Serviços de acordo com Art. 10, da Lei Municipal nº 13.701/03 de 24/12/2.003

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO		
Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET		
CNPJ: 45.374.865/0001-56	IE: -	IM: -
Endereço: Rua Clineu Braga de Magalhães, 911	CEP: 15900-000	
Município: Taquaritinga	Estado: SP	

Deve(m) a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda., estabelecida no endereço acima, a importância no valor de R\$ 36.084,56 (trinta e seis mil, oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), pagável na praça de São Paulo.

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Contrato nº 045/2.013 - Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tramento - ETE, na cidade de Taquaritinga - SP. Medição 07 - Serviços prestados no mês 07/2.014 - Retenções RFB: IR (1,5%) = R\$ 486,05 / PIS (0,65%) = R\$ 210,62 / COFINS (3,0%) = R\$ 972,09 / CSLL (1,0%) = R\$ 324,03 <u>Dados para depósito:</u> Banco do Brasil (001) Agência nº: 6806-3 / Conta corrente nº: 608-4		36.084,56

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	Valor dos serviços (R\$)	36.084,56
	Total desta nota (R\$)	36.084,56

1ª Via: Destinatário [X]
2ª Via: Emitente []
3ª Via: Contábil []



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

**CONTRATO Nº 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS /
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE**

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – PERÍODO 01 A 31/07/2.014

**N/REF.: GE-174-RE-MA-007-R0
TAQUARITINGA -SP
JULHO/2014**



PERTÉCNICA

APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir o "Relatório Mensal das Atividades – Período 03 a 31/07/2014" desenvolvidas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/2014, para o Contrato nº 045/2013, firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda.

ÍNDICE

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

2 - OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS

3 - AS OBRAS CONTRATADAS

4 - ATIVIDADES NO PERÍODO 01 A 31/07/2014

5 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO

6 - ANEXOS

7 - DESENHOS



1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

- **Agente Promotor:** Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE

- **Agente Financeiro e Técnico:** Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE

- **Objeto:** Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede)

- **Recursos:**

- . Fonte: Programa Água Limpa;
- . Convênio nº 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011;
- . Valor: R\$ 14.491.618,13 – Exercício 2011;
- . Prazo: 24 meses

- **Agente Executor:** Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP

- **Contrato das obras e serviços:**

- . Processo licitatório: Concorrência nº 011/12;
- . Contrato nº 194/12, de 11/12/2.012;
- . Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.;
- . Valor: R\$ 11.431.936,13;
- . Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço;
- . Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 18/06/2.014;
- . Aditivo contratual de valor (Termo Aditivo 001/2013): R\$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013;
- . Valor contratual aditivado: R\$ 14.249.469,14;
- . Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 001/201): em 11/06/2.014, prorrogado em 90 (noventa) dias a contar de 18/06/2.014.

2 - OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS

2 – OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS

O escopo dos trabalhos é a prestação de serviços de Gerenciamento das Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga através da Concorrência nº 011/2012, que resultou no Contrato nº 194/12, firmado com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda..

Os serviços do Gerenciamento deverão fornecer suporte técnico e operacional ao Serviço Municipal de Água e Esgoto de Taquaritinga – SAAET, na gestão da implantação do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários, de modo a assegurar que os projetos e obras sejam executados de acordo com o cronograma físico-financeiro contratados pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga, com a qualidade necessária definida nos projetos, memoriais descritivos e pelas normas brasileiras, gerenciando de maneira confiável e eficaz as seguintes frentes de trabalho:

- Fiscalização e acompanhamento das obras e adequações realizadas pelas empreiteiras para atendimento a alterações definidas por órgãos públicos ou equivalentes, tais como concessionárias de serviços públicos, dentre outros;
- Elaboração de elementos técnicos para processos de contratação de projetos, obras e serviços;
- Acompanhamento da elaboração e compatibilização de projetos complementares;
- Acompanhamento dos cronogramas das obras das edificações;
- Acompanhamento dos cronogramas das obras de infraestrutura e compatibilização dos mesmos com o cronograma geral do empreendimento;
- Acompanhamento da execução de serviços relativos à infraestrutura, envolvendo serviços preliminares, terraplenagem, micro e macro drenagem, contenções, redes de abastecimento de água, redes coletoras de esgoto, redes de energia elétrica, pavimentação, obras de arte em concreto, urbanização e paisagismo que se aplicarem a implantação em foco;
- Registro e organização do arquivo "as-built" como referência essencial para realização de manutenções e eventuais reparos após a implantação do empreendimento;
- Realização de consultoria técnica especializada para solução de problemas específicos relacionados ao projeto, à construção ou ao licenciamento/regularização das obras;
- Realização de atividades de Pré-Operação (Comissionamento):
- Todos os demais serviços que venham a ser identificados como necessários para a viabilização do empreendimento e para atendimento das funcionalidades desejadas e estabelecidas pelo SAAET.

3 - AS OBRAS CONTRATADAS

3 - AS OBRAS CONTRATADAS

As obras foram licitadas e contratadas pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda., de acordo o Projeto Básico das Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga, elaborado pela empresa Engecorps – Corpo de Engenheiros Consultores Ltda., em Dezembro/2.009, contratada pelo Departamento de Águas Energia Elétrica – DAEE, para a execução de Projetos de Sistemas de Esgoto Sanitário, dentro do Projeto Água Limpa, Lote 1.

Ao longo da execução das obras, o Projeto Básico Engecorps - 12/2.009 foi revisado pela KMG, em função, entre outras justificativas, para atender as demandas projetadas para a população urbana de Taquaritinga, evoluídas a partir dos dados populacionais atualizados disponibilizados pelo Censo IBGE/2.010. A KMG subcontratou a readequação dos projetos com a empresa Sistemas Ambientais Engenharia, Consultoria e Saneamento Ltda.

O desenho Implantação - Fl. 1/1 (fornecido pela KMG) apresentado no Capítulo 7 à frente, ilustra o projeto revisado mostrando as alterações feitas.

O quadro 1 a seguir discrimina as Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas e contratadas com KMG, bem como, valores aditados ao contrato em função da revisão do Projeto Básico.

- Quadro 1 - Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS (R\$)	
		ORIGINAL	COM ADITIVO
1	EMISSÁRIO BRUTO EMB01	32.367,61	24.883,38
2	EEE FINAL	732.407,51	870.040,40
3	LINHA DE RECALQUE	138.249,42	101.659,03
4	MOVIMENTO DE TERRA ETE	329.817,66	329.817,66
5	GUARITA	38.884,13	39.272,44
6	ADMINISTRAÇÃO	167.384,94	160.426,38
7	GRADEAMENTO E DESARENAÇÃO	586.074,91	557.236,70
8	REATORES ANAERÓBICOS 1 E 2	1.842.451,97	3.164.878,20
9	FILTROS BIOLÓGICOS 1 E 2	1.738.586,37	2.527.587,55
10	DECANTADORES SECUNDÁRIOS 1 E 2	1.066.535,54	1.704.851,46
11	EE DE RECIRCULAÇÃO	485.284,77	612.831,78
12	CÂMARA DE CONTATO	382.806,39	382.806,39
13	CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO	306.118,28	303.715,24
14	EE DE LODO ADENSADO	70.946,26	74.582,26
15	ADENSADOR DE LODO	154.552,19	0,00
16	TANQUES DE HIPOCLORITO	151.058,56	151.058,56
17	EFLUENTE FINAL	415.844,16	184.121,55
18	INTERLIGAÇÕES DO SISTEMA	582.679,84	737.470,25
19	SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	44.414,70	47.836,89
20	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	257.978,71	207.325,28
21	CAIXAS DE FLUXO 1, 2 E 3	393.197,26	417.382,13
22	URBANIZAÇÃO DA ETE	834.620,53	723.344,73
23	SERVIÇO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	574.674,42	574.674,42
24	SUPERVISÃO E CONTROLE	105.000,00	105.000,00
25	PROJETO	0,00	60.000,00
26	SISTEMA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA	0,00	186.666,46
	VALOR TOTAL	11.431.936,13	14.249.469,14

4 – ATIVIDADES NO PERÍODO 01 A 31/07/2014

4 – ATIVIDADES NO PERÍODO 01 A 31/07/2014

4.1 - Equipe Técnica

O quadro a seguir, indica a relação nominal e qualificação dos profissionais de nível superior componentes da equipe técnica alocada para o desenvolvimento das atividades da Gerenciadora no período de 01 a 31/07/14:

NOME	FORMAÇÃO	CATEGORIA PROFISSIONAL	EXPERIÊNCIA (ANOS)	QUALIFICAÇÃO
Francisco José Justo	Eng ^a Sanitária	Eng ^o Senior	30	Responsabilidade técnica do contrato e do gerenciamento das obras
Francisco M. Raposo	Eng ^a Civil	Eng ^o Senior	36	Coordenação do gerenciamento de obras
Maurício Lopes Brandão	Eng ^a Civil	Eng ^o Senior	21	Consultoria e gerenciamento de obras de Saneamento Ambiental
Guilherme Georgetti Fernandes	Eng ^a Ambiental	Eng ^o Júnior	03	Gerenciamento de obras de Saneamento Ambiental

4.2 - Atividades desenvolvidas pela Gerenciadora no período de 01 a 31/07/2014:

4.2.1 – Reuniões de trabalho com o SAAET

O SAAET informou que em 28/07/14 a empreiteira KMG protocolou junto a P.M.Taquaritinga (Protocolo nº 0000006002/2014) o ofício nº C.KMG-90/2014, datado de 25/07/2014, informando a paralisação imediata dos serviços, por não receber resposta ao ofício nº C.KMG-88/2014, datado de 04/06/2014 e por não recebimento dos valores de reajustes do contrato. Cópia do ofício nº C.KMG-90/2014 está apresentada no Anexo I, do Capítulo 6 à frente I

4.2.2 - Acompanhamento da construção civil das unidades

UNIDADE	FUNDAÇÕES	ESTRUTURAS	FECHAMENTOS	INST. HIDR.	INST. ELETR.	VEDAÇÕES	ESQUADRIAS	REVEST. / PINT.	OBSERVAÇÕES
EE Final	✓	✓	✓	-	-	x	-	-	- Falta instalação de Guarda Corpo e Grades.
Desarenador	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	- Falta instalação do Guarda Corpo e chubamento da Calha Parshall.
Reatores UASB	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	- Falta instalação do Guarda Corpo e Lonas
Caixas de Fluxos	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	- Instalação do Guarda Corpo e Escada de Acessos nas Unidades 1, 2 e 3.
Filtros	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	- Falta instalação do Guarda Corpo e Passarela de Acesso; - Falta completar enchimento do Filtro 2.
Decantadores	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	- Falta instalação de Guarda Corpo.
Caixa de Manobra	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	

EE Recirculação	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
Tanque de Contato	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	Falta chumbamento da Calha Parshall.
EE Lodo	✓	✓	✓	-	-	✓	-		
Casa Desidratação de Lodo	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	x	
Guarita	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	- Falta pintura externa.
Administração	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	- Falta pintura externa.
Casas de Painéis	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	- Falta pintura externas das unidades 1, 2 e 3; - Falta instalação da porta de entrada da unidade 2.
Reservatório Elevado	✓	✓	-	-	-	-	-	x	- Falta instalação de Para-raios.
Legenda: ✓ Executado; x Não executado; - Não previsto na unidade.									

4.2.2 - Acompanhamento da execução hidráulico-mecânica das unidades e montagem hidráulico-mecânica dos equipamentos das unidades

UNIDADE	TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÕES				CMB's / EQUIPS HIDRÁULICO-MECÂNICOS	OBSERVAÇÃO
	EFLUENTE	DERIVAÇÃO	LODO	RECIRCULAÇÕES DE EFLUENTE E LODO		
EE Final	✓	-	-	-	✓	Faltam instalações do Tubo de Descarga, da Válvula Flap, da Comportas e Pedestais de Manobras, do Gradeamento e da Talha.
Desarenador	✓	-	-	-	✓	
Caixas de Fluxo	✓	✓	-	✓	-	- Faltam instalações das Comportas e dos Pedestais de Manobras
Reatores UASB	✓	-	✓	-	-	- Faltam instalações dos queimadores de gases
Filtros	✓	-	-	-	-	
Decantadores	✓	-	✓	-	✓	
Caixa de Manobra	✓	-	✓	-	x	- Falta instalar Válvula Guihotina de acionamento elétrico e mecânico.

EE Recirculação	✓	✓	✓	✓ (1)	x	- Falta instalação da Talha; - Falta concluir montagem do Barrilete; (1) Falta trecho da tubulação de Recirculação de Lodo até Caixa de Fluxo 1.a
Tanque de Contato	✓	-	-	-	x	- Falta instalação da Bomba de Utilidades.
Tanque de Hipoclorito	✓	-	-	-	x	- Falta instalação da Bomba Dosadora.
Emissário Final	x	-	-	-	-	- Não concluído
EE Lodo	✓	-	x	-	x	- Falta concluir montagem do Barrilete; - Faltam assentamento da tubulação para a Centrífuga e instalação Talha
Casa Desidratação de Lodo	-	-	x	-	✓	- Faltam assentamento da tubulação da centrífuga e instalação Talha
Drenagem de Águas Pluviais	x	-	-	-	-	- Não concluído, faltam Bocas de Lobo para captações ao longo das ruas internas.
<p>Legenda: ✓ Executado; x Não executado; - Não previsto na unidade.</p>						

NOTAS:

1 – O Emissário de Esgoto Bruto – EMB01 (trecho compreendido entre o PV-Final do Interceptor Ribeirãozinho e a Caixa de Entrada da EE Final) não foi concluído;

4.2.3 - Acompanhamento da montagem elétrica dos equipamentos das unidades

UNIDADE	PAINÉIS DE COMANDO	CABLAGEM FORÇA E COMANDO	ILUMINAÇÃO	OBSERVAÇÃO
EE Final	✓	✓	-	
Desarenador	✓	✓	-	
Filtros	x	x	-	
Decantadores	✓	x	-	
EE Recirculação	x	x	-	
Tanque de Hipoclorito	x	x	-	
Tanque de Contato	x	x	-	
EE Lodo	x	x	-	

Casa Desidratação de Lodo	x	x	x	
Casas de Painéis	x	✓	✓	- Falta passar os cabos da Entrada de Energia para a Casa de Paineis 2; - Falta concluir a montagem da Casa de Paineis 3
Legenda: ✓ Executado; x Não executado; - Não previsto na unidade.				

4.2.4 - Acompanhamento da urbanização da área

LOCAL	FECHAMENTO	GUIAS / SARJETAS	CALÇADAS	PAVIMENTOS	PAISAGISMO - GRAMA	OBSERVAÇÃO
Geral	✓	-	-	-	x	-Falta concluir o plantio de grama.
Rua Principal	-	✓	x	x	✓	- Falta concluir as calçadas.
Rua EE Final	-	✓	✓	x	✓	
Rua Desarenador	-	✓	✓	x	✓	
Rua Reatores	-	✓	x	x	✓	- Falta plantio de grama ao lado do Reator 2
Rua Filtros	-	✓	x	x	✓	-Falta concluir plantio de grama ao lado do Filtro 2.
Rua Tanque de Contato	-	✓	-	x	✓	
Legenda: ✓ Executado; x Não executado; - Não previsto na unidade.						

NOTAS:

1 – Os taludes da Rua dos Filtros deverão ser refeitos antes do plantio de grama;

4.2.5 - Dados gerais

- No período foi constatada drástica redução do número de operários trabalhando na obra, constando:

- 04 ajudantes;
- 02 pedreiros;
- 02 encarregados;
- 02 eletricitas.
- 01 almoxarife.

- Os operários cumpriam jornada de trabalho em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 13:00 às 17:00h.

- Os operários estavam com EPI's.

- No período não foram relatados casos de acidentes de trabalho.

4.2.6 – Acompanhamento Físico-Financeiro das Obras e Serviços

Não foi realizada medição das obras e serviços no período entre 01 e 31/07/2.014.

A planilha à frente, indica a posição física e financeira acumulada das Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), até a Medição nº 19, realizada no período imediatamente anterior (01 a 30/06/2.014).



PREÇOS (R\$)					
ACUMUL. ANTERIOR	REALIZ. NO PERÍODO	TOTAL	REALIZ. ANTERIOR (%)	REALIZ. NO PERÍODO (%)	REALIZ. TOTAL (%)
21,90	19.000,00	19.021,90	0,09%	76,36%	76,44%
656.558,69	174.692,50	831.251,19	75,46%	20,08%	95,54%
103.381,67	0,00	103.381,67	101,69%	0,00%	101,69%
315.042,92	14.775,00	329.817,92	95,52%	4,48%	100,00%
36.604,52	0,00	36.604,52	93,21%	0,00%	93,21%
153.816,45	0,00	153.816,45	95,88%	0,00%	95,88%
392.930,77	123.529,68	516.460,45	70,51%	22,17%	92,68%
2.893.786,67	91.973,86	2.985.760,53	91,43%	2,91%	94,34%
2.357.592,08	119.964,76	2.477.556,84	93,27%	4,75%	98,02%
1.615.824,97	73.844,56	1.689.669,53	94,78%	4,33%	99,11%
475.083,49	4.384,80	479.468,29	77,52%	0,72%	78,24%
354.067,10	25.825,05	379.892,15	92,49%	6,75%	99,24%
154.230,31	55.616,49	209.846,80	50,78%	18,31%	69,09%
52.659,19	0,00	52.659,19	70,61%	0,00%	70,61%
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
113.724,67	34.173,05	147.897,72	75,29%	22,62%	97,91%
1.496,93	181.144,62	182.641,55	0,81%	96,38%	99,20%
361.269,21	373.173,06	734.442,27	48,99%	50,60%	99,59%
36.219,68	4.551,66	40.771,34	75,71%	9,51%	85,23%
157.629,14	46.781,91	204.411,05	76,03%	22,56%	98,59%
351.627,95	22.245,26	373.873,21	84,25%	5,33%	89,58%
533.179,96	12.817,00	545.996,96	73,71%	1,77%	75,48%
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%	0,00%	100,00%
181.252,20	2.500,00	183.752,20	97,10%	1,34%	98,44%
11.358.000,47	1.380.993,26	12.738.993,73	79,71%	9,69%	89,40%




Descrição: Vista de cablagem instalada em Caixa de Passagem Elétrica na área da EE Final.

Foto: 01

Data: 06/08/14

Arquivo: 105142

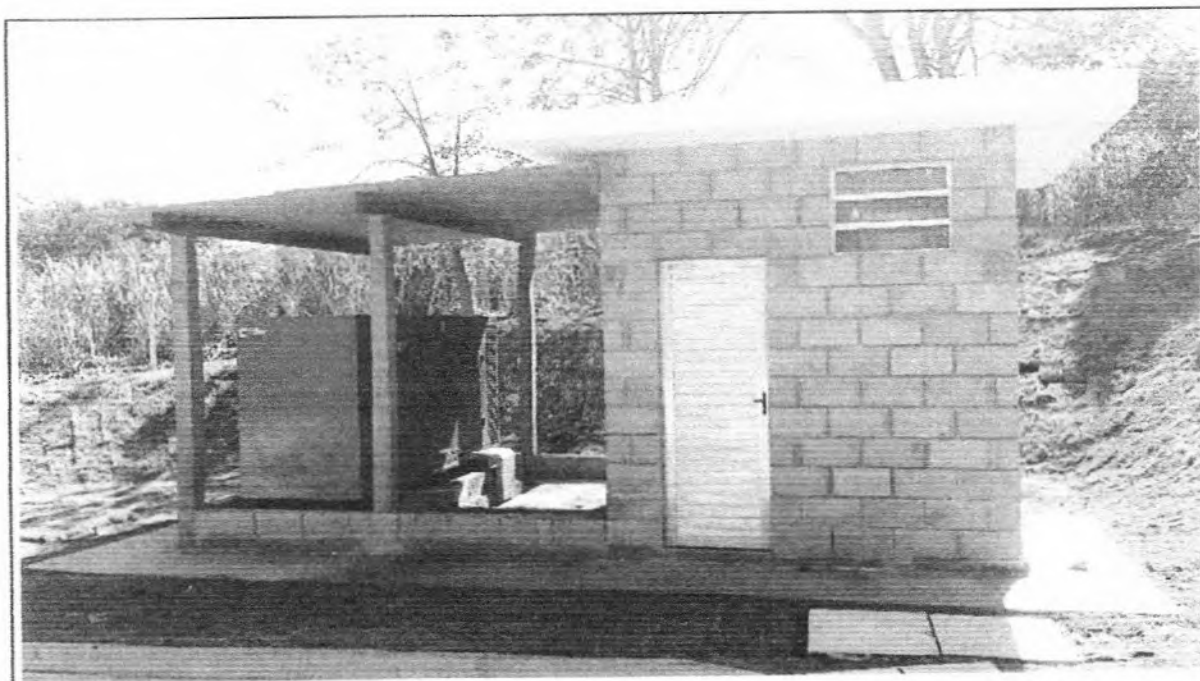


Descrição: Vista da Casa de Painel 1 e do Gerador de Emergência, próximos a EE Final.

Foto: 02

Data: 06/08/14

Arquivo: 105241

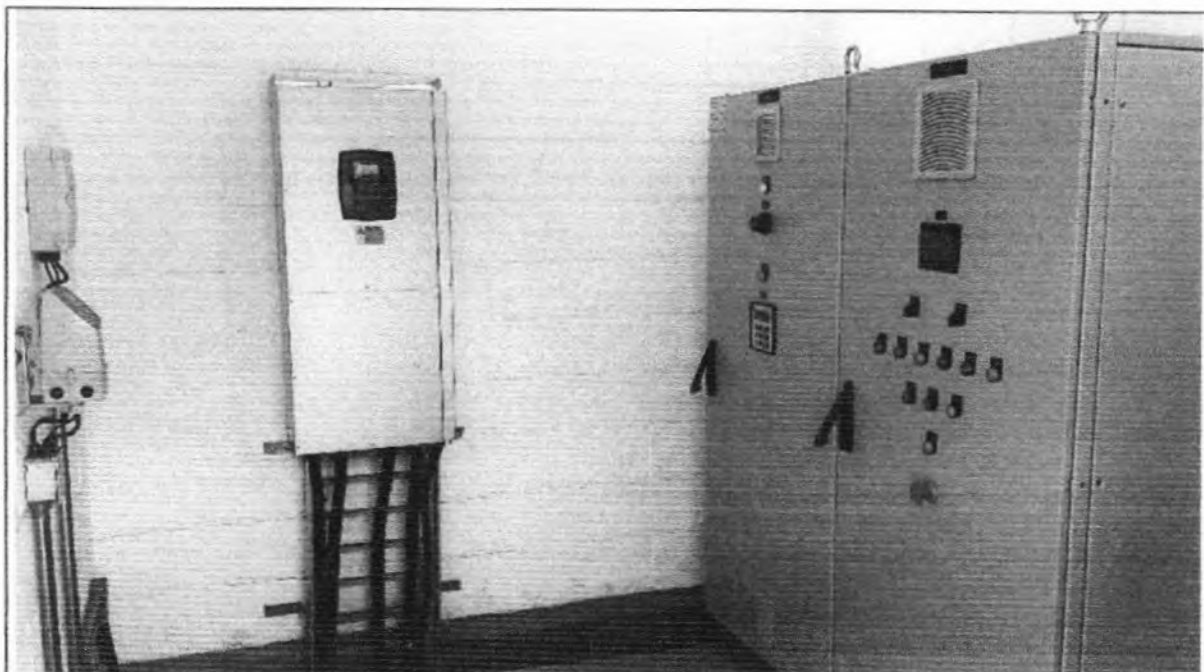

Descrição: Vista do Painele Eléctrico e Quadro de Comando da EE Final na Casa de Painele 1.

Foto: 03

Data: 06/08/14

Arquivo: 105340



Descrição: Vista da pintura das paredes internas e instalação de Luminária na Casa de Painele 1.

Foto: 04

Data: 06/08/14

Arquivo: 105356




Descrição: Guias e sarjetas da Rua da EE Final.

Foto: 05

Data: 06/08/14

Arquivo: 110051

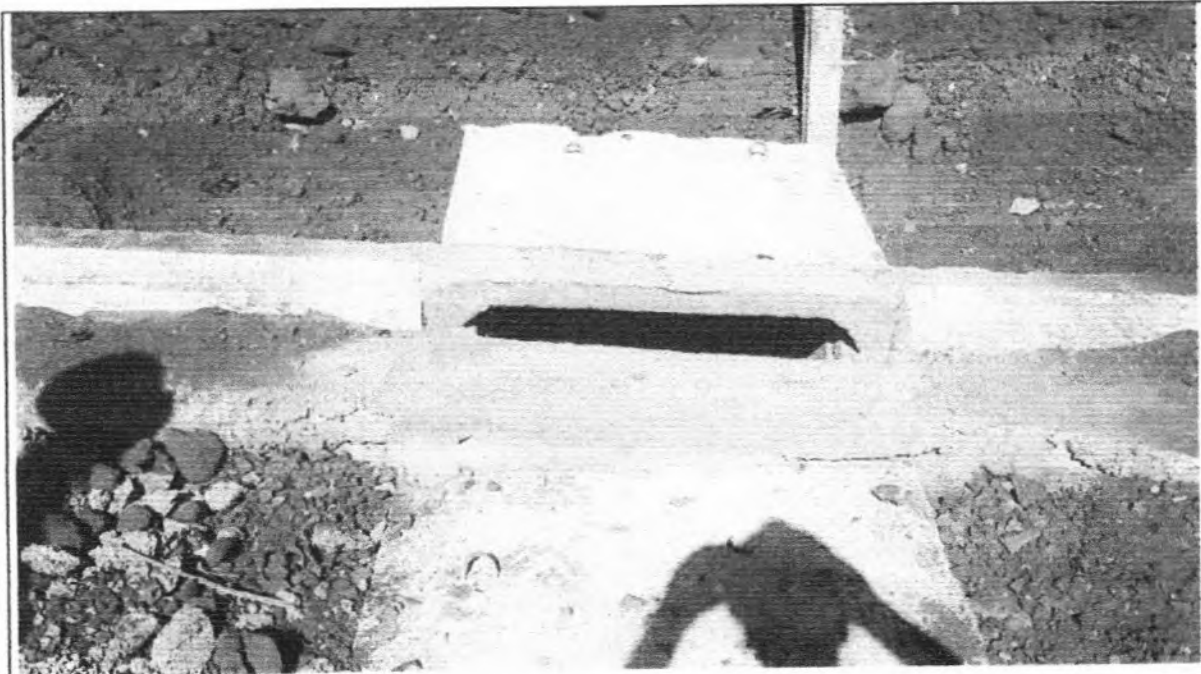

Descrição: Execução da boca de lobo.

Foto: 06

Data: 06/08/14

Arquivo: 112103




Descrição: Vista da Guarita.

Foto: 07

Data: 06/08/14

Arquivo: 110611

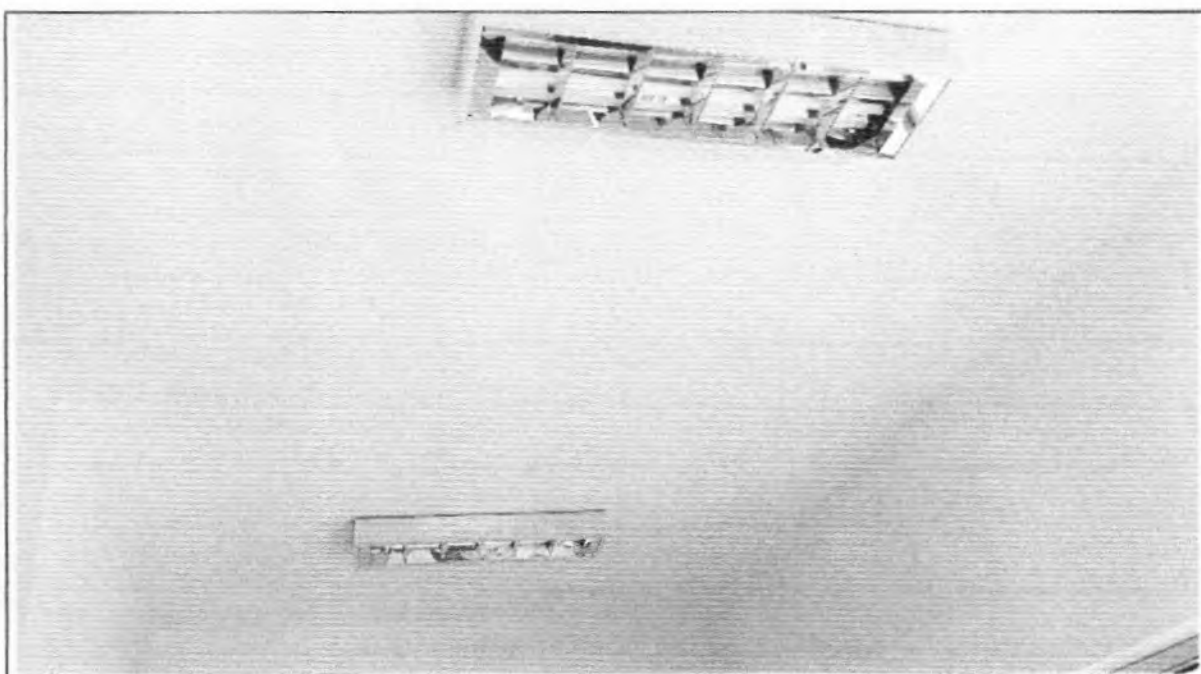

Descrição: Instalação de Luminárias na Guarita.

Foto: 08

Data: 06/08/14

Arquivo: 110733



Descrição: Banheiro da Guarita.

Foto: 09

Data: 06/08/14

Arquivo: 110852




Descrição: Vista de lateral da Administração.

Foto: 10

Data: 06/08/14

Arquivo: 111020

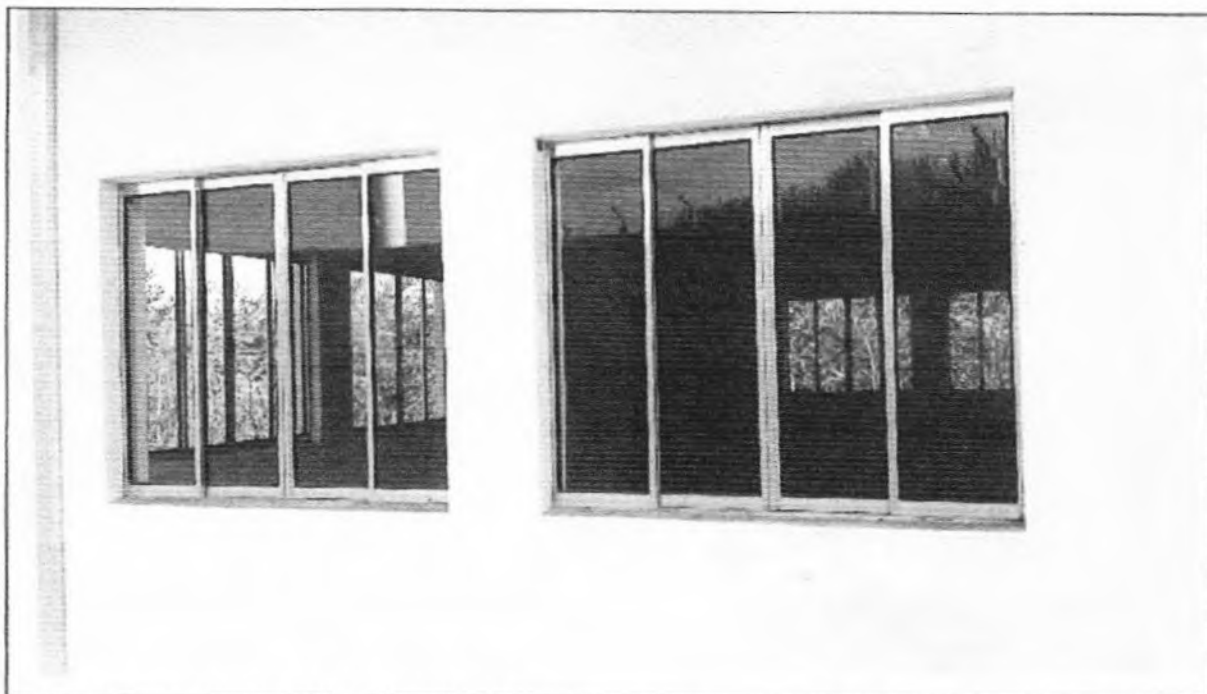

Descrição: Esquadria da Administração.

Foto: 11

Data: 06/08/14

Arquivo: 111105



Descrição: Pintura interna da Administração.

Foto: 12

Data: 06/08/14

Arquivo: 111250



Descrição: Vista lateral da Casa de Painel 2.

Foto: 13

Data: 06/08/14

Arquivo: 111417




Descrição: Vista lateral do Desarenador.

Foto: 14

Data: 06/08/14

Arquivo: 111704

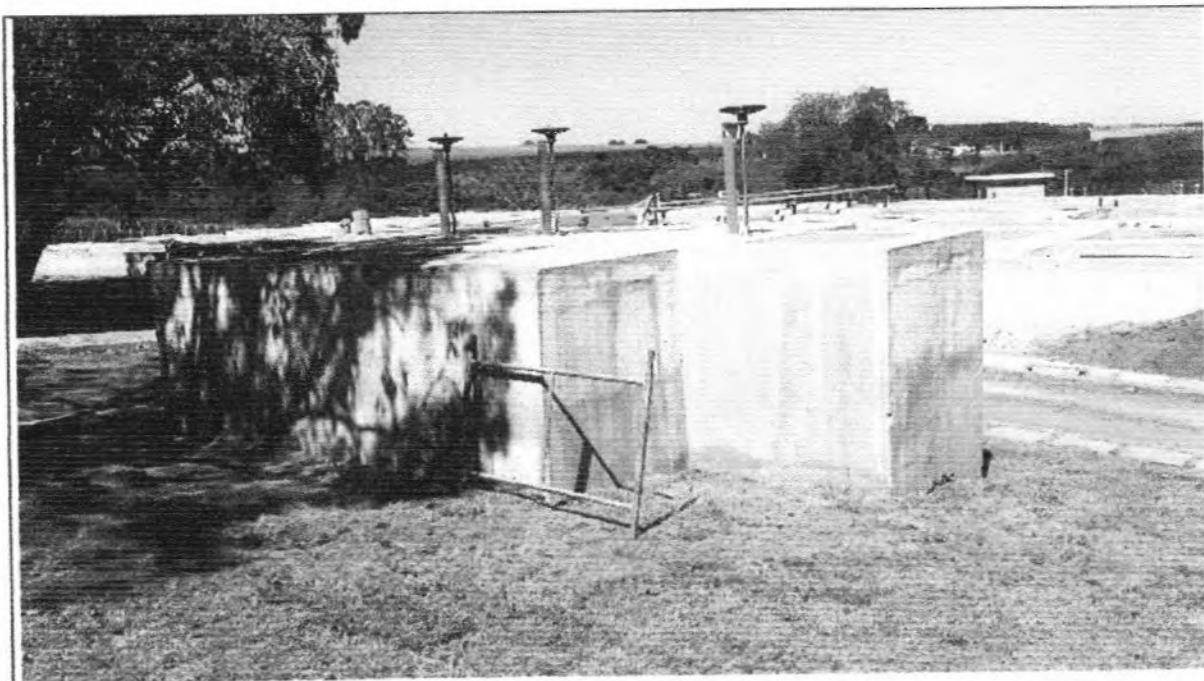


Descrição: Vista da Caixa de Fluxo 1.

Foto: 15

Data: 06/08/14

Arquivo: 112037

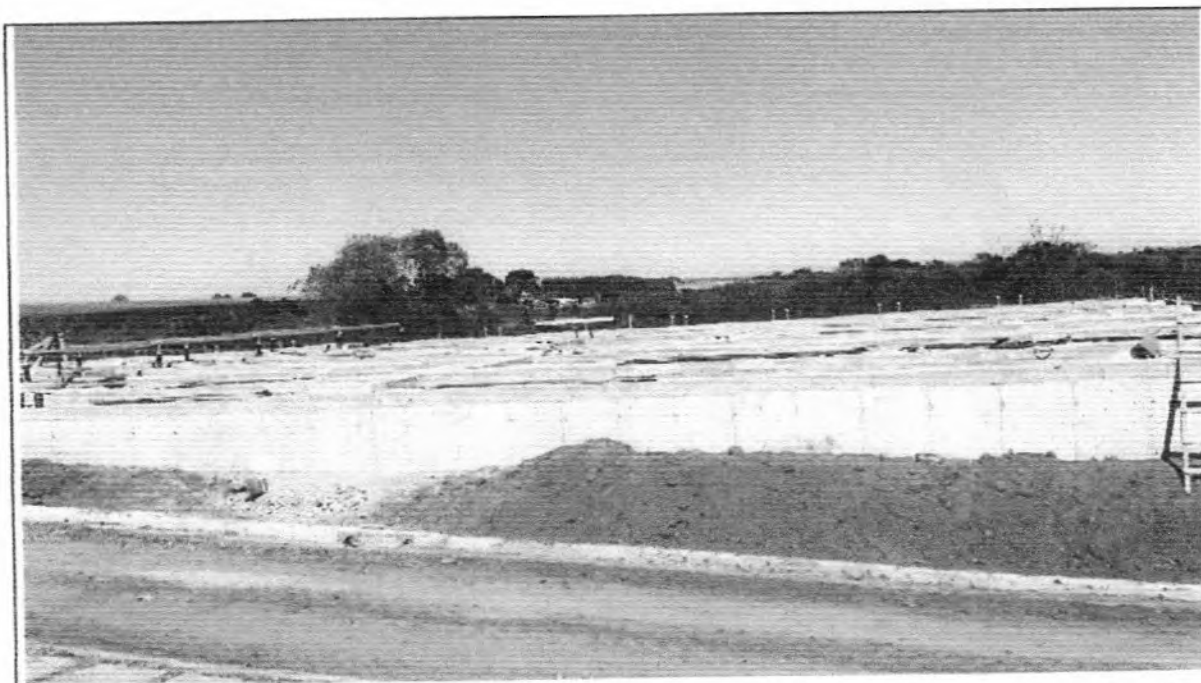


Descrição: Vista do Reator 1.

Foto: 16

Data: 06/08/14

Arquivo: 112124

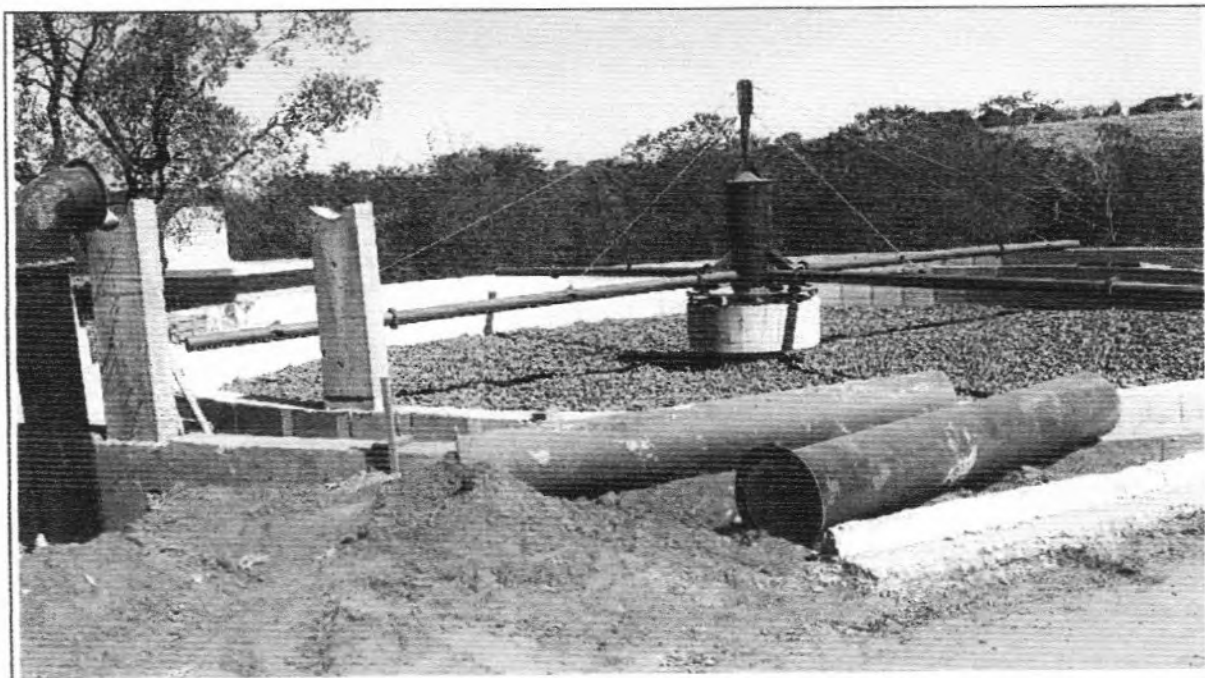


Descrição: Vista do Filtro 1.

Foto: 17

Data: 06/08/14

Arquivo: 113058

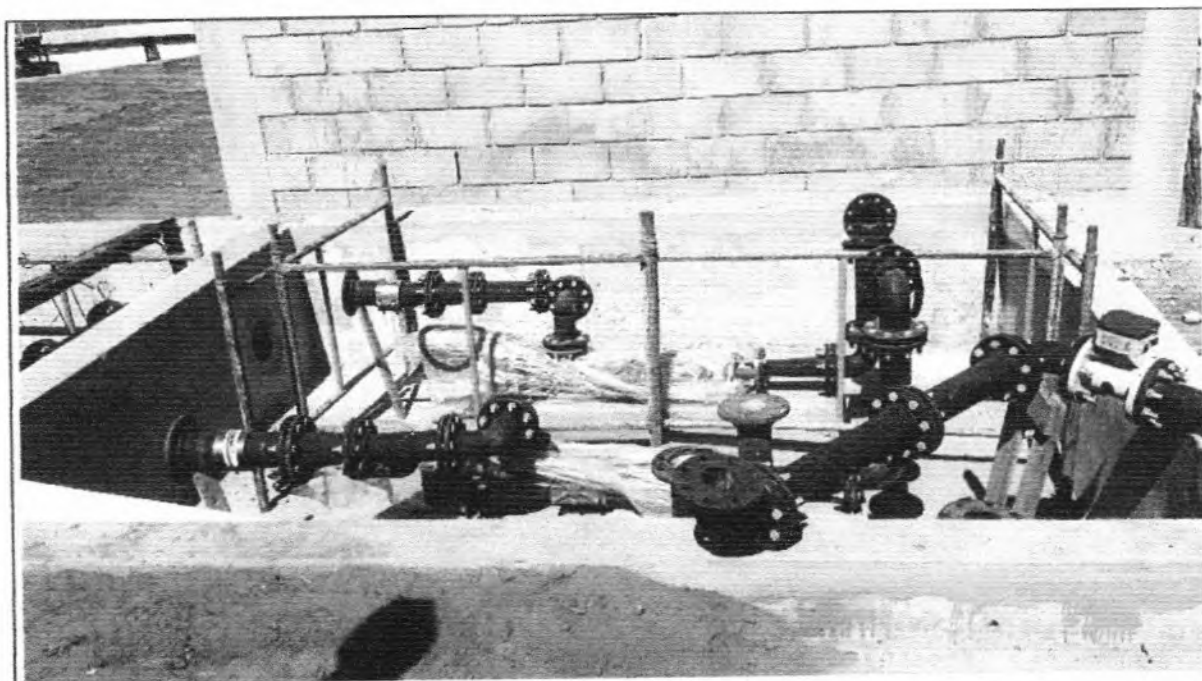

Descrição: Barrilete da EE de Lodo.

Foto: 18

Data: 06/08/14

Arquivo: 114101




Descrição: Centrifuga apoiada na laje do andar superior da Casa Desidratação de Lodo.

Foto: 19

Data: 06/08/14

Arquivo: 114220

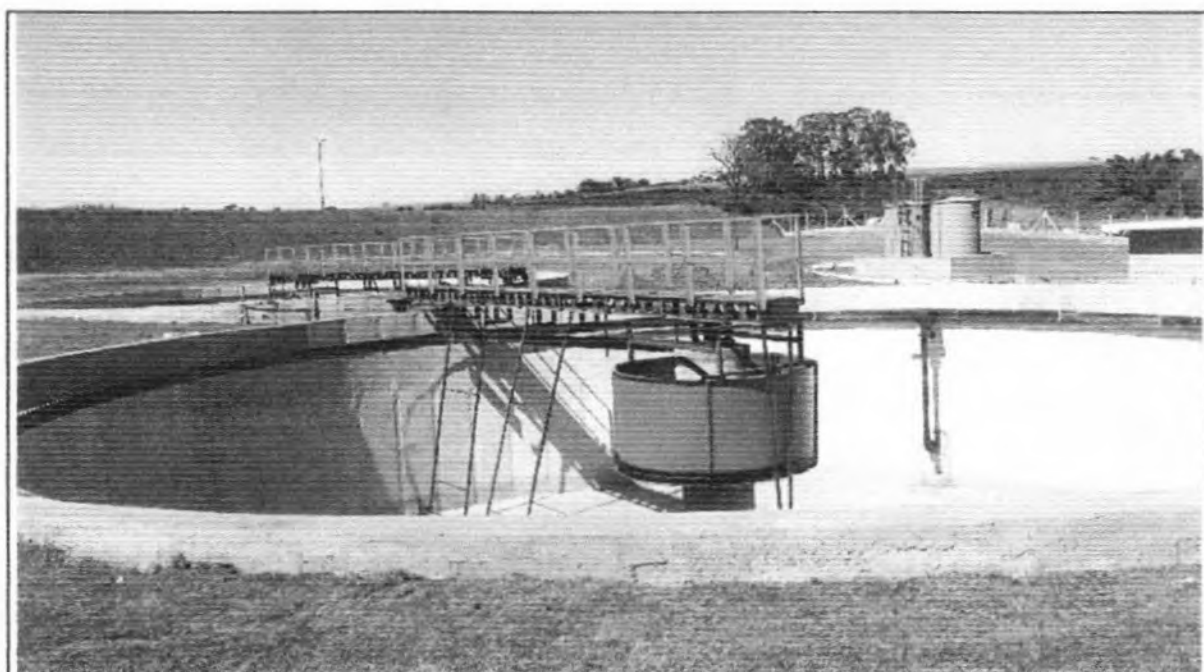

Descrição: Vstia do Decantador 1

Foto: 20

Data: 06/08/14

Arquivo: 114449




Descrição: Rua Principal sem pavimentação.

Foto: 21

Data: 06/08/14

Arquivo: 114336

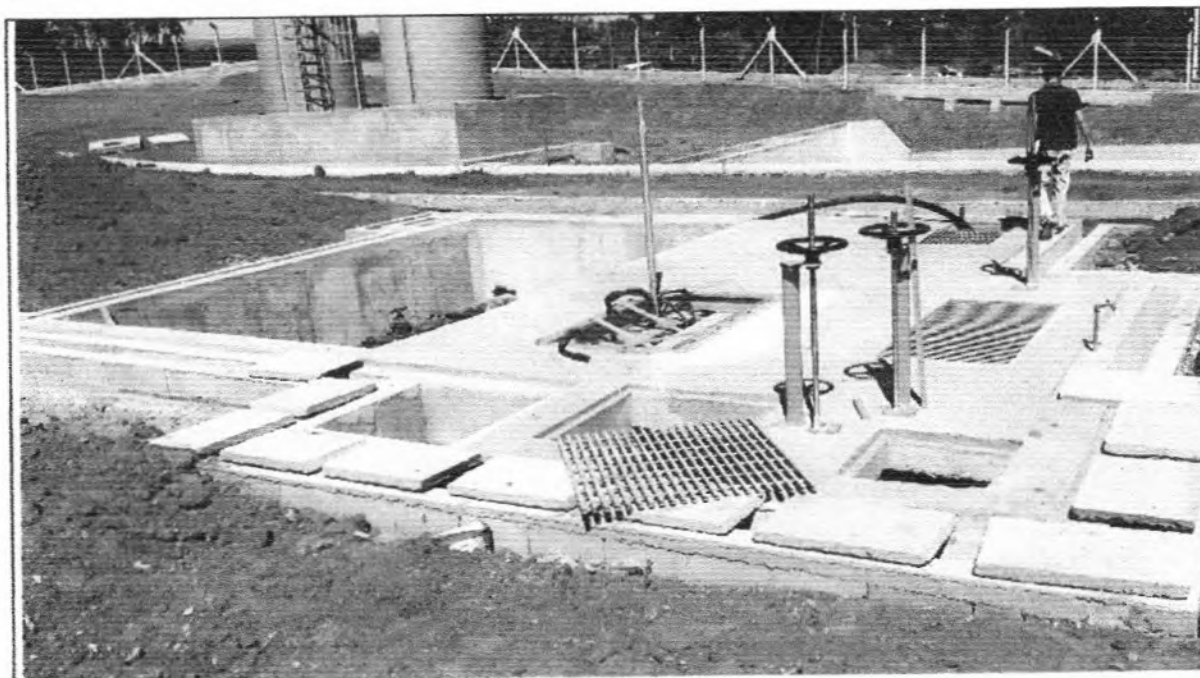


Descrição: Vista da EE Recirculação.

Foto: 22

Data: 06/08/14

Arquivo: 114702

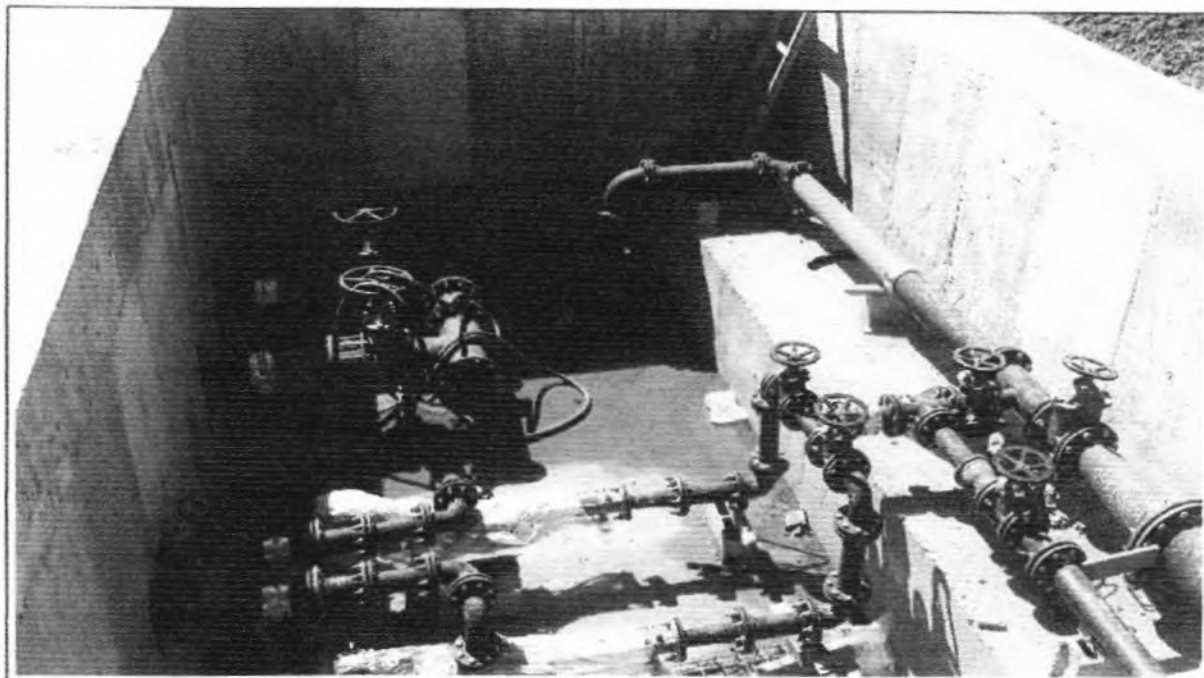

Descrição: Barriletes da EE Recirculação.

Foto: 23

Data: 06/08/14

Arquivo: 114817



Descrição: Vista da Casa de Painel 3.

Foto: 24

Data: 06/08/14

Arquivo: 114907



Descrição: Ponto de lançamento do Emissário Final no Ribeirão dos Porcos.

Foto: 25

Data: 06/08/14

Arquivo: 133649



Descrição: Ponto de lançamento da rede de drenagem de águas pluviais no Ribeirãozinho.

Foto: 39

Data: 06/08/14

Arquivo: 133649




6 - ANEXOS

- Anexo I – Termo Aditivo 001/14 ao Termo de Contrato nº 194/12, de 11/06/2.014.



Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO




TERMO ADITIVO 001/14 AO TERMO DE CONTRATO Nº 194/12.


Pelo presente termo e pela melhor forma de direito, de um lado, como CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Praça Dr. Horácio Ramalho, 160, Centro, inscrita no CNPJ nº 72.130.818/0001-30, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Dr. FULVIO ZUPPANI, portador do RG 4.639.473-4 e CPF 746.848.338-87, domiciliado à Rua 7 de Setembro, nº 335, na cidade de Taquaritinga, estado de São Paulo, de outro lado, como CONTRATADA a empresa KMG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, com sede à Avenida Rouxinol, 55 – Conj. 406/407 Moema, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 08.250.097/0001-00, neste ato representada na forma de seu estatuto por sua Sócia-Administradora e Responsável Técnico, Sra. GABRIELA DE FIGUEIREDO LAURELLI, brasileira, casada, engenheira civil, portadora do RG nº 18.715.255-X SSP/SP e CPF nº 164.199.458-44, domiciliada à Av. Padre Antonio José dos Santos, 233 – Apto. 141, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.


Tendo celebrado em 11/12/2013, o Termo de Contrato nº 194/12, oriundo da Concorrência 001/12, relativo às obras de implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários, no Município de Taquaritinga, Estado de São Paulo, resolvem de comum acordo prorrogar por 90 dias o prazo de vigência do contrato a contar de 18/06/2014, permanecendo inalteradas as demais condições estabelecidas e que ora são ratificadas".


E por estarem assim justos e combinados, assinam o presente Termo em duas vias, para os devidos efeitos legais, na presença de duas testemunhas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, 11 de Junho de 2014.


Fulvio Zuppani
Prefeito Municipal


Gabriela de Figueiredo Laurelli
KMG Consultoria e Engenharia Ltda

TESTEMUNHAS: 
Jenifer Carla da Silva
RG 46.637.999-7
CPF 388.939.298-99


Cristiano Potronieri Rombalde
RG 34.198.317-23
CPF 297.336.278-44




Conc. 001 / 12 fis. 3336
 Voltar

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.250.097/0001-00 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 15/08/2006			
NOME EMPRESARIAL K M G CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) K M G			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO AV ROUXINOL		NÚMERO 55	COMPLEMENTO CONJ 406/407
CEP 04.516-000	BAIRRO/DISTRITO MOEMA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/08/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 09/06/2014 às 16:58:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar]



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



Prefeitura Municipal de Taquaritinga


ESTADO DE SÃO PAULO



Conc. 001 / 12 / 13
Citação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA






Termo Aditivo nº 001/14 ao Termo de Contrato nº 194/12 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - CONTRATADA: KMG Consultoria e Engenharia Ltda - OBJETO: obras de implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários no município de Taquaritinga, Estado de São Paulo, resolvem, de comum acordo, prorrogar por 90 dias o prazo de vigência do contrato, a contar de 18/06/14 - ASSINATURA: 11/06/14 - Concorrência nº 001/12.


Dr. Fulvio Zuppani
Prefeito Municipal


7 - DESENHOS

“Relação de Desenhos”

Item	Título	Nº Desenho Contratada	Escala	Formato	Rev.
1	DAEE – TAQUARITINGA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – DISPOSIÇÃO GERAL - FI. 01/01	1015-DAE-PEM-TA-A1-E061	1:2.500	A1	0
2	IMPLANTAÇÃO - FI. 01/01	KMG s/nº	1:500	A1	0

-  BUEIRO
-  SENTIDO DO FLUXO
-  PONTO COTADO
-  ESTACA DO PROJETO
-  FURO DE SONDA GEM



 DAEE	SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA	Nº	
	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO PROJETO ÁGUA LIMPA LOTE 1	REV.: 0	FL.: 1/1
	TAQUARITINGA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DISPOSIÇÃO GERAL	Nº CONTRATADA 1015-DAE-PEM-TA-A1-E061	
		ESCALA: 1:2500	

SAAET
1.189
TACUARIINGA SP





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE TAQUARITINGA



Para: Superintendência

Re: Protocolo – PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. – Tomada de Preços nº 01/2013 – Contrato nº 45/2013 – 7º relatório mensal dos serviços executados e nota fiscal.

Objeto: prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no gerenciamento de obras de saneamento / esgotos / Estação de Tratamento – ETE.


Após apreciação dos documentos e relatórios protocolados nesta Autarquia pela empresa PERTÉCNICA, nada temos a opor quanto ao apresentado, bem como ao pagamento da nota fiscal nº 228.

À Tesouraria para providências.

Taquaritinga, 18 de agosto de 2.014.


Juliana Tinti Bizari Múcio
Chefe da Seção de Redes de Água e Esgoto


Luiz Carlos Antonio José
Chefe do Setor Operacional

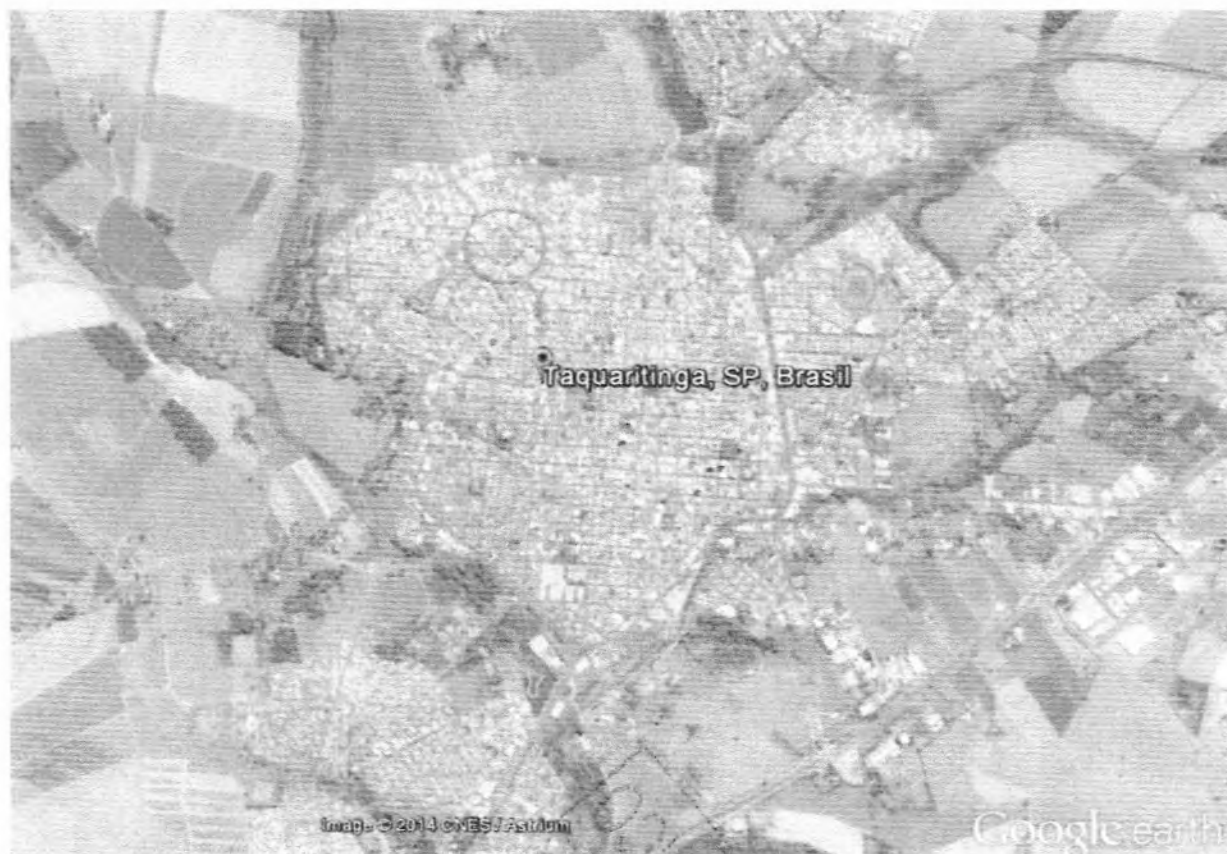

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

**CONTRATO Nº 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS /
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL – 04 A 08/08/2014

**N/REF.: GE-174-RE-AS-027A-R0
TAQUARITINGA -SP
AGOSTO/2014**



PERTÉCNICA

APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato nº 045/2013, firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda.

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento físico das obras na semana de 04 a 08/08/2014.



ÍNDICE

- 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO
- 2 - ATIVIDADES NA SEMANA DE 04 A 08/08/2014
- 3 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO



1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

- **Agente Promotor:** Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE

- **Agente Financeiro e Técnico:** Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE

- **Objeto:** Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede)

- **Recursos:**

- . Fonte: Programa Água Limpa;
- . Convênio nº 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011;
- . Valor: R\$ 14.491.618,13 – Exercício 2011;
- . Prazo: 24 meses

- **Agente Executor:** Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP

- **Contrato das obras e serviços:**

- . Processo licitatório: Concorrência nº 011/12;
- . Contrato nº 194/12, de 11/12/2.012;
- . Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.;
- . Valor: R\$ 11.431.936,13;
- . Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço;
- . Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 16/06/2.014;
- . Aditivo contratual de valor: R\$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013;
- . Valor contratual aditivado: R\$ 14.249.469,14.

2 – ATIVIDADES NA SEMANA DE 04 A 08/08/2014

2 – ATIVIDADES NA SEMANA 04 A 08/08/2014

No período de 04 a 08/08/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de:

1) Acompanhamento da construção civil das unidades

→ Reatores Anaeróbicos

- Chumbamento dos vertedouros das canaletas de saída de efluente do Reator 1;
- Regularização das vigas inferiores do Reator 1.

→ Casa Desidratação de Lodo

- Regularização do piso da escada de acesso ao andar superior da unidade.

→ Queimador de Gás

- Armadura e forma da base dos queimadores de gás;

2) Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades

→ Casa de Painel

- Instalação do painel de comando da Casa de Painel 3;
- Instalação da fiação para iluminação interna da Casa de Painel 3.

→ Estação Elevatória de Recirculação


- Instalação dos painéis de chave geral das bombas da EE Recirculação.

3) Dados Gerais

- Em média a obra contou com 12 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 13:00 às 17:00h, sendo:

- 10 ajudantes;
- 01 pedreiros;
- 01 encarregados;

- Todos operários estavam com EPI's.
- No período não ocorreram acidentes de trabalho.
- Não foram constatadas chuvas no período.

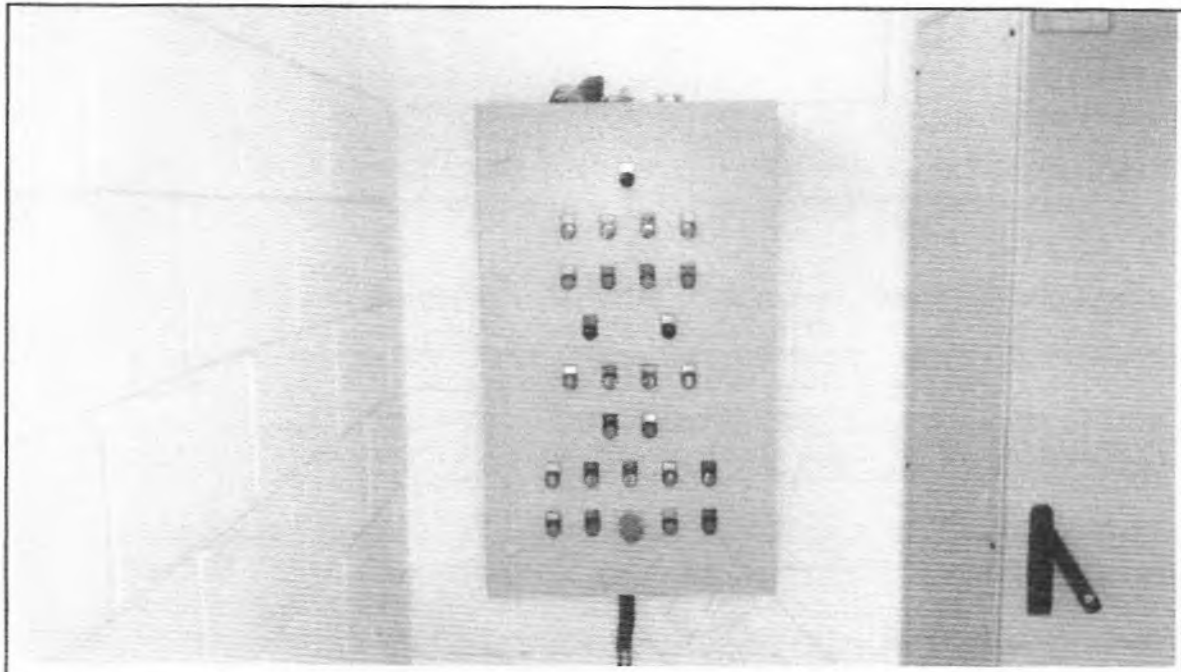


Descrição: Instalação do painel de comando da Casa de PAINEL 3

Foto: 01

Data: 08/08/14

Arquivo: 118412

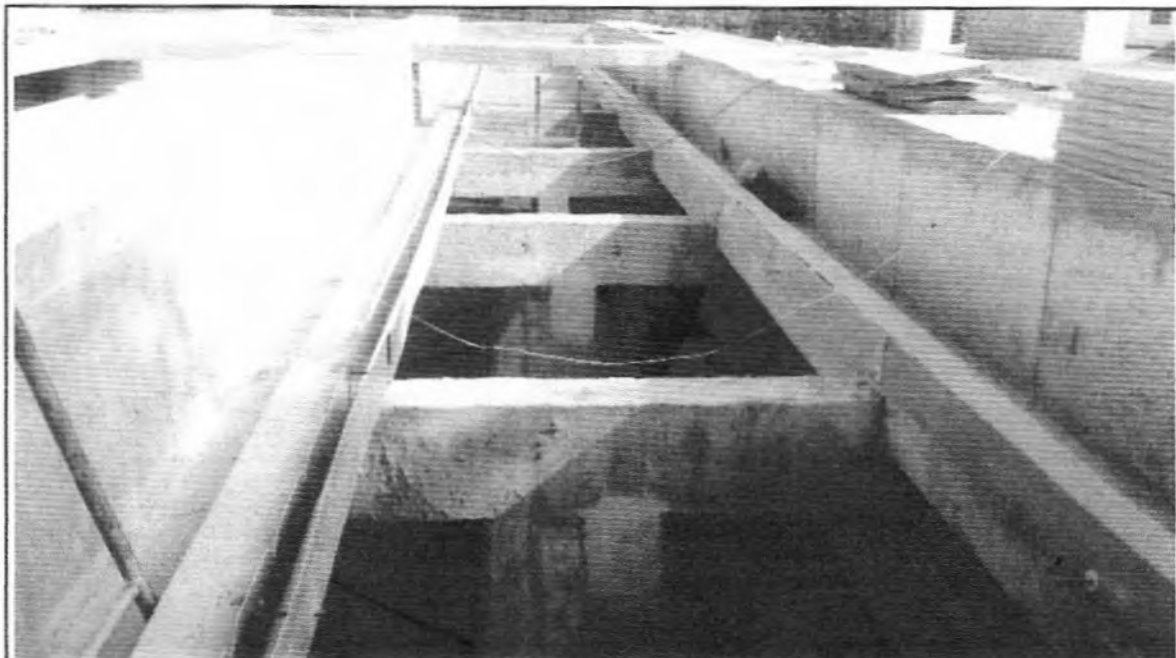

Descrição: Chumbamento dos vertedouros das canaletas de saída de efluente do Reator 1

Foto: 02

Data: 08/08/14

Arquivo: 9630




Descrição: Regularização do piso da escada de acesso ao andar superior da Casa Desidratação de Lodo.

Foto: 03

Data: 08/08/14

Arquivo: 95623

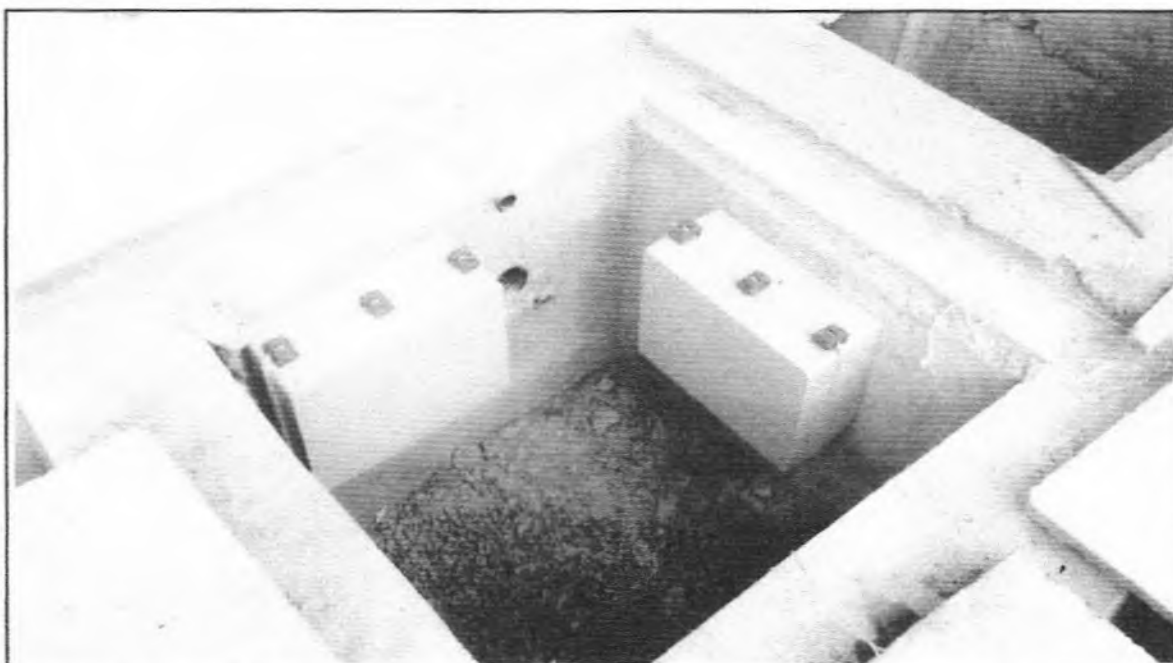

Descrição: Instalação dos painéis de chave geral das bombas da EE Recirculação.

Foto: 04

Data: 08/08/14

Arquivo: 99603

Protocolo 801 / 2014

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA

22/08/2014

11:45:09

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 11/08 A 15/08/14



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

CONTRATO Nº 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS /
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL – 11 A 15/08/2014

N/REF.: GE-174-RE-AS-028-R0
TAQUARITINGA -SP
AGOSTO/2014



PERTÉCNICA

APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato nº 045/2013, firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda.

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento físico das obras na semana de 11 a 15/08/2014.

ÍNDICE

- 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO**
- 2 - ATIVIDADES NA SEMANA DE 11 A 15/08/2014**
- 3 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO**

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO



1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

- **Agente Promotor:** Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE

- **Agente Financeiro e Técnico:** Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE

- **Objeto:** Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede)

- Recursos:

- . Fonte: Programa Água Limpa;
- . Convênio nº 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011;
- . Valor: R\$ 14.491.618,13 – Exercício 2011;
- . Prazo: 24 meses

- **Agente Executor:** Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP

- Contrato das obras e serviços:

- . Processo licitatório: Concorrência nº 011/12;
- . Contrato nº 194/12, de 11/12/2.012;
- . Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.;
- . Valor: R\$ 11.431.936,13;
- . Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço;
- . Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 16/06/2.014;
- . Aditivo contratual de valor: R\$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013;
- . Valor contratual aditivado: R\$ 14.249.469,14.

2 – ATIVIDADES NA SEMANA DE 11 A 15/08/2014

2 – ATIVIDADES NA SEMANA 11 A 15/08/2014

No período de 11 a 15/08/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de:

1) Acompanhamento da construção civil das unidades

→ Reatores Anaeróbicos

- Chumbamento dos vertedouros das canaletas de saída de efluente do Reator 1;
- Limpeza da área interna do Reator 1.

→ Casa Desidratação de Lodo

- Regularização do piso da escada de acesso ao andar superior da unidade.

→ Estação Elevatória Final

- Armadura e forma da base da talha;
- Concretagem da base da talha.

→ Queimador de Gás

- Armadura e forma da base dos queimadores de gás;
- Concretagem da base dos queimadores de gás.

2) Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades

→ Casa de Painel


- Término da instalação do painel de comando da Casa de Painel 3;
- Instalação do para raio da Casa de Painel 3;
- Instalação da luminária da Casa de Painel 3.

3) Dados Gerais

- Em média a obra contou com 14 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 13:00 às 17:00h, sendo:

- 12 ajudantes;
- 01 pedreiros;
- 01 encarregados;

- Todos operários estavam com EPI's.
- No período não ocorreram acidentes de trabalho.
- Não foram constatadas chuvas no período.

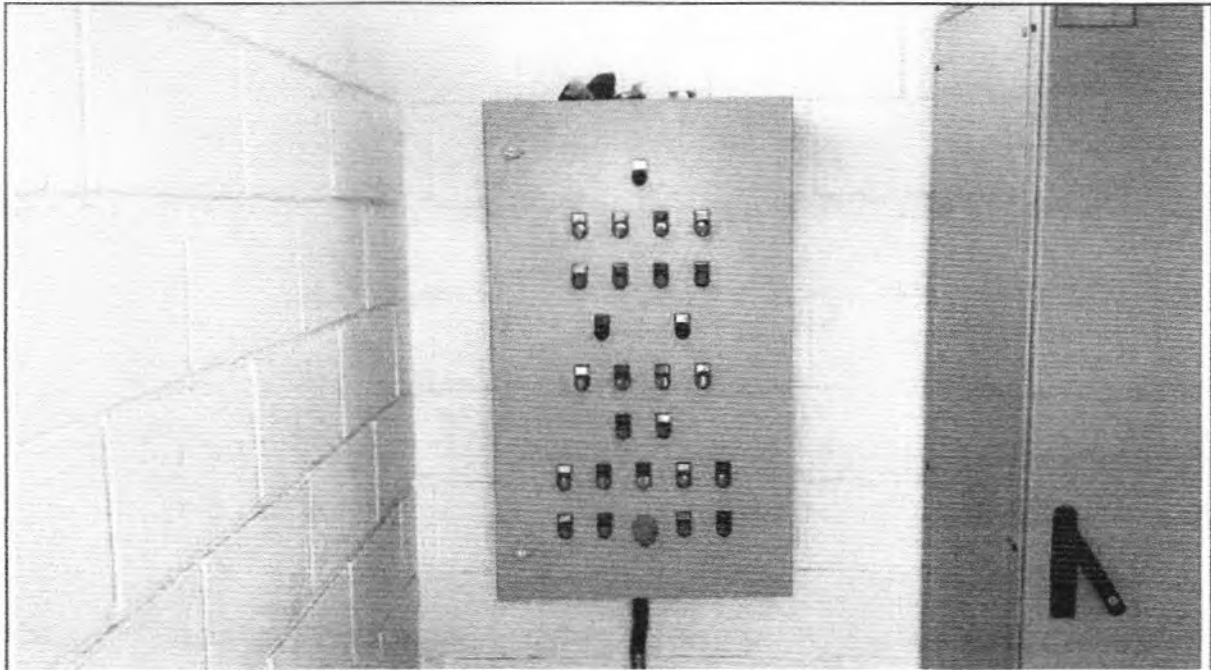


Descrição: Término da instalação do painel de comando da Casa de Painei 3

Foto: 01

Data: 15/08/14

Arquivo: 92841



Descrição: Instalação da luminária da Casa de Painei 3.

Foto: 02

Data: 15/08/14

Arquivo: 92845




Descrição: Instalação do para raio da Casa de Paineis 3

Foto: 03

Data: 15/08/14

Arquivo: 93537

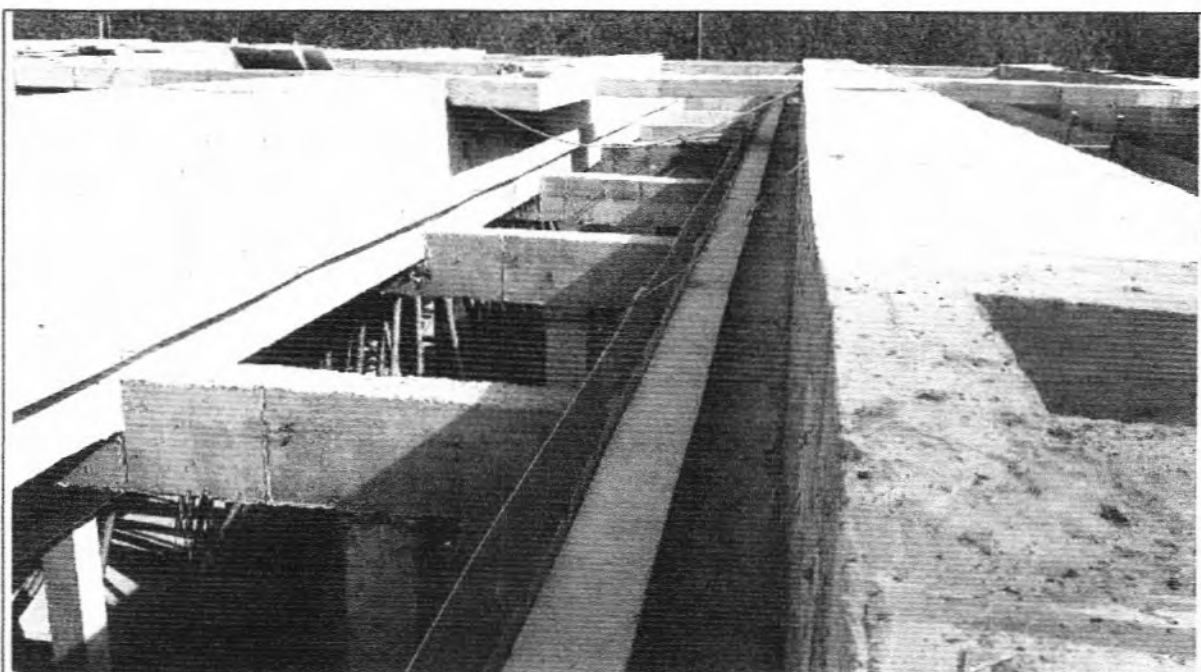


Descrição: Chumbamento dos vertedouros das canaletas de saída de efluente do Reator 1

Foto: 04

Data: 15/08/14

Arquivo: 94647

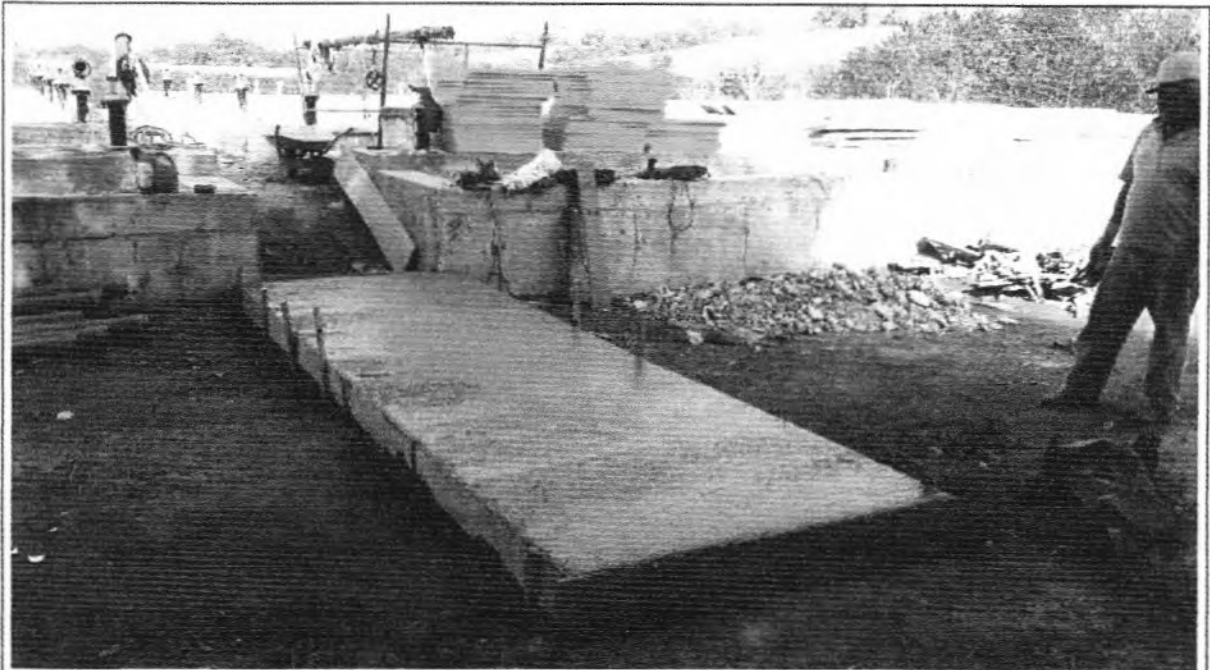


Descrição: Concretagem da base dos queimadores de gás

Foto: 05

Data: 15/08/14

Arquivo: 94719

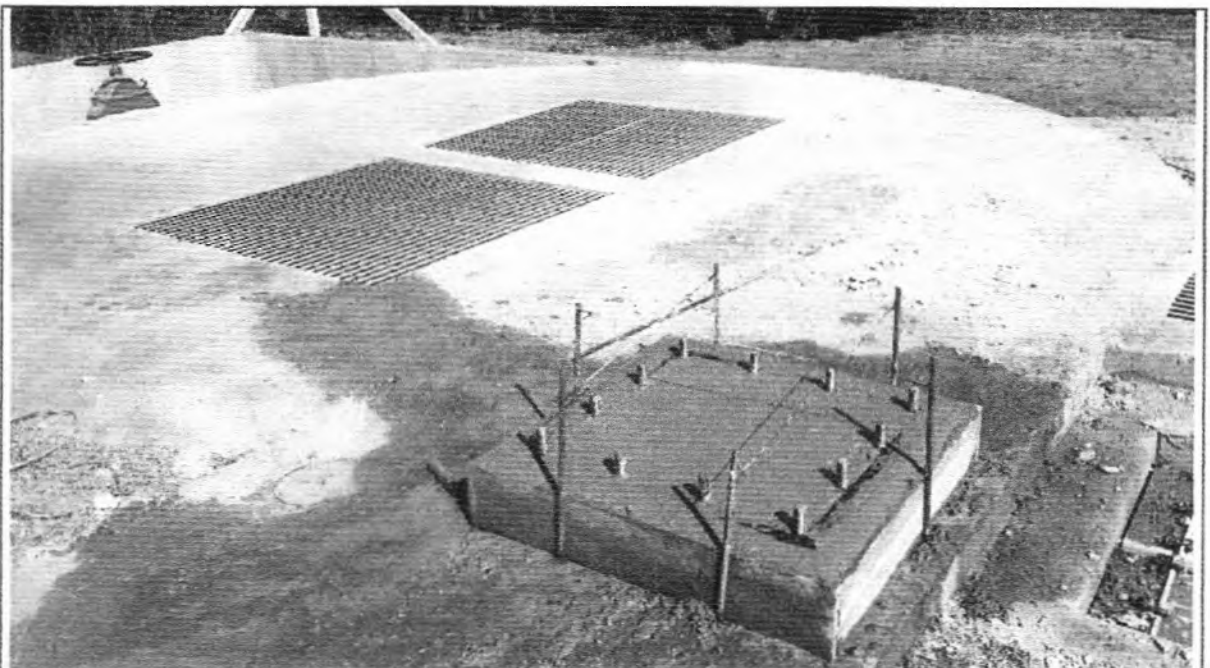

Descrição: Concretagem da base da talha da EE Final

Foto: 06

Data: 15/08/14

Arquivo: 95126



Descrição: Regularização do piso da escada de acesso ao andar superior da Casa Desidratação de Lodo.

Foto: 07

Data: 15/08/14

Arquivo: 95558

DTE-064/14

São Paulo, 05 de Setembro de 2.014.

Ao

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET

Rua Clíneu Braga de Magalhães, 911

CEP 15900-000 - Centro

Taquaritinga - SP

At.: Satoshi Yokoyama
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semanas de 18 a 22/08 e de 25 a 29/08/2014


Prezados Senhores (as),

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão.pdf), dos relatórios de acompanhamentos semanais das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir:

- 1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 18 a 22/08/2.014, Revisão 0 (N/Ref.: GE-174-RE-AS-029-R0);
- 2) Relatório de Acompanhamento da Semana de 25 a 29/08/2.014, Revisão 0 (N/Ref.: GE-174-RE-AS-0303-R0);

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Engº Francisco José Justo
Sócio Gerente



Contrato 045/2013 - Ger Obras ETE / Solicitação de informações e documentos

Francisco Justo <franjusto@uol.com.br>
Para: "engenharia@saaet.com.br" <engenharia@saaet.com.br>
Cc: "bordinasso@gmail.com" <bordinasso@gmail.com>

25 de agosto de 2014 13:23

At.: Engº Satoshi Yokoyama - Superintendente

174

Prezados,

Em atenção aos trabalhos de nossa reunião de 19/08 pp., vimos solicitar ao SAAET:

- 1) Informação da P.M.Taquaritinga se houve pedido de renovação da Licença Prévia e de Instalação nº 52000195, de 10/08/2.010, que tinha validade de 03 (três) anos, portanto, vencida em 10/08/2.013;
- 2) Solicitar a P.M.Taquaritinga a justificativa e os cálculos hidráulicos que embasaram a alteração das estruturas da ETE, indicados no Ofício KMG nº C.KMG-42/2013, de 03/07/2.013. Na oportunidade solicitar cópias dos desenhos da unidade Tanque de Contato.
- 3) Em atenção a INFORMAÇÃO/BBT/BTNH 125/2013, de 11/11/2013, onde a Coordenação do DAEE informa a verificação pela KMG de discrepâncias na população beneficiada utilizada no desenvolvimento do projeto (Engecorps/2009) e que, para tanto, solicitou análise da empresa Sistemas Ambientais - Engenharia, Consultoria e Saneamento Ltda., que readequou o projeto, sofrendo ajustes para atender de forma satisfatória a população urbana municipal, solicitar à P.M.Taquaritinga cópias das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART's) dos envolvidos na readequação, que inclusive, importou quantia aditada ao contrato no valor de R\$ 60.000,00, bem como, cópia do contrato de subcontratação da Sistemas Ambientais, em conformidade com o Item p, da Cláusula VII, do Contrato 194/12.
- 4) Solicitar à P.M.Taquaritinga, cópias dos desenhos do Sistema de Drenagem Subterrânea, serviços aditados ao Contrato 194/12, no valor de R\$ 186.666,46.
- 5) Em atenção ao Ofício KMG nº C.KMG-90/2014, de 25/07/2.014, Protocolo P.M.Taquaritinga nº 6002/2014, de 28/07/2.014, onde a Contratada informa e justifica a imediata paralização das obras, solicitar à P.M.Taquaritinga, manifestação quanto ao Item k, da Cláusula VII, do Contrato 194/12, que dispõe sobre a insuficiência de equipamentos para cumprimento dos prazos contratuais, bem como, questionamento quanto a guarda e segurança dos equipamentos e das instalações da ETE como um todo.

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamenbte,

Francisco Justo / PERTÉCNICA HSMA
T (11) 3081.9559
C (11) 9.9991.2060

Francisco Justo <franjusto@uol.com.br>
Para: "engenharia@saaet.com.br" <engenharia@saaet.com.br>
Cc: "bordinasso@gmail.com" <bordinasso@gmail.com>

25 de agosto de 2014 14:30

At.: Engº Satoshi Yokoyama - Superintendente



Prezados,

Em complementação ao item 1 da mensagem abaixo, informamos que no site da Cetesb/Licenciamento indica que 13/06/2.04 foi efetuado pedido da Licença de Operação pela P.M.Taquaritinga.

Atenciosamente,

Francisco Justo / PERTÉCNICA HSMA
T (11) 3081.9559
C (11) 9.9991.2060

De: franjusto@uol.com.br

Enviada: Segunda-feira, 25 de Agosto de 2014 13:23

Para: engenharia@saaet.com.br

Assunto: Contrato 045/2013 - Ger Obras ETE / Solicitação de informações e documentos

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Taquaritinga, 29 de agosto de 2.014.

Ofício nº 174/2.014

Exmo. Sr.
Fulvio Zuppani

CÓPIA

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, através de seu Superintendente infra-assinado, vem à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao requerimento da empresa Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos Ltda., solicitar, com a brevidade e urgência possíveis, o quanto segue:

1) Se houve pedido de renovação da Licença Prévia e de Instalação nº 52000195, de 10/08/2010, cuja validade era de 3 (três) anos, portanto, vencida em 10/08/13;

2) Justificativa e cálculos hidráulicos que embasaram a alteração das estruturas da ETE, indicados no Ofício KMG nº C.KMG-42/2013, de 03/07/2.013, como também cópias dos desenhos da unidade Tanque de Contato;


3) Em atenção à INFORMAÇÃO/BBT/BTNH 125/2013, de 11/11/2013, onde a Coordenação do DAEE informa a verificação pela KMG de discrepâncias na população beneficiada utilizada no desenvolvimento do projeto (Engecorps/2009) e que, para tanto, solicitou análise da empresa Sistemas Ambientais - Engenharia, Consultoria e Saneamento Ltda., que readequou o projeto, sofrendo ajustes para atender de forma satisfatória a população urbana municipal, solicitamos cópias das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART's) dos envolvidos na readequação, que, inclusive, importou quantia aditada ao contrato no valor de R\$ 60.000,00, bem como, cópia do contrato de subcontratação da Sistemas Ambientais, em conformidade com o Item p, da Cláusula VII, do Contrato 194/12;

4) Cópias dos desenhos do Sistema de Drenagem Subterrânea, serviços aditados ao Contrato 194/12, no valor de R\$ 186.666,46;

5) Em atenção ao Ofício KMG nº C.KMG-90/2014, de 25/07/2.014, Protocolo P.M.Taquaritinga nº 6002/2014, de 28/07/2.014, onde a Contratada informa e justifica a imediata paralisação das obras, solicitamos a manifestação quanto ao Item k da Cláusula VII do Contrato 194/12, que dispõe sobre a insuficiência de equipamentos para cumprimento dos prazos contratuais, bem como, questionamento quanto à guarda e segurança dos equipamentos e das instalações da ETE como um todo.

Sendo estas as informações necessárias, e colocando-nos à inteira disposição para informações suplementares, prevalecemo-nos da oportunidade para renovar protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Satoshi Yokoyama
Superintendente

Exmo. Sr.
Fúlvio Zuppani
DD. Prefeito Municipal de Taquaritinga
Praça Dr. Horácio Ramalho, nº 160 - Centro
CEP: 15900-000
Taquaritinga-SP



Contrato 045/2013 - Ger Obras ETE / Contrato Obras - Termo Aditivos - Garantia contratual

Francisco Justo <franjusto@uol.com.br>

25 de agosto de 2014 14:53

Para: "engenharia@saaet.com.br" <engenharia@saaet.com.br>

Cc: "bordinasso@gmail.com" <bordinasso@gmail.com>

At.: Engº Satoshi Yokoyama - Superintendente

Prezados,

Em atenção ao Termo Aditivo 001/2.013, de 10/12/2.013 e Termo Aditivo 001/2014, de 11/06/2014, que aditam o valor de R\$ 2.817.533,58 e que prorroga em 90 (noventa) dias o prazo ao Contrato 194/12, respectivamente, por gentileza, solicitar informação à P.M. Taquaritinga se foi solicitada a prorrogação da Garantia Contratual da Concorrência 001/12 - Edital 018/12, **Apólice nº 027982012010775000523**, emitida por **ARGO SEGUROS BRASIL S/A**.

Atenciosamente,

Francisco Justo / PERTÉCNICA HSMA

T (11) 3081.9559

C (11) 9.9991.2060

125



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE TAQUARITINGA



Taquaritinga, 29 de agosto de 2.014.

Ofício nº 175/2.014


CÓPIA

Exmo. Sr.
Fúlvio Zuppani


O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, através de seu Superintendente infra-assinado, vem à presença de Vossa Excelência, em atendimento à solicitação da empresa Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos Ltda., solicitar, com a brevidade e urgência possíveis, informações acerca da prorrogação da Garantia Contratual da Concorrência nº 01/2012, uma vez que o Termo Aditivo nº 01/2013, de 10/12/13, e Termo Aditivo nº 01/2014, de 11/06/14, adita o valor de R\$ 2.817.533,58 e prorroga em 90 dias o prazo de execução ao Contrato nº 194/2012, respectivamente, cuja Apólice é nº 027982012010775000523, emitida por Argo Seguros Brasil S/A.

Sendo estas as informações necessárias, e colocando-nos à inteira disposição para informações suplementares, prevalecemo-nos da oportunidade para renovar protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Satoshi Yokoyama
Superintendente

Exmo. Sr.
Fúlvio Zuppani
DD. Prefeito Municipal de Taquaritinga
Praça Dr. Horácio Ramalho, nº 160 - Centro
CEP:15900-000
Taquaritinga-SP


Luiz R.C. Ferreira
R.F. 120194
Protocolo e Arquivo
02-09-14

Taquaritinga, 12 de setembro de 2.014.

Ofício nº 197/2.014

À
KMG Consultoria e Engenharia Ltda.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, através de seu Superintendente infra-assinado, utiliza-se do presente, em atendimento ao requerimento da empresa Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos LTDA., para solicitar desta empresa, com a brevidade e urgência possíveis, o quanto segue:

1) Se houve pedido de renovação da Licença Prévia e de Instalação nº 52000195, de 10/08/2010, cuja validade era de 3 (três) anos, portanto, vencida em 10/08/13;

2) Justificativa e cálculos hidráulicos que embasaram a alteração das estruturas da ETE, indicados no Ofício KMG nº C.KMG-42/2013, de 03/07/2.013, como também cópias dos desenhos da unidade Tanque de Contato;

3) Em atenção à INFORMAÇÃO/BBT/BNH 125/2013, de 11/11/2013, onde a Coordenação do DAEE informa a verificação pela KMG de discrepâncias na população beneficiada utilizada no desenvolvimento do projeto (Engecorps/2009) e que, para tanto, solicitou análise da empresa Sistemas Ambientais - Engenharia, Consultoria e Saneamento Ltda., que readequou o projeto, sofrendo ajustes para atender de forma satisfatória a população urbana municipal, solicitamos cópias das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART's) dos envolvidos na readequação, que, inclusive, importou quantia aditada ao contrato no valor de R\$ 60.000,00, bem como, cópia do contrato de subcontratação da Sistemas Ambientais, em conformidade com o Item p, da Cláusula VII, do Contrato 194/12;

4) Cópias dos desenhos do Sistema de Drenagem Subterrânea, serviços aditados ao Contrato 194/12, no valor de R\$ 186.666,46;

(Handwritten mark)



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE TAQUARITINGA

CÓPIA




5) Em atenção ao Ofício KMG nº C.KMG-90/2014, de 25/07/2.014, Protocolo P.M.Taquaritinga nº 6002/2014, de 28/07/2.014, onde a Contratada informa e justifica a imediata paralisação das obras, solicitamos a manifestação quanto ao Item k da Cláusula VII do Contrato 194/12, que dispõe sobre a insuficiência de equipamentos para cumprimento dos prazos contratuais, bem como, questionamento quanto à guarda e segurança dos equipamentos e das instalações da ETE como um todo.

6) Informações acerca da prorrogação da Garantia Contratual da Concorrência nº 01/2012, uma vez que o Termo Aditivo nº 01/2013, de 10/12/13, e Termo Aditivo nº 01/2014, de 11/06/14, adita o valor de R\$ 2.817.533,58 e prorroga em 90 dias o prazo de execução ao Contrato nº 194/2012, respectivamente, cuja Apólice é nº 027982012010775000523, emitida por Argo Seguros Brasil S/A.

Ressaltamos que tais informações solicitadas, também foram enviadas à Prefeitura Municipal de Taquaritinga através dos ofícios nº 174/2014 e 175/2014, em anexo.

Sendo estas as informações necessárias, e colocando-nos à inteira disposição para informações suplementares, prevalecemo-nos da oportunidade para renovar protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Satoshi Yokoyama
Superintendente

Ilm. Sr.
Engº Marcelo Ruban Moldes Saes
KMG Consultoria e Engenharia Ltda.
Rua Santo Bassan, nº 117 - CEP 175072-60
Marília/SP

Recebido
24/09
10h 20min

Fone:(16) 3253-8400
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 - Centro
CEP 15900-000 Taquaritinga - SP
atendimento@saaet.com.br

Protocolo 860 / 2014

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA

05/09/2014

12:26:06

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 18 A 22/08/2014



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

CONTRATO Nº 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS /
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL – 18 A 22/08/2014

N/REF.: GE-174-RE-AS-029-R0
TAQUARITINGA -SP
AGOSTO/2014



APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato nº 045/2013, firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda.

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento físico das obras na semana de 18 a 22/08/2014.

ÍNDICE

- 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO
- 2 - ATIVIDADES NA SEMANA DE 18 A 22/08/2014
- 3 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

- **Agente Promotor:** Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE
- **Agente Financeiro e Técnico:** Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE
- **Objeto:** Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede)
- **Recursos:**
 - . Fonte: Programa Água Limpa;
 - . Convênio nº 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011;
 - . Valor: R\$ 14.491.618,13 – Exercício 2011;
 - . Prazo: 24 meses
- **Agente Executor:** Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP
- **Contrato das obras e serviços:**
 - . Processo licitatório: Concorrência nº 011/12;
 - . Contrato nº 194/12, de 11/12/2.012;
 - . Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.;
 - . Valor: R\$ 11.431.936,13;
 - . Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço;
 - . Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 16/06/2.014;
 - . Aditivo contratual de valor: R\$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013;
 - . Valor contratual aditivado: R\$ 14.249.469,14.

2 – ATIVIDADES NA SEMANA DE 18 A 22/08/2014

2 – ATIVIDADES NA SEMANA 18 A 22/08/2014

No período de 18 a 22/08/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de:

1) Acompanhamento da construção civil das unidades

→ Reatores Anaeróbicos

- Impermeabilização do Reator 1;
- Instalação das tampas de fibra do Reator 1;
- Regularização das canaletas efluente do Reator 2.

→ Filtros Biológicos

- Reaterro entre o Filtro 1 e 2.

→ Estação Elevatória Final

- Desforma da base da talha da unidade.

→ Estação Elevatória de Recirculação

- Concretagem e desforma da base da talha da unidade;
- Armadura e forma das bancadas das bombas do barrilete da unidade.

→ Urbanização

- Chumbamento do poste da Guarita;
- Chumbamento do poste da Administração.

2) Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades

→ Casa de Paineis

- Instalação do para-raio da Casa de Paineis 1.

3) Dados Gerais

- Em média a obra contou com 15 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 às 12:00h e 13:00 às 17:00h, sendo:

- 13 ajudantes;
- 01 pedreiros;
- 01 encarregados;

- Todos operários estavam com EPI's.
- No período não ocorreram acidentes de trabalho.
- Não foram constatadas chuvas no período.



Descrição: Instalação das tampas de fibra do Reator 1

Foto: 01

Data: 22/08/14

Arquivo: 95835




Descrição: Regularização das canaletas efluente do Reator 2.

Foto: 02

Data: 22/08/14

Arquivo: 100332

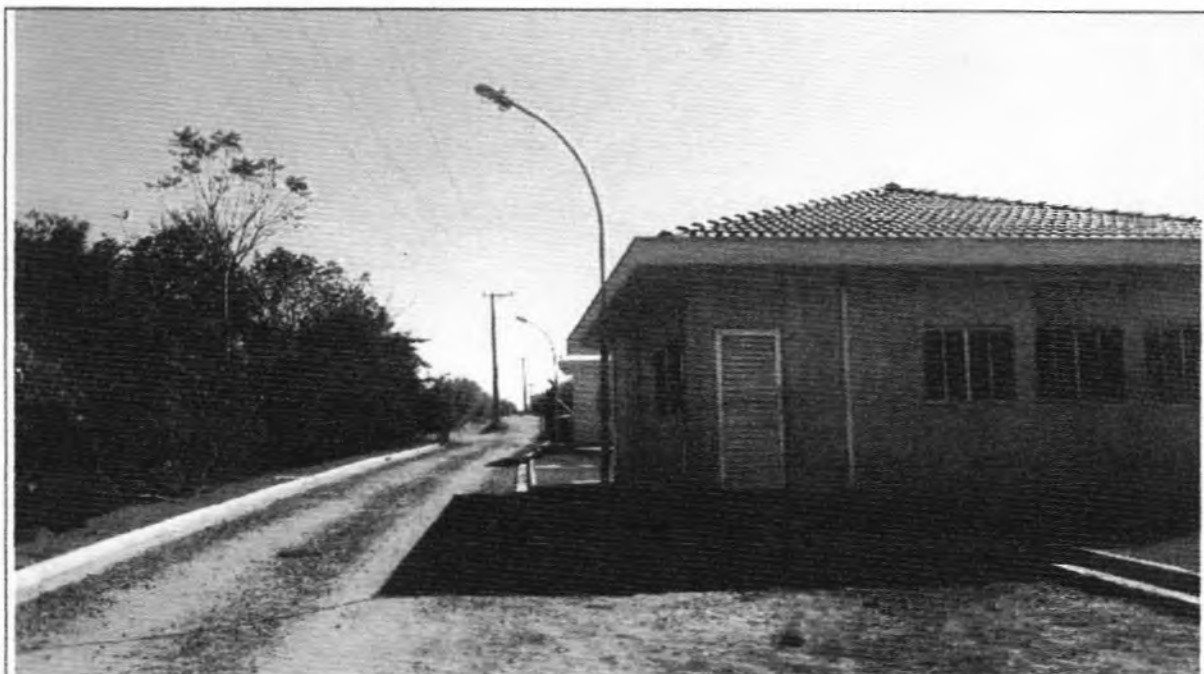

Descrição: Chumbamento do poste da Administração

Foto: 03

Data: 22/08/14

Arquivo: 100458




Descrição: Chumbamento do poste da Guarita

Foto: 04

Data: 22/08/14

Arquivo: 100531

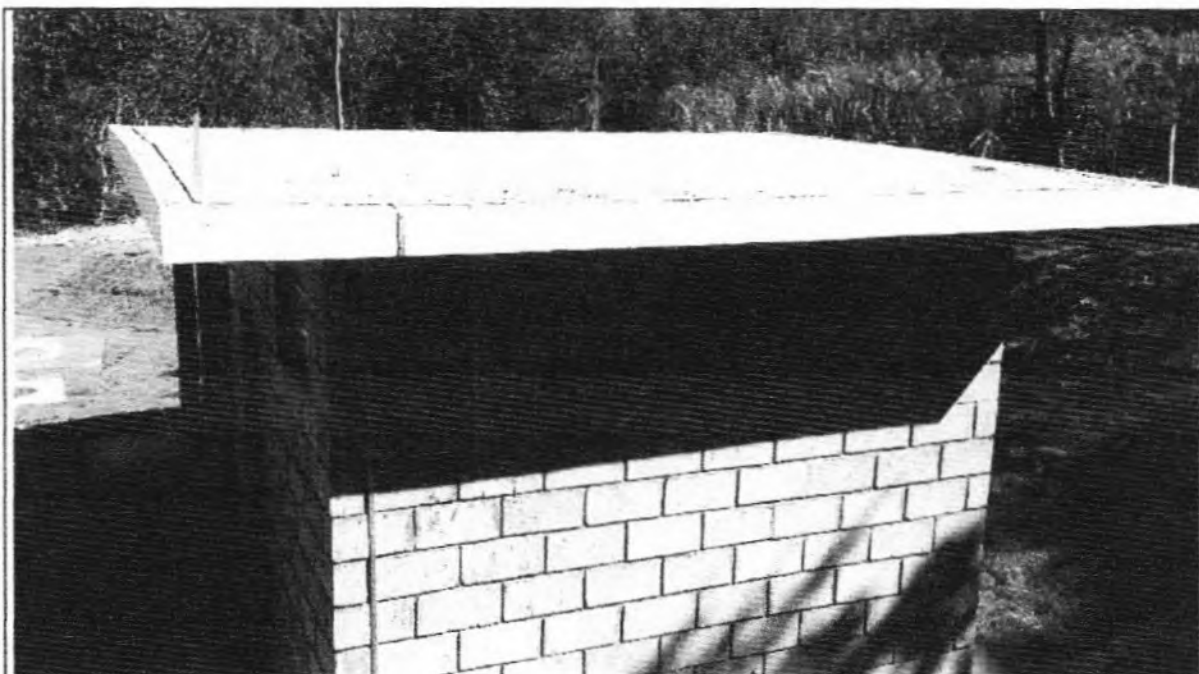


Descrição: Instalação do para raio da Casa de Painei 1

Foto: 05

Data: 22/08/14

Arquivo: 100708

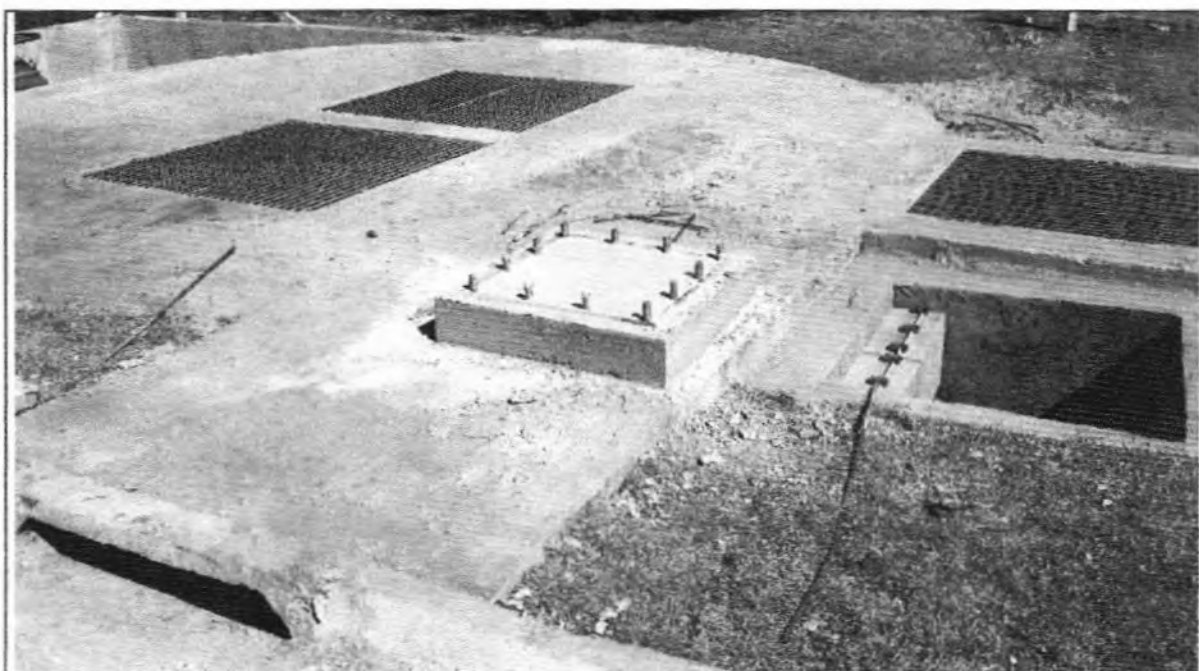

Descrição: Desforma da base da talha da EE Final

Foto: 06

Data: 22/08/14

Arquivo: 100819




Descrição: Reaterro entre o Filtro 1 e 2.

Foto: 07

Data: 22/08/14

Arquivo: 101128

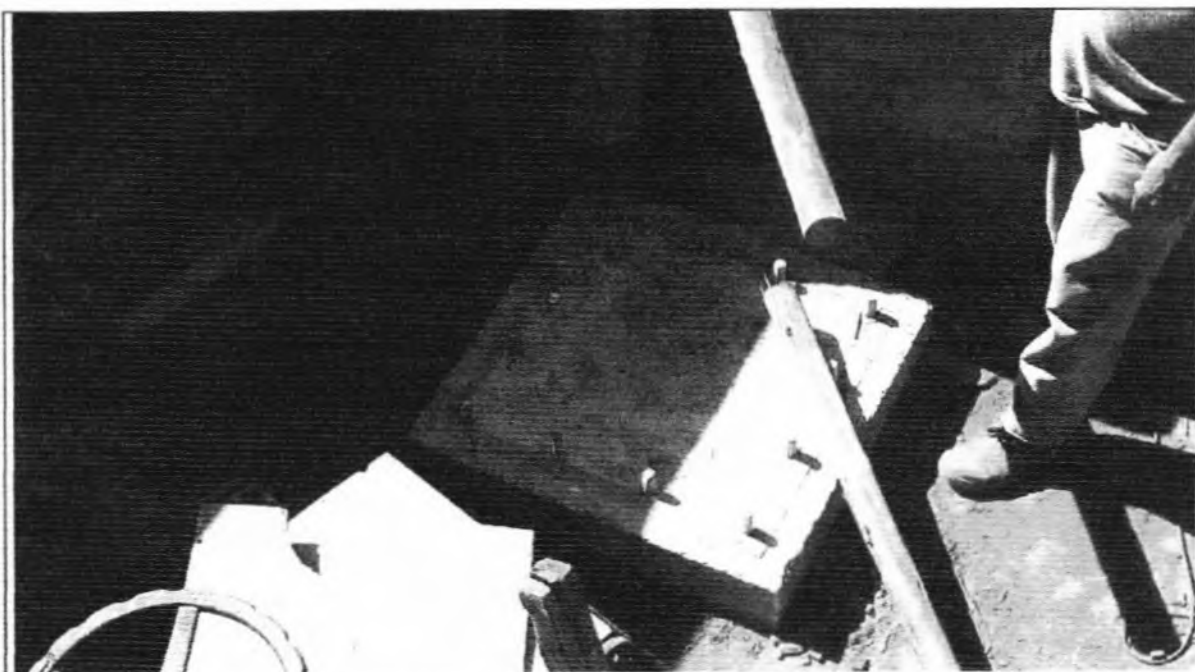


Descrição: Concretagem e desforma da base da talha EE Recirculação.

Foto: 08

Data: 22/08/14

Arquivo: 101431

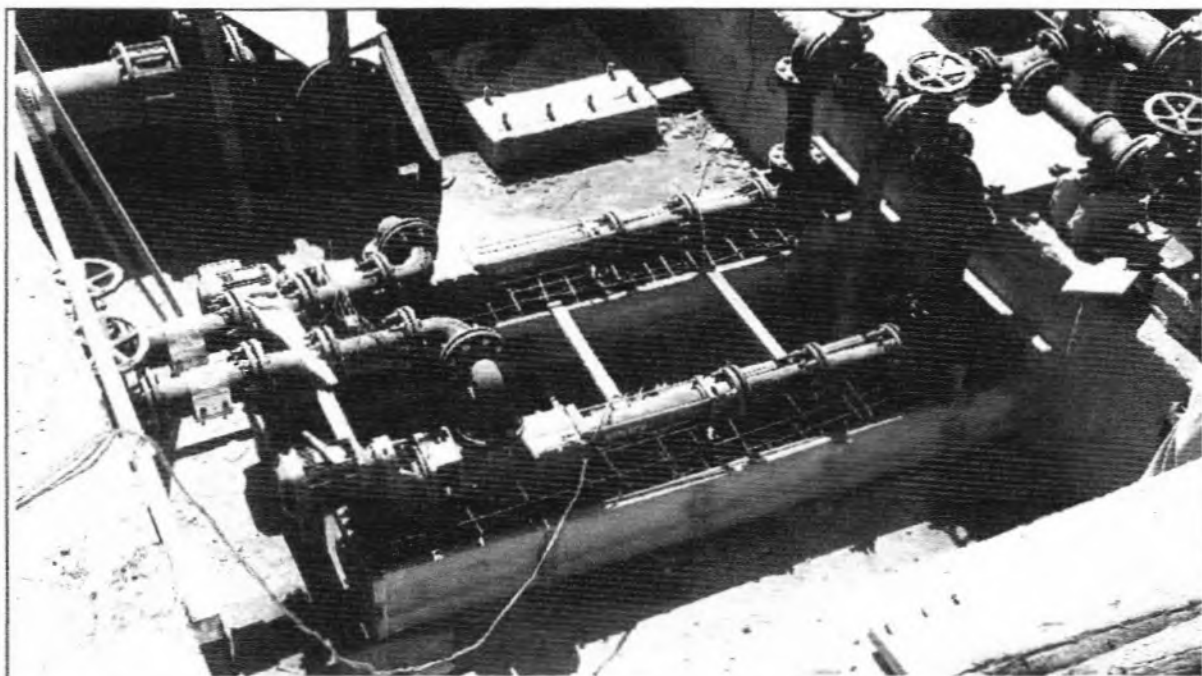

Descrição: Armadura e forma das bancadas das bombas do barrilete da EE de Recirculação

Foto: 09

Data: 22/08/14

Arquivo: 101805



Protocolo 861 / 2014

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA

05/09/2014

12:29:09

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 25 A 29/08/2014



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

CONTRATO Nº 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS /
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL – 25 A 29/08/2014

N/REF.: GE-174-RE-AS-030-R0
TAQUARITINGA -SP
AGOSTO/2014



PERTÉCNICA

APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato nº 045/2013, firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda.

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento físico das obras na semana de 25 a 29/08/2014.

ÍNDICE

- 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO**
- 2 – ATIVIDADES NA SEMANA DE 25 A 29/08/2014**
- 3 – DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO**

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

- **Agente Promotor:** Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE
- **Agente Financeiro e Técnico:** Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE
- **Objeto:** Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede)
- **Recursos:**
 - . Fonte: Programa Água Limpa;
 - . Convênio nº 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011;
 - . Valor: R\$ 14.491.618,13 – Exercício 2011;
 - . Prazo: 24 meses
- **Agente Executor:** Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP
- **Contrato das obras e serviços:**
 - . Processo licitatório: Concorrência nº 011/12;
 - . Contrato nº 194/12, de 11/12/2.012;
 - . Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.;
 - . Valor: R\$ 11.431.936,13;
 - . Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço;
 - . Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 16/06/2.014;
 - . Aditivo contratual de valor: R\$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013;
 - . Valor contratual aditivado: R\$ 14.249.469,14.

2 – ATIVIDADES NA SEMANA DE 25 A 29/08/2014

2 – ATIVIDADES NA SEMANA 25 A 29/08/2014

No período de 25 a 29/08/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de:

1) Acompanhamento da construção civil das unidades

→ Reatores Anaeróbicos

- Instalação das tampas de fibra do Reator 1;
- Regularização das vigas inferiores do Reator 2;
- Regularização das canaletas de efluente do Reator 2;
- Instalação dos vertedouros no distribuidor central do Reator 2.

→ Urbanização

- Instalação dos fios da rede elétrica existente ao poste central da ETE.

2) Acompanhamento da hidráulica mecânica das unidades

→ Caixa de Manobra

- Instalação das válvulas guilhotinas da Caixa de Manobra 1.

3) Dados Gerais


- Em média a obra contou com 20 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 às 12:00h e 13:00 às 17:00h, sendo:

- 16 ajudantes;
- 02 pedreiros;
- 02 encarregados;

- Todos operários estavam com EPI's.

- No período ocorreu uma acidente fatal nos serviços, com o operário Eliandro Almeida Barbosa, funcionário da KMG, que veio a óbito, após queda para dentro do Reator 2.

- Não foram constatadas chuvas no período.

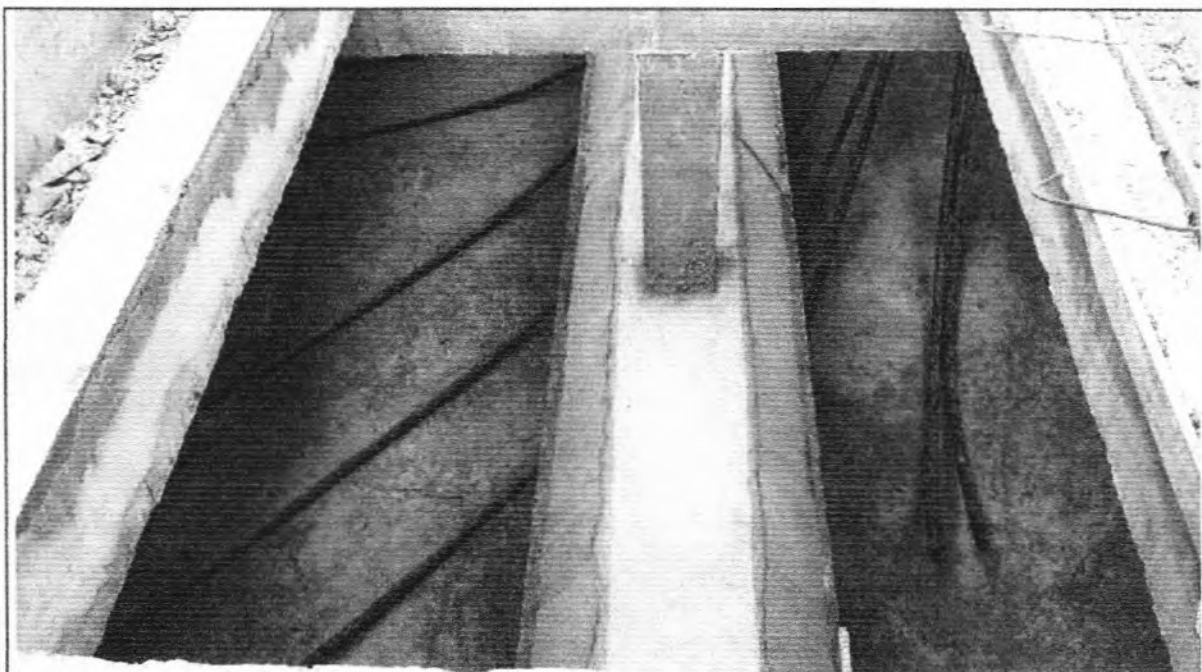

Descrição: Regularização da vigas inferiores do Reator 2

Foto: 03

Data: 27/08/14

Arquivo: 131148




Descrição: Regularização das canaletas de efluente do Reator 2

Foto: 04

Data: 27/08/14

Arquivo: 131237

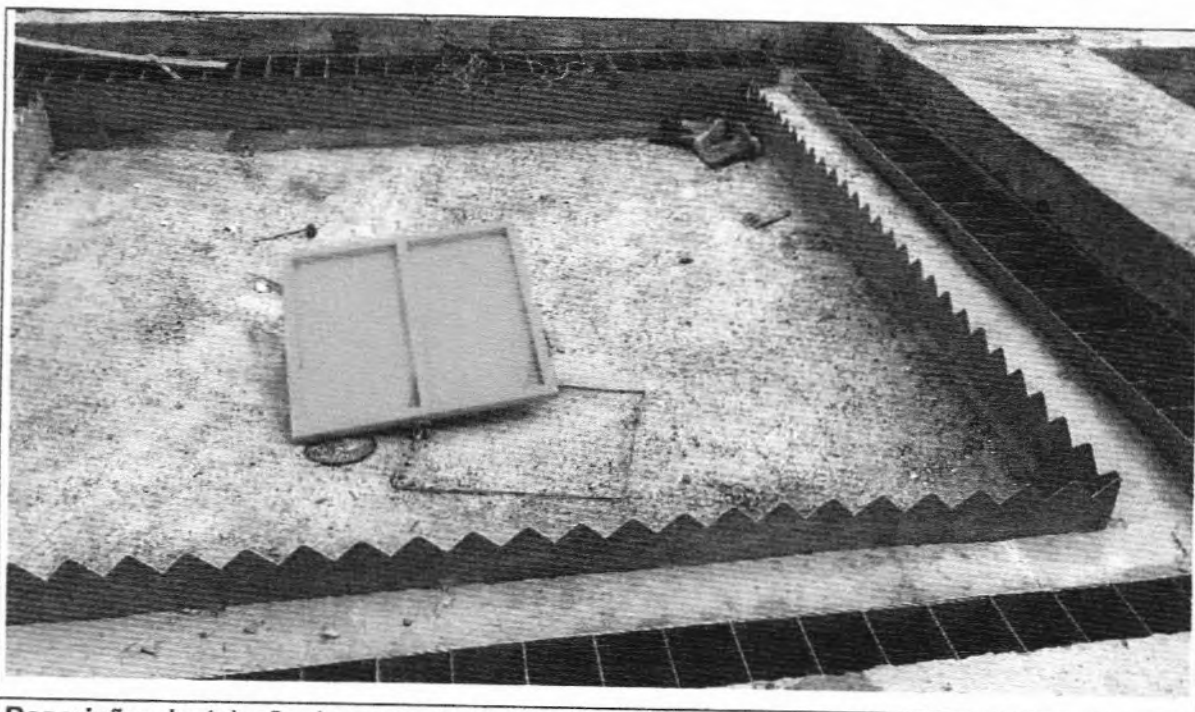

Descrição: Instalação dos vertedouros no distribuidor central do Reator 2

Foto: 05

Data: 27/08/14

Arquivo: 131409



Descrição: Instalação das válvulas guilhotina da Caixa de Manobra 1.

Foto: 06

Data: 27/08/14

Arquivo: 132043



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

**CONTRATO Nº 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS /
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE**

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – PERÍODO 01 A 31/08/2.014

**N/REF.: GE-174-RE-MA-008-R0
TAQUARITINGA -SP
AGOSTO/2014**



PERTÉCNICA

APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir o "Relatório Mensal das Atividades – Período 01 a 31/08/2.014" desenvolvidas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato nº 045/2013, firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda.

ÍNDICE

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

2 - OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS

3 - AS OBRAS CONTRATADAS

4 - ATIVIDADES NO PERÍODO 01 A 31/07/2014

5 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO

6 - DESENHOS

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

- **Agente Promotor:** Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE

- **Agente Financeiro e Técnico:** Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE

- **Objeto:** Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede)

- **Recursos:**

- . Fonte: Programa Água Limpa;
- . Convênio nº 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011;
- . Valor: R\$ 14.491.618,13 – Exercício 2011;
- . Prazo: 24 meses

- **Agente Executor:** Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP

- **Contrato das obras e serviços:**

- . Processo licitatório: Concorrência nº 011/12;
- . Contrato nº 194/12, de 11/12/2.012;
- . Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.;
- . Valor: R\$ 11.431.936,13;
- . Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço;
- . Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 18/06/2.014;
- . Aditivo contratual de valor (Termo Aditivo 001/2013): R\$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013;
- . Valor contratual aditivado: R\$ 14.249.469,14;
- . Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 001/2014): em 11/06/2.014, prorrogado em 90 (noventa) dias a contar de 18/06/2.014.

2 - OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS

2 – OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS

O escopo dos trabalhos é a prestação de serviços de Gerenciamento das Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga através da Concorrência nº 011/2012, que resultou no Contrato nº 194/12, firmado com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda..

Os serviços do Gerenciamento deverão fornecer suporte técnico e operacional ao Serviço Municipal de Água e Esgoto de Taquaritinga – SAAET, na gestão da implantação do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários, de modo a assegurar que os projetos e obras sejam executados de acordo com o cronograma físico-financeiro contratados pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga, com a qualidade necessária definida nos projetos, memoriais descritivos e pelas normas brasileiras, gerenciando de maneira confiável e eficaz as seguintes frentes de trabalho:

- Fiscalização e acompanhamento das obras e adequações realizadas pelas empreiteiras para atendimento a alterações definidas por órgãos públicos ou equivalentes, tais como concessionárias de serviços públicos, dentre outros;
- Elaboração de elementos técnicos para processos de contratação de projetos, obras e serviços;
- Acompanhamento da elaboração e compatibilização de projetos complementares;
- Acompanhamento dos cronogramas das obras das edificações;
- Acompanhamento dos cronogramas das obras de infraestrutura e compatibilização dos mesmos com o cronograma geral do empreendimento;
- Acompanhamento da execução de serviços relativos à infraestrutura, envolvendo serviços preliminares, terraplenagem, micro e macro drenagem, contenções, redes de abastecimento de água, redes coletoras de esgoto, redes de energia elétrica, pavimentação, obras de arte em concreto, urbanização e paisagismo que se aplicarem a implantação em foco;
- Registro e organização do arquivo "as-built" como referência essencial para realização de manutenções e eventuais reparos após a implantação do empreendimento;
- Realização de consultoria técnica especializada para solução de problemas específicos relacionados ao projeto, à construção ou ao licenciamento/regularização das obras;
- Realização de atividades de Pré-Operação (Comissionamento):
- Todos os demais serviços que venham a ser identificados como necessários para a viabilização do empreendimento e para atendimento das funcionalidades desejadas e estabelecidas pelo SAAET.

3 - AS OBRAS CONTRATADAS

3 - AS OBRAS CONTRATADAS

As obras foram licitadas e contratadas pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda., de acordo o Projeto Básico das Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga, elaborado pela empresa Engecorps – Corpo de Engenheiros Consultores Ltda., em Dezembro/2.009, contratada pelo Departamento de Águas Energia Elétrica – DAEE, para a execução de Projetos de Sistemas de Esgoto Sanitário, dentro do Projeto Água Limpa, Lote 1.

Ao longo da execução das obras, o Projeto Básico Engecorps – 12/2.009 foi revisado pela KMG, em função, entre outras justificativas, para atender as demandas projetadas para a população urbana de Taquaritinga, evoluídas a partir dos dados populacionais atualizados disponibilizados pelo Censo IBGE/2.010. A KMG subcontratou a revisão dos projetos com a empresa Sistemas Ambientais Engenharia, Consultoria e saneamento Ltda.

O quadro 1 a seguir discrimina as Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas e contratadas com KMG, bem como, valores aditados ao contrato em função da revisão do Projeto Básico.

- Quadro 1 - Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS (R\$)	
		ORIGINAL	COM ADITIVO
1	EMISSÁRIO BRUTO EMB01	32.367,61	24.883,38
2	EEE FINAL	732.407,51	870.040,40
3	LINHA DE RECALQUE	138.249,42	101.659,03
4	MOVIMENTO DE TERRA ETE	329.817,66	329.817,66
5	GUARITA	38.884,13	39.272,44
6	ADMINISTRAÇÃO	167.384,94	160.426,38
7	GRADEAMENTO E DESARENAÇÃO	586.074,91	557.236,70
8	REATORES ANAERÓBICOS 1 E 2	1.842.451,97	3.164.878,20
9	FILTROS BIOLÓGICOS 1 E 2	1.738.586,37	2.527.587,55
10	DECANTADORES SECUNDÁRIOS 1 E 2	1.066.535,54	1.704.851,46
11	EE DE RECIRCULAÇÃO	485.284,77	612.831,78
12	CÂMARA DE CONTATO	382.806,39	382.806,39
13	CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO	306.118,28	303.715,24
14	EE DE LODO ADENSADO	70.946,26	74.582,26
15	ADENSADOR DE LODO	154.552,19	0,00
16	TANQUES DE HIPOCLORITO	151.058,56	151.058,56
17	EFLUENTE FINAL	415.844,16	184.121,55
18	INTERLIGAÇÕES DO SISTEMA	582.679,84	737.470,25
19	SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	44.414,70	47.836,89
20	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	257.978,71	207.325,28
21	CAIXAS DE FLUXO 1, 2 E 3	393.197,26	417.382,13
22	URBANIZAÇÃO DA ETE	834.620,53	723.344,73
23	SERVIÇO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	574.674,42	574.674,42
24	SUPERVISÃO E CONTROLE	105.000,00	105.000,00
25	PROJETO	0,00	60.000,00
26	SISTEMA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA	0,00	186.666,46
	VALOR TOTAL	11.431.936,13	14.249.469,14

4 – ATIVIDADES NO PERÍODO 01 A 31/08/2014

4.1 - Equipe Técnica

O quadro a seguir, indica a relação nominal e qualificação dos profissionais de nível superior componentes da equipe técnica alocada para o desenvolvimento das atividades da Gerenciadora no período de 01 a 31/08/14:

NOME	FORMAÇÃO	CATEGORIA PROFISSIONAL	EXPERIÊNCIA (ANOS)	QUALIFICAÇÃO
Francisco José Justo	Eng ^a Sanitária	Eng ^o Senior	30	Responsabilidade técnica do contrato e do gerenciamento das obras
Francisco M. Raposo	Eng ^a Civil	Eng ^o Senior	36	Coordenação do gerenciamento de obras
Maurício Lopes Brandão	Eng ^a Civil	Eng ^o Senior	21	Consultoria e gerenciamento de obras de Saneamento Ambiental
Guilherme Georgetti Fernandes	Eng ^a Ambiental	Eng ^a Júnior	03	Gerenciamento de obras de Saneamento Ambiental

4.2 - Atividades desenvolvidas pela Gerenciadora no período de 01 a 31/08/2014:

Embora a empreiteira KMG tenha protocolado junto a P.M.Taquaritinga (Protocolo nº 0000006002/2014) o ofício nº C.KMG-90/2014, datado de 25/07/2014, informando a paralisação imediata dos serviços, por não receber resposta ao ofício nº C.KMG-88/2014, datado de 04/06/2014 e por não recebimento dos valores de reajustes do contrato, as obras foram continuadas no período, porém, com drástica redução do número de operários.

4.2.1 - Acompanhamento da construção civil das unidades

→ Reatores Anaeróbicos

- Chumbamento dos vertedouros das canaletas de saída de efluente do Reator 1;
- Limpeza da área interna do Reator 1;
- Impermeabilização do Reator 1;
- Instalação das tampas de fibra do Reator 1;
- Regularização das canaletas efluente do Reator 2;
- Regularização da vigas inferiores do Reator 2;
- Instalação dos vertedouros no distribuidor central do Reator 2.

→ Filtros Biológicos

- Reaterro entre o Filtro 1 e 2.

→ Casa Desidratação de Lodo

- Regularização do piso da escada de acesso ao andar superior da unidade.

→ Estação Elevatória Final

- Armadura e forma da base da talha;
- Concretagem da base da talha.

→ Queimador de Gás

- Armadura e forma da base dos queimadores de gás;

- Concretagem da base dos queimadores de gás.

→ Estação Elevatória Final

- Desforma da base da talha da unidade.

→ Estação Elevatória de Recirculação

- Concretagem e desforma da base da talha da unidade;

- Armadura e forma das bancadas das bombas do barrilete da unidade.

4.2.2 - Acompanhamento da execução hidráulica das unidades.

→ Caixa de Manobra

- Instalação das válvulas guilhotinas da Caixa de Manobra 1.

4.2.3 - Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades

→ Casa de Paineis

- Término da instalação do painel de comando da Casa de Paineis 3;

- Instalação do para-raio da Casa de Paineis 3;

- Instalação da luminária da Casa de Paineis 3.

4.2.4 - Acompanhamento da urbanização da ETE

→ Urbanização

- Chumbamento do poste da Guarita;

- Chumbamento do poste da Administração;

- Instalação dos fios da rede elétrica existente ao poste central da ETE.

4.2.5 - Dados gerais

- Em média a obra contou com 11 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 às 12:00h e 13:00 às 17:00h, constando:

- 04 ajudantes;
- 02 pedreiros;
- 02 encarregados;
- 02 eletricitas.
- 01 almoxarife.

- Os operários cumpriam jornada de trabalho em 2 turnos, das 7:00 às 12:00h e 13:00 às 17:00h.

- Os operários estavam com EPI's.

- No período ocorreu um acidente fatal nos serviços, com o operário Eliandro Almeida Barbosa, funcionário da KMG, que veio a óbito, após queda para dentro do Reator 2.

- Não foram constatadas chuvas no período.


4.2.6 – Acompanhamento Físico-Financeiro das Obras e Serviços

Não foi realizada medição das obras e serviços no período entre 01 e 31/08/2014.

A planilha à frente, indica a posição física e financeira acumulada das Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), até a Medição nº 19, realizada no período imediatamente anterior (01 a 30/06/2.014).



PREÇOS (R\$)						
RATO	ACUMUL. ANTERIOR	REALIZ. NO PERÍODO	TOTAL	REALIZ. ANTERIOR (%)	REALIZ. NO PERÍODO (%)	REALIZ. TOTAL (%)
183,38	21,90	19.000,00	19.021,90	0,09%	76,36%	76,44%
140,40	656.558,69	174.692,50	831.251,19	75,46%	20,08%	95,54%
159,03	103.381,67	0,00	103.381,67	101,69%	0,00%	101,69%
117,66	315.042,92	14.775,00	329.817,92	95,52%	4,48%	100,00%
172,44	36.604,52	0,00	36.604,52	93,21%	0,00%	93,21%
126,38	153.816,45	0,00	153.816,45	95,88%	0,00%	95,88%
136,70	392.930,77	123.529,68	516.460,45	70,51%	22,17%	92,68%
178,20	2.893.786,67	91.973,86	2.985.760,53	91,43%	2,91%	94,34%
187,55	2.357.592,08	119.964,76	2.477.556,84	93,27%	4,75%	98,02%
151,46	1.615.824,97	73.844,56	1.689.669,53	94,78%	4,33%	99,11%
131,78	475.083,49	4.384,80	479.468,29	77,52%	0,72%	78,24%
106,39	354.067,10	25.825,05	379.892,15	92,49%	6,75%	99,24%
115,24	154.230,31	55.616,49	209.846,80	50,78%	18,31%	69,09%
182,26	52.659,19	0,00	52.659,19	70,61%	0,00%	70,61%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
158,56	113.724,67	34.173,05	147.897,72	75,29%	22,62%	97,91%
121,55	1.496,93	181.144,62	182.641,55	0,81%	98,38%	99,20%
170,25	361.289,21	373.173,06	734.462,27	48,99%	50,60%	99,59%
136,89	36.219,68	4.551,66	40.771,34	75,71%	9,51%	85,23%
125,28	157.629,14	46.781,91	204.411,05	76,03%	22,56%	98,59%
182,13	351.627,95	22.245,26	373.873,21	84,25%	5,33%	89,58%
144,73	533.179,96	12.817,00	545.996,96	73,71%	1,77%	75,48%
174,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
100,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%	0,00%	100,00%
166,46	181.252,20	2.500,00	183.752,20	97,10%	1,34%	98,44%
169,14	11.358.000,47	1.380.993,26	12.738.993,73	79,71%	9,69%	89,40%

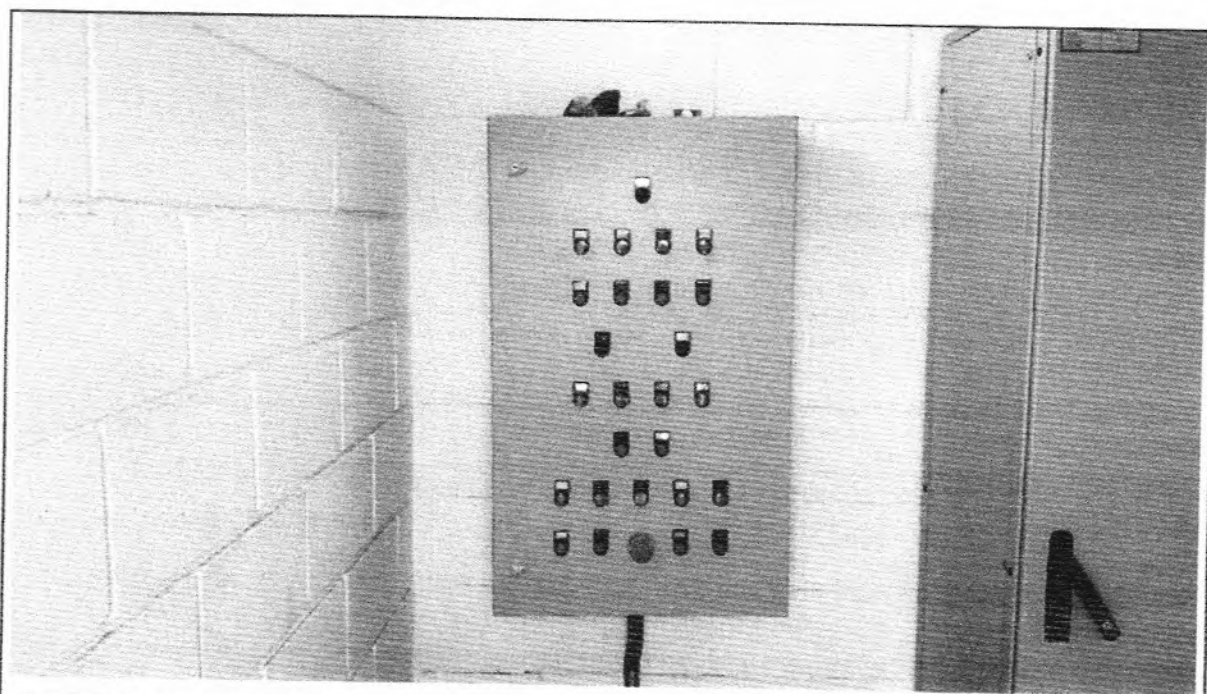


Descrição: Instalação do painel de comando da Casa de Painel 3

Foto: 01

Data: 15/08/14

Arquivo: 92841

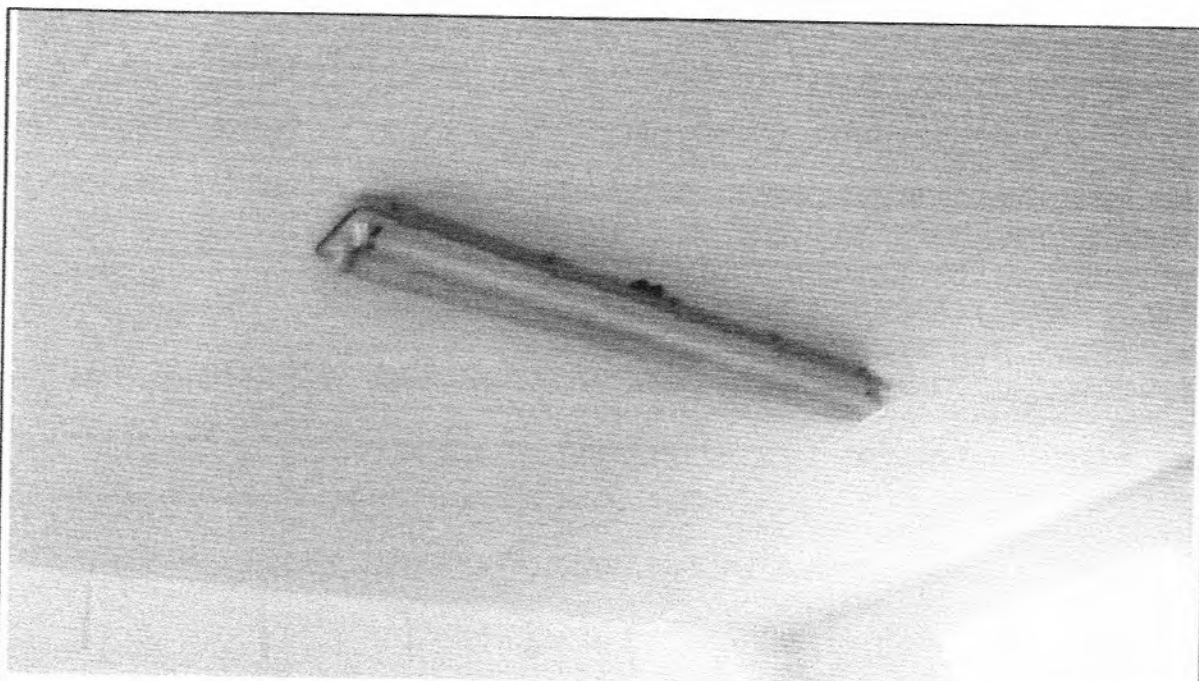


Descrição: Instalação da luminária da Casa de Painel 3.

Foto: 02

Data: 15/08/14

Arquivo: 92845

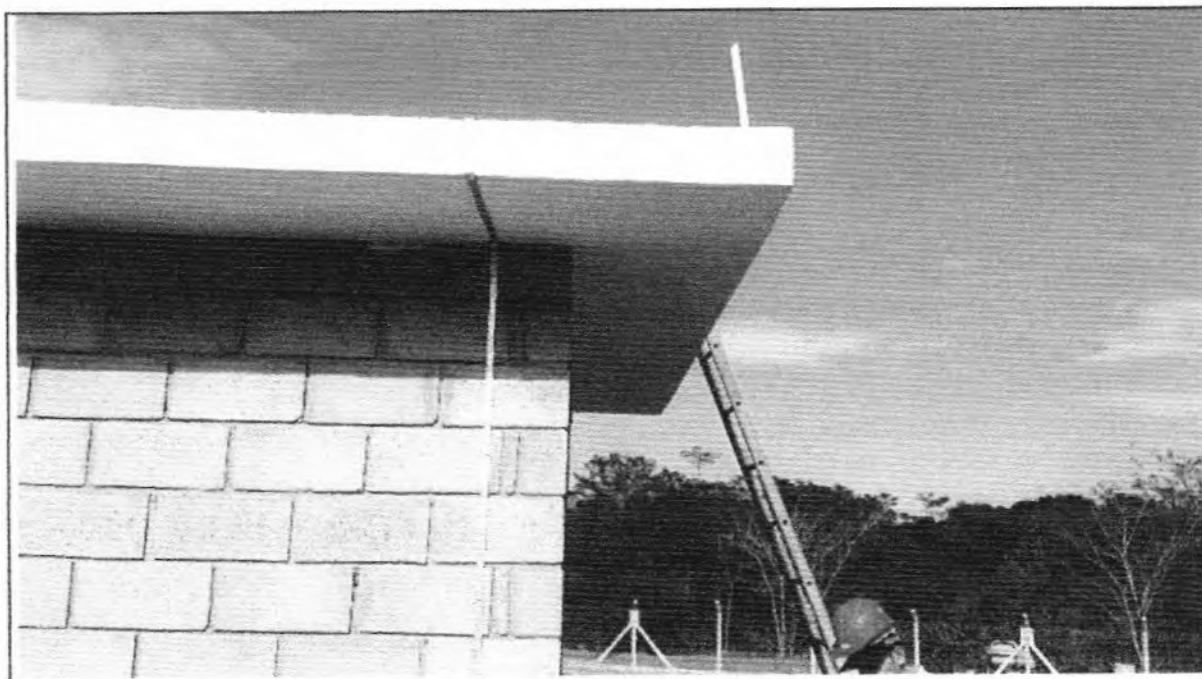


Descrição: Instalação do para raio da Casa de Painel 3

Foto: 03

Data: 15/08/14

Arquivo: 93537

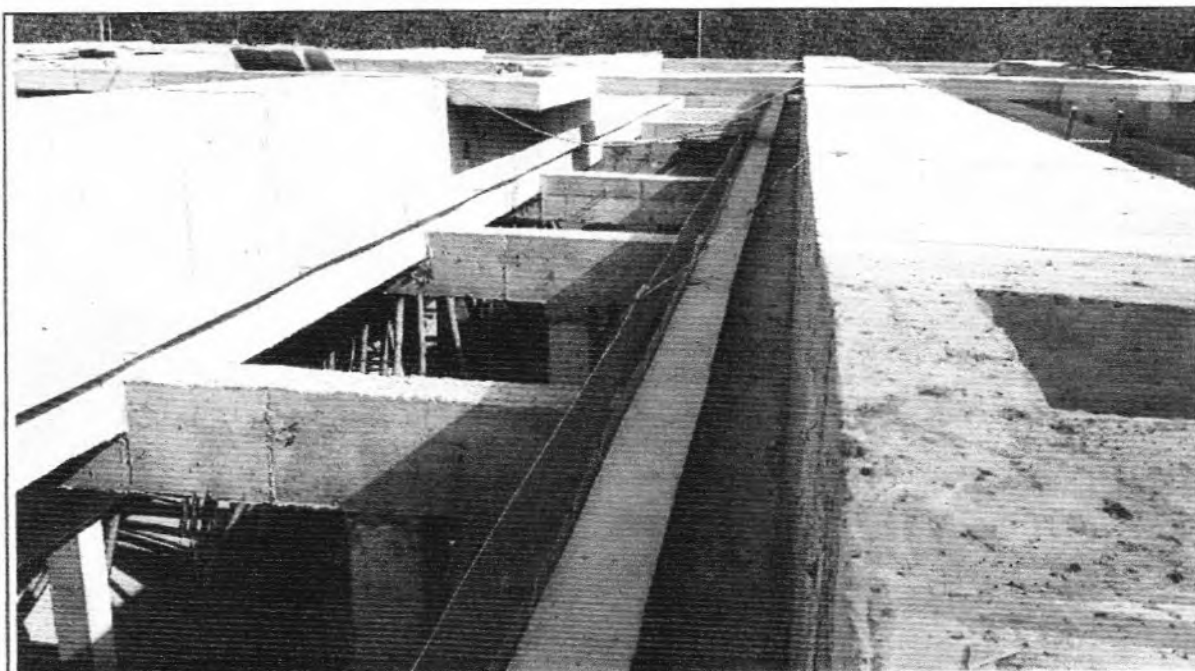


Descrição: Chumbamento dos vertedouros das canaletas de saída de efluente do Reator 1

Foto: 04

Data: 15/08/14

Arquivo: 94647

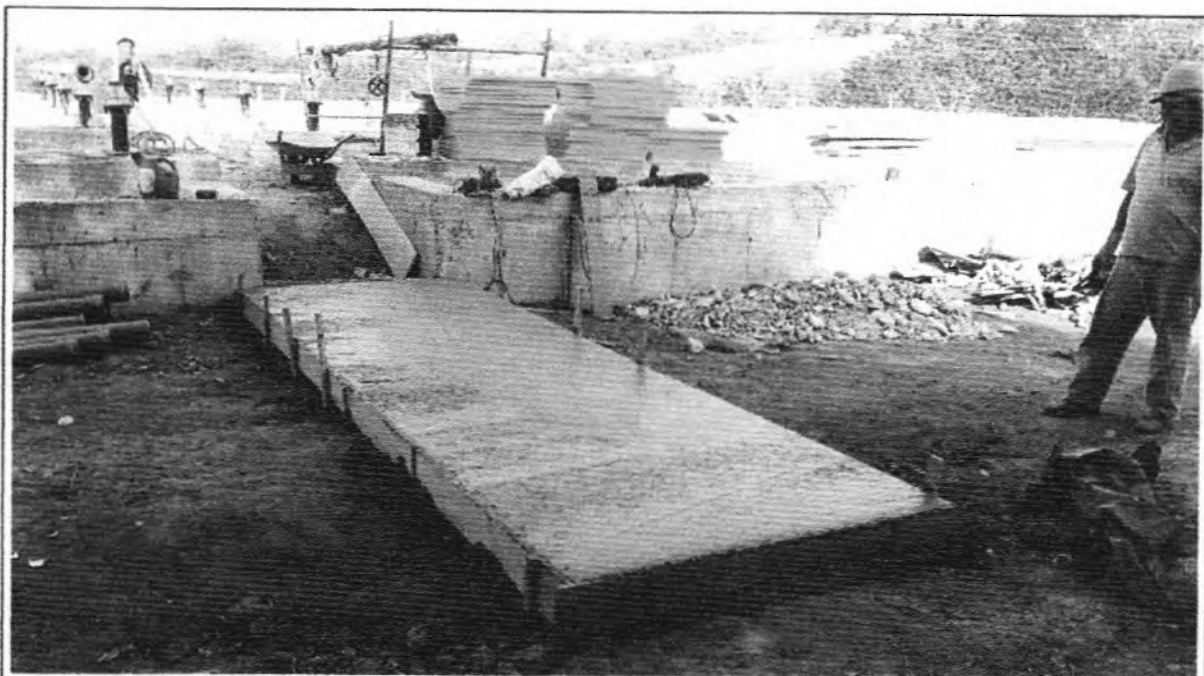


Descrição: Concretagem da base dos queimadores de gás

Foto: 05

Data: 15/08/14

Arquivo: 94719

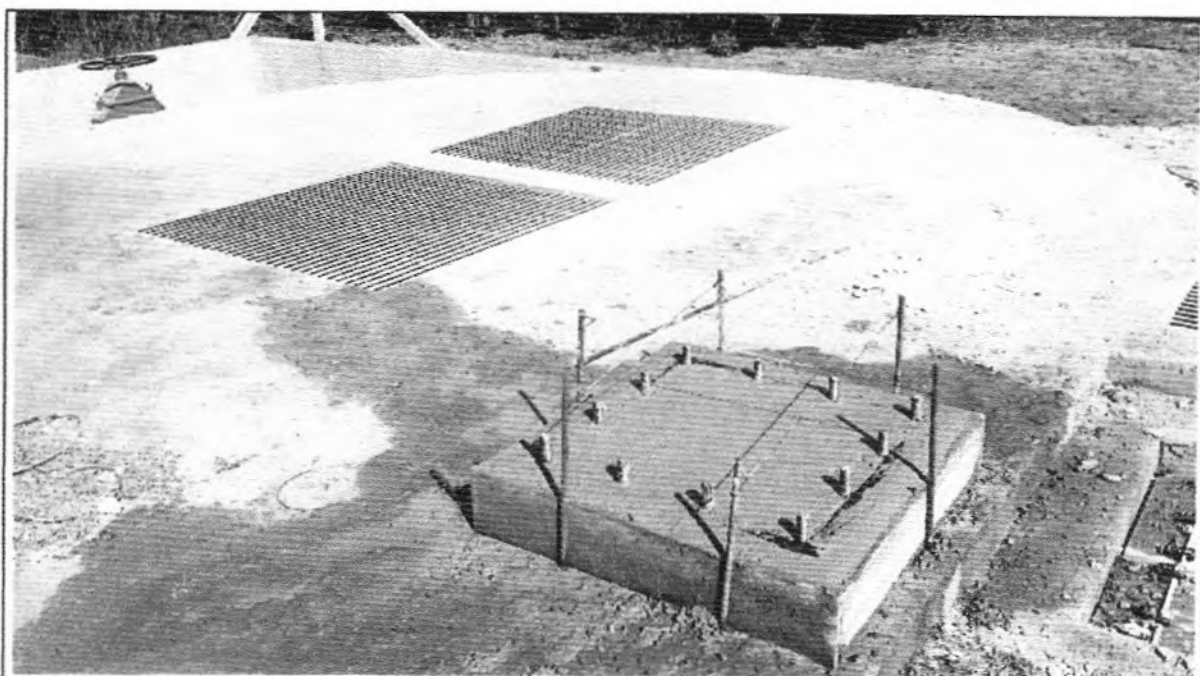

Descrição: Concretagem da base da talha da EE Final

Foto: 06

Data: 15/08/14

Arquivo: 95126



Descrição: Instalação das tampas de fibra do Reator 1

Foto: 07

Data: 22/08/14

Arquivo: 95835



Descrição: Regularização das canaletas efluente do Reator 2.

Foto: 08

Data: 22/08/14

Arquivo: 100332



Descrição: Chumbamento do poste de iluminação viária próximo a Administração

Foto: 09

Data: 22/08/14

Arquivo: 100458




Descrição: Chumbamento do poste de iluminação viária próximo da Guarita

Foto: 10

Data: 22/08/14

Arquivo: 100531

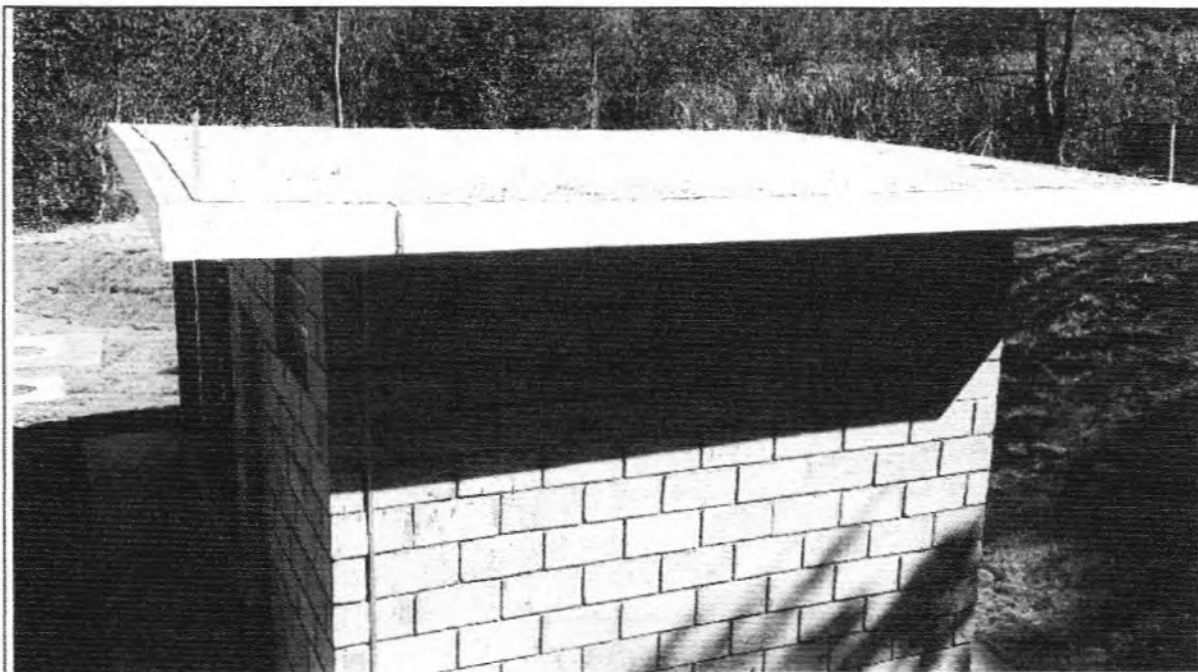

Descrição: Instalação do para raio da Casa de Painel 1

Foto: 11

Data: 22/08/14

Arquivo: 100708




Descrição: Reaterro entre o Filtro 1 e 2.

Foto: 12

Data: 22/08/14

Arquivo: 101128

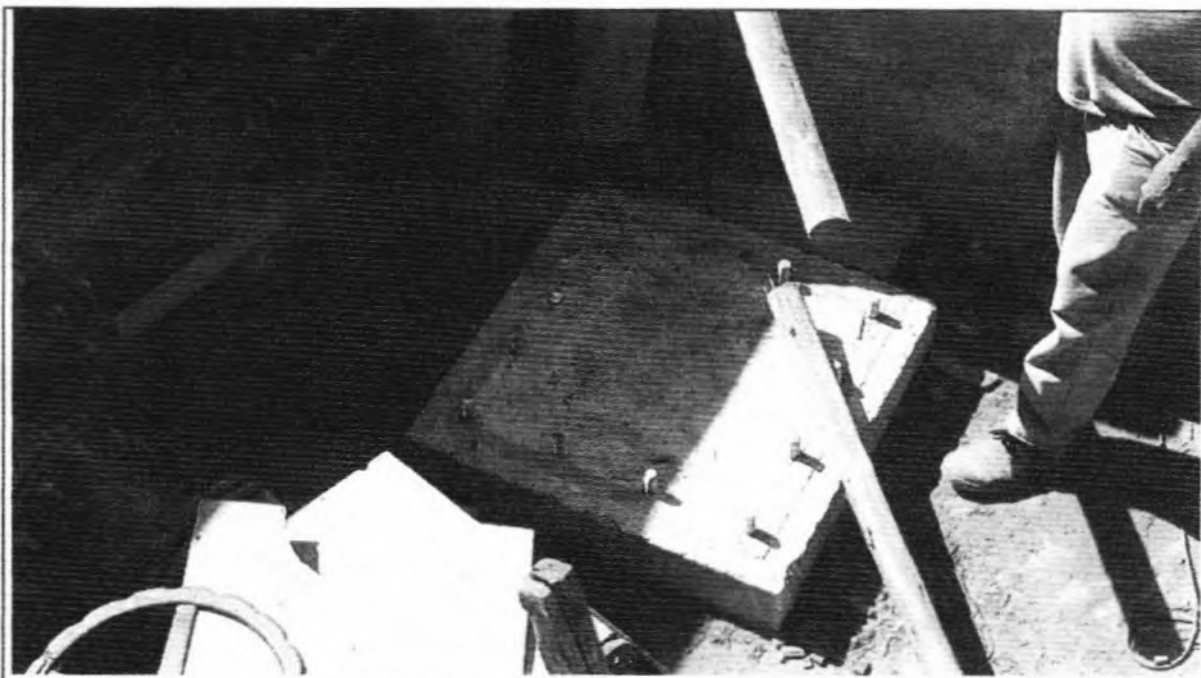


Descrição: Concretagem e desforma da base da talha EE Recirculação.

Foto: 13

Data: 22/08/14

Arquivo: 101431

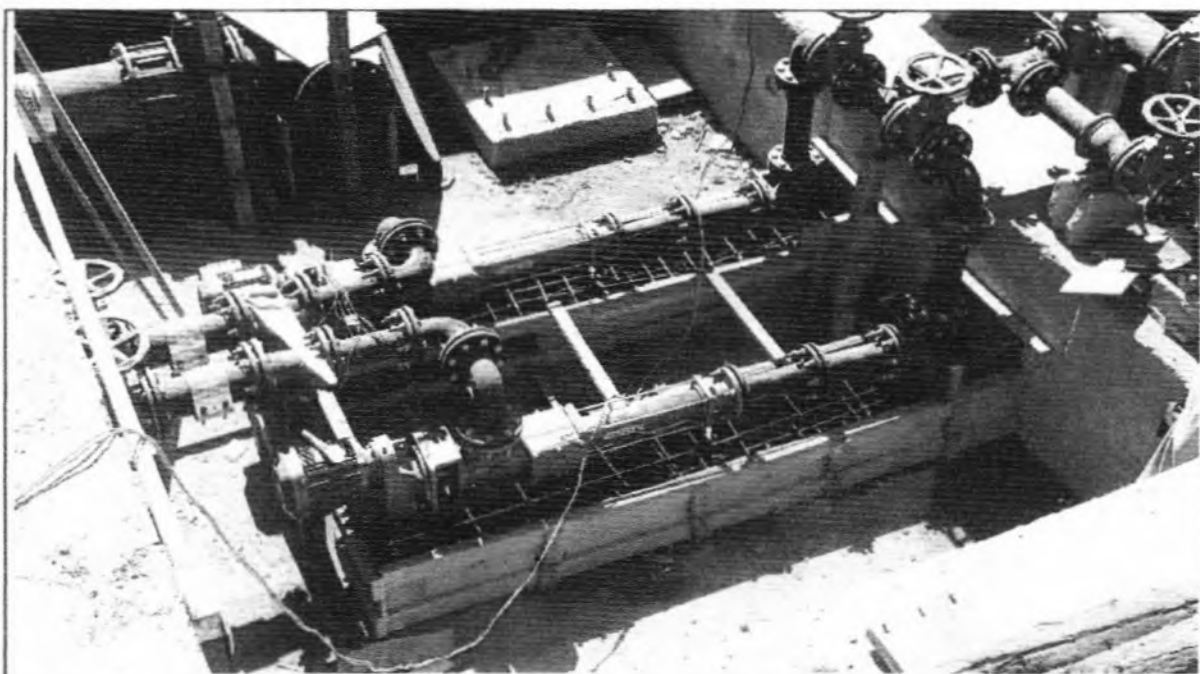


Descrição: Forma e armadura para concretagem das bancadas (blocos de apoios) das bombas da EE de Recirculação

Foto: 14

Data: 22/08/14

Arquivo: 101805

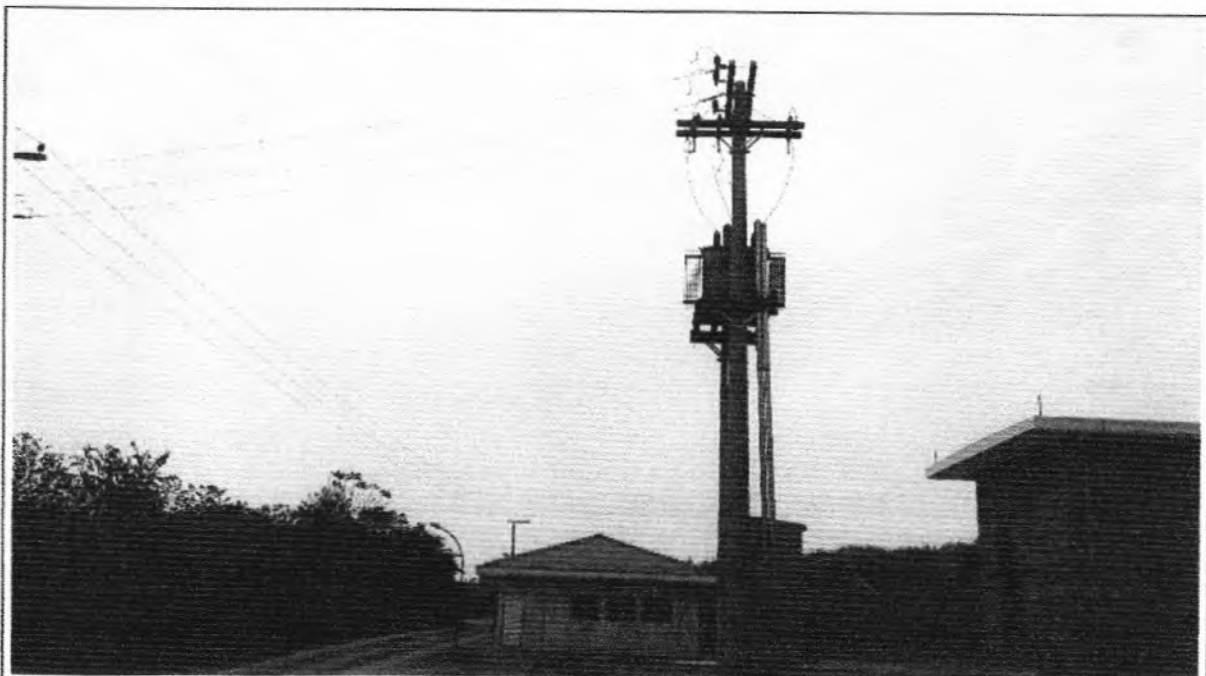


Descrição: Interligação da rede pública de energia elétrica existente ao poste de Entrada e Medição da ETE.

Foto: 15

Data: 27/08/14

Arquivo: 130734

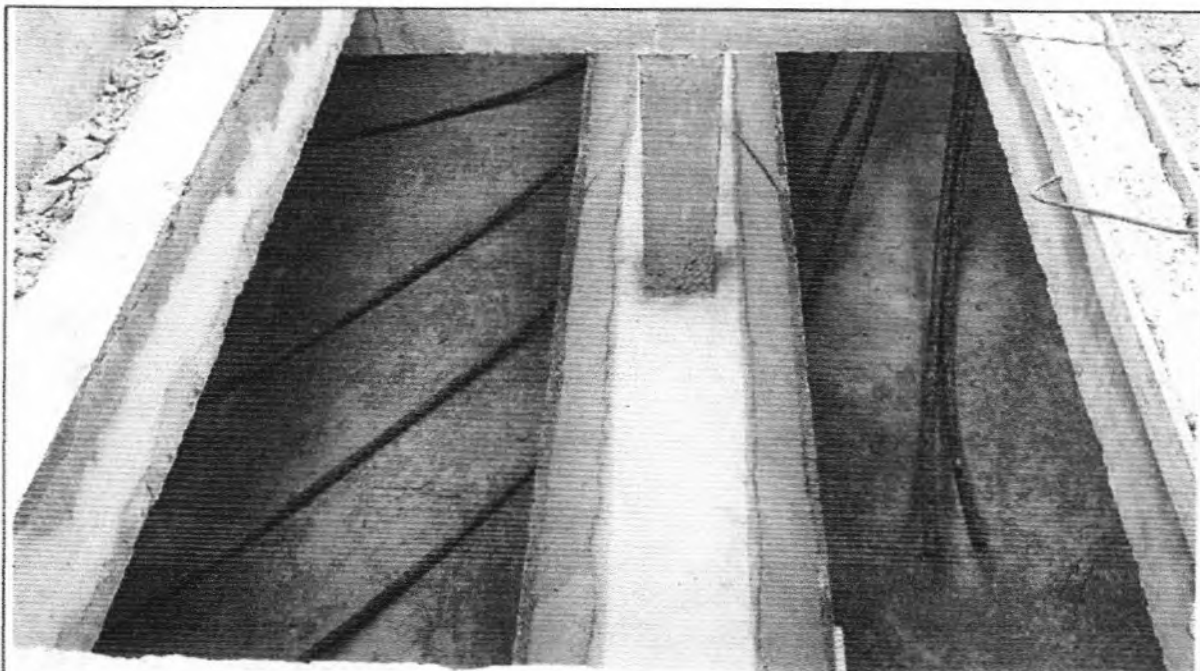

Descrição: Regularização da vigas inferiores do Reator 2

Foto: 16

Data: 27/08/14

Arquivo: 131148



Descrição: Instalação dos vertedouros no distribuidor central do Reator 2

Foto: 17

Data: 27/08/14

Arquivo: 131409



Descrição: Instalação das válvulas guilhotinas da Caixa de Manobra 1.

Foto: 18

Data: 27/08/14


Arquivo: 132043


6 - DESENHOS

“Relação de Desenhos”

Item	Título	Nº Desenho Contratada	Escala	Formato	Rev.
1	DAEE – TAQUARITINGA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – DISPOSIÇÃO GERAL - FI. 01/01	1015-DAE-PEM-TA-A1-E061	1:2.500	A1	0
2	IMPLANTAÇÃO - FI. 01/01	KMG s/nº	1:..500	A1	0


SAAET
1533
TAQUARITINGA SP





SENTIDO DO FLUXO
 PONTO COTADO
 ESTACA DO PROJETO
 FURO DE SONDAGEM



 DAEE	SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA	Nº	
	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA	REV.: 0	FL.: 1/1
	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO PROJETO ÁGUA LIMPA LOTE 1	Nº CONTRATADA 1015-DAE-PEM-TA-A1-E061	
	TAQUARITINGA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DISPOSIÇÃO GERAL	ESCALA: 1:2500	

Protocolo 923 / 2014
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA

12/09/2014

11:17:33

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 01/09/14 A



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

CONTRATO Nº 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS /
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL – 01 A 05/09/2014

N/REF.: GE-174-RE-AS-031-R0
TAQUARITINGA -SP
SETEMBRO/2014



APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato nº 045/2013, firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda.

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento físico das obras na semana de 01 a 05/09/2014.

ÍNDICE

- 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO**
- 2 - ATIVIDADES NA SEMANA DE 01 A 05/09/2014**
- 3 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO**

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

- **Agente Promotor:** Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE

- **Agente Financeiro e Técnico:** Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE

- **Objeto:** Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede)

- **Recursos:**

- . Fonte: Programa Água Limpa;
- . Convênio nº 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011;
- . Valor: R\$ 14.491.618,13 – Exercício 2011;
- . Prazo: 24 meses

- **Agente Executor:** Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP

- **Contrato das obras e serviços:**

- . Processo licitatório: Concorrência nº 011/12;
- . Contrato nº 194/12, de 11/12/2.012;
- . Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.;
- . Valor: R\$ 11.431.936,13;
- . Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço;
- . Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 16/06/2.014;
- . Aditivo contratual de valor: R\$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013;
- . Valor contratual aditivado: R\$ 14.249.469,14.

2 – ATIVIDADES NA SEMANA 01 A 05/09/2014

No período de 01 a 05/09/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de:

1) Acompanhamento da construção civil das unidades

→Urbanização

- Abertura de vala para execução de boca lobo na rua principal da ETE;
- Regularização do talude para plantio de grama;
- Assentamento das tampas (F°F°) da galeria de águas pluviais.

2) Acompanhamento da hidráulica mecânica das unidades

→Estação Elevatória de Recirculação

- Assentamento da tubulação do extravasor da EE de Recirculação (\varnothing 250 – F°F° - L = 4,10m);
- Assentamento da tubulação do dreno da canaleta de contenção da EE de Recirculação (\varnothing 100 – F°F° - L = 7,00 m).

3) Acompanhamento da elétrica das unidades

→Casa de Paineis

- Instalação dos fios da Casa de Paineis 3 aos Decantadores 1 e 2;
- Instalação dos fios da Casa de Paineis 3 a Caixa de Manobra 1;
- Instalação dos fios da Casa de Paineis 3 a EE de Recirculação;
- Instalação dos fios da Casa de Paineis 3 ao Tanque de Hipoclorito;
- Instalação dos fios da Casa de Paineis 3 ao Tanque de Contato.

4) Dados Gerais

- Em média a obra contou com 10 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 13:00 às 17:00h, sendo:

- 04 ajudantes;
- 04 pedreiros;
- 01 encarregados;
- 01 eng. elétrico

- Todos operários estavam com EPI's.

- No período não ocorreram acidentes de trabalho.

- Não foram constatadas chuvas no período.




Descrição: Instalação dos fios da Casa de Painei 3 a EE de Recirculação.

Foto: 01

Data: 05/09/14

Arquivo: 100659

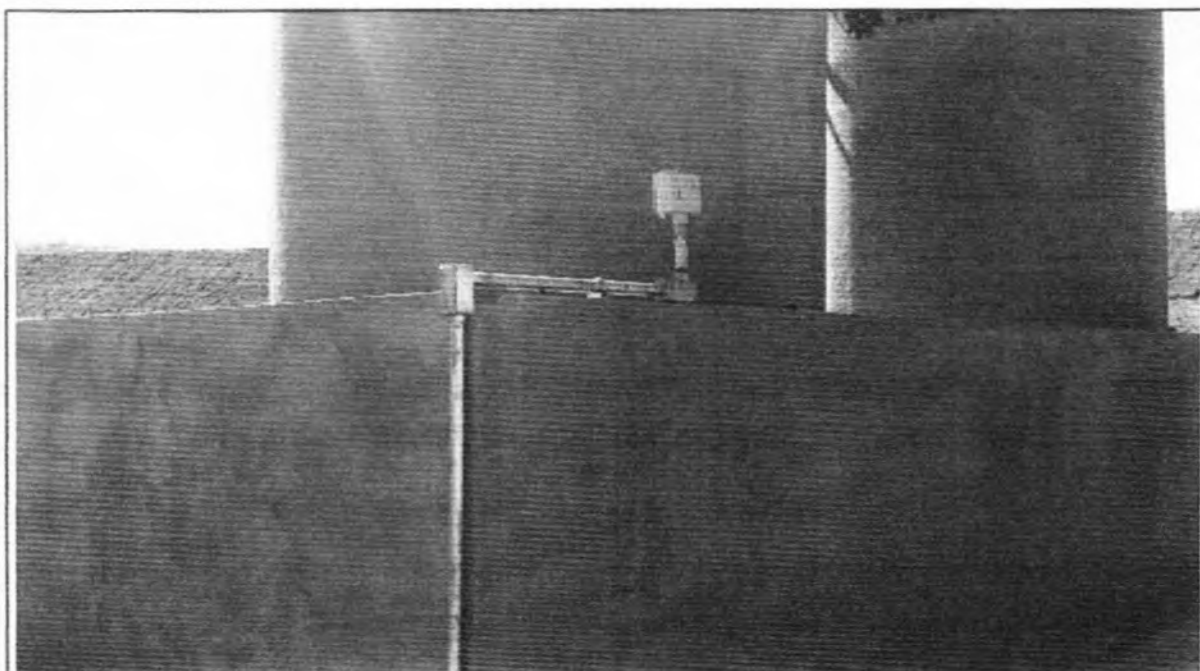


Descrição: Instalação dos fios da Casa de Painei 3 ao Tanque de Hipoclorito.

Foto: 02

Data: 05/09/14

Arquivo: 101014

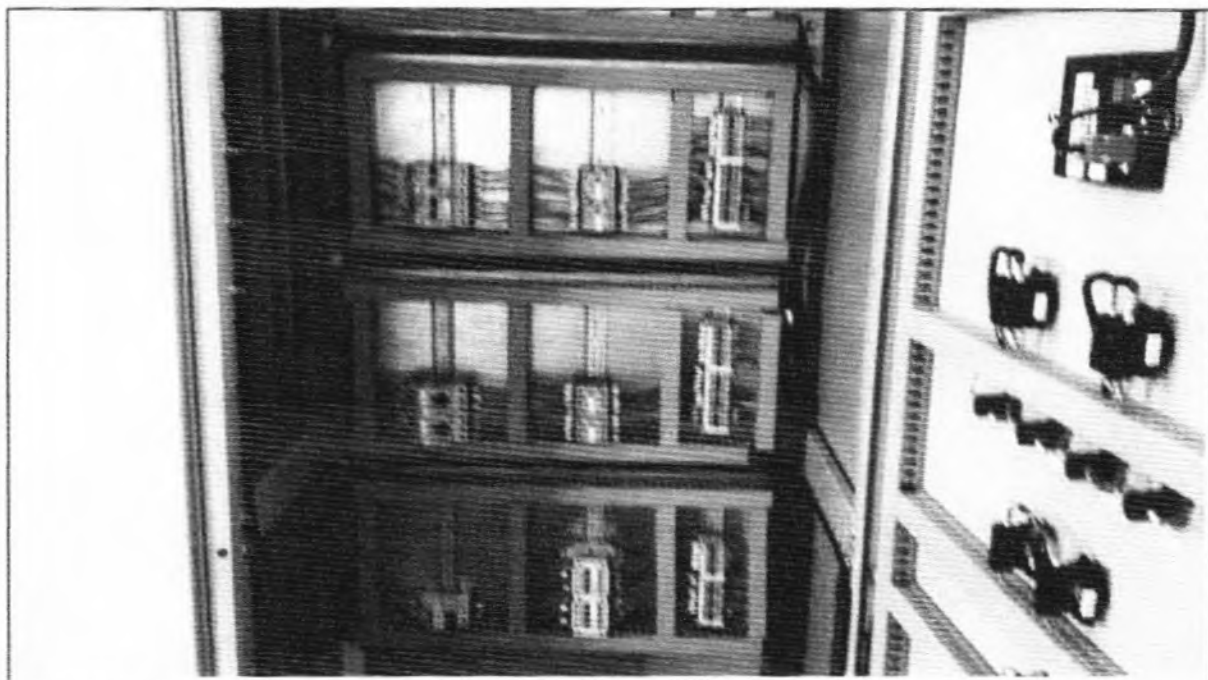

Descrição: Painel de controle da Casa de Painel 3.

Foto: 03

Data: 05/09/14

Arquivo: 101147



Descrição: Regularização do talude para plantio de grama.

Foto: 04

Data: 05/09/14

Arquivo:



Descrição: Abertura de vala para execução de boca lobo na rua principal da ETE

Foto: 05

Data: 05/09/14

Arquivo: 102728




Descrição: Assentamento da tubulação do dreno da canaleta de contenção da EE de Recirculação.

Foto: 06

Data: 05/09/14

Arquivo: 103700

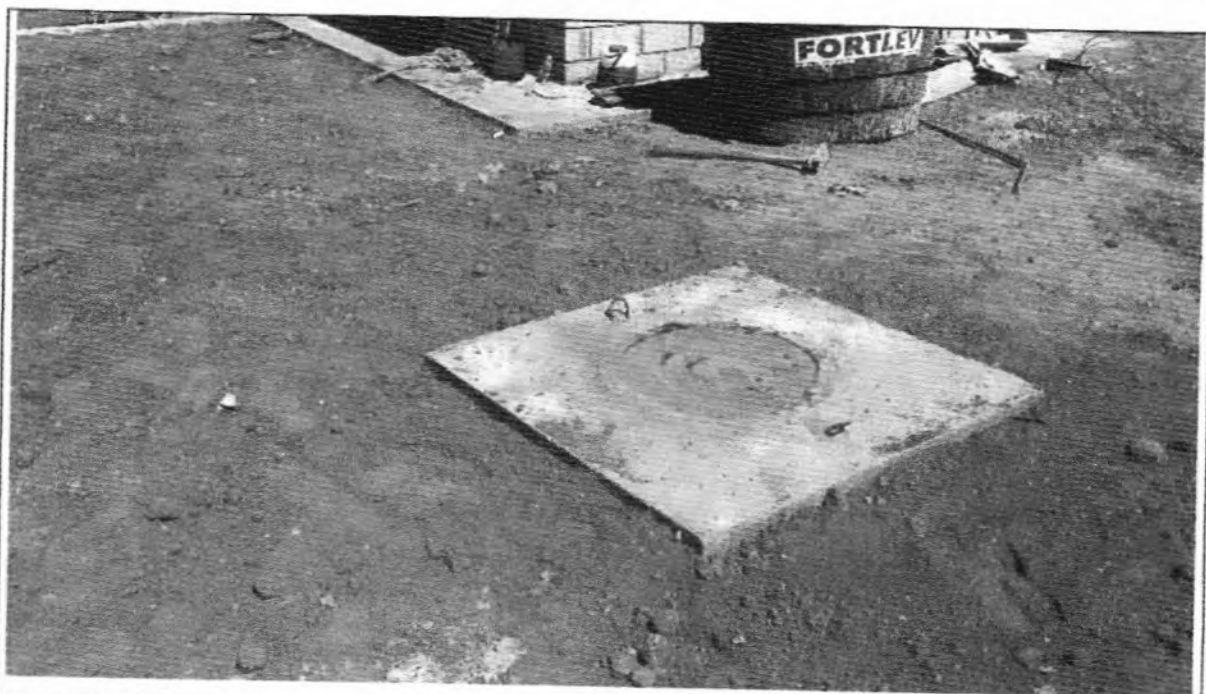

Descrição: Assentamento das tampas (F°F°) da galeria de águas pluviais.

Foto: 07

Data: 05/09/14

Arquivo: 103801



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE TAQUARITINGA

Taquaritinga, 08 de outubro de 2.014.

Ofício nº 218/2.014

À
KMG Consultoria e Engenharia Ltda.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, através de seu Superintendente infra-assinado, utiliza-se do presente, para encaminhar a conta de energia elétrica, cujos dados estão relacionados abaixo, uma vez que foi constatado pelos setores competentes desta Autarquia, que referida conta trata-se do local onde estão sendo executadas as obras da Estação de Esgoto de Taquaritinga:

UC: 4001078336


Endereço : ACS Taquaritinga a rodovia SP 310, s/n -

Vencimento : 14/10/2014 - R\$ 362,64

Salientando que referida Obra ainda não esta sobre a responsabilidade do SAAET, solicitamos que seja providenciado, com a brevidade e urgências possíveis, o pagamento desta conta, bem como as possíveis demais que vierem a ser geradas antes da entrega da Obra a esta Autarquia.

Sendo estas providências necessárias, e colocando-nos à inteira disposição para informações suplementares, prevalecemo-nos da oportunidade para renovar protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Satoshi Yokoyama
Superintendente

Ilm. Sr.
Engº Marcelo Ruban Moldes Saes
KMG Consultoria e Engenharia Ltda.
Avenida Rouxinol, nº 55 - conjunto 406/407 - CEP 175072-60
Moema -

Fone:(16) 3253-8400
Rua Clieun Braga de Magalhães, 911 - Centro
CEP 15900-000 Taquaritinga - SP
atendimento@saaet.com.br

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PERTECNICA CONS E PROJ SC LTDA - 017366727100017900,

Seu arquivo oxriobwcibj00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/07/2014 às 23:15.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 50397B8B.E20E4E02.822056B9.1DBF726C.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: OXRIObWCibJ00002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência: 07/2014

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 26/07/2014
HORA: 23:15:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PERTECNICA HSM CONSULTORIA PROJ LIMITADA
COMPETÊNCIA: 07/2014

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 73.667.271/0001-79
SIMPLES: 1

FGTS - 8*

QTD DE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

7.941,34

DEPÓSITO

635,30

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

635,30

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

